



Informatívna správa pre KSK  
o progrese projektu:

**Nemocnica novej generácie Michalovce**

20. apríla 2017

# Nemocnica novej generácie je stavebne ukončená na 80%



- 310 až 370 lôžok v novej budove
- Až 443 lôžok v celom areáli
- 8 operačných sál
- Centrálny urgentný príjem
- Oddelenie Matka a dieťa
- Potenciál zvýšenia výkonov jednoduchovej chirurgie až o 100%



# Postup výstavby NNG MI

I. - II.Q. 2016

## Hlavné práce projektu NNG MI: I. – II. Q. 2016

- Ukončenie prác na železobetónovom skelete - 03/2016
- Výstavba záložnej vodovodnej prípojky - 04/2016
- Výplňové konštrukcie na obvodovom plášti – 04/2016
- Spodná vrstva hydroizolácie strešného plášťa – 04/2016
- Presklenná strecha vo vstupnom átriu – 05/2016
- Strojovňa vzduchotechniky na streche objektu - 06/2016
- Začiatok prác na sadrokartónových priečkach v interiéri - 06/2016

**V marci 2016 bola ukončená hrubá stavba nemocnice a začali sa práce spojené s exteriérom a interiérom budovy.**

# Ukončenie hrubej stavby: Marec 2016





# Strojovňa vzduchotechniky: Jún 2016



## Začiatok prác na interiéroových priečkach: Jún 2016





Postup výstavby NNG MI

III.Q. 2016




## Hlavné práce projektu NNG MI: III.Q. 2016

- Pokračovanie prác na výstavbe interiérových priečok – III.Q.2016
- Pokračovanie prác na realizácii strešného plášťa – III.Q. 2016
- Začiatok prác na rozvodoch VZT - 07/2016
- Začiatok prác na rozvodoch ÚK - 07/2016
- Začiatok prác na rozvodoch pitnej vody a splaškovej kanalizácie - 07/2016
- Začiatok prác na rozvodoch medicínálnych plynov – 07/2016
- Začiatok prác na elektrických rozvodoch – 07/2016
- Začiatok prác na slaboprúdových rozvodoch (LAN, EPS, EZS, CCTV) – 07/2016
- Osadzovanie okien – III.Q. 2016
- Začiatok prác na zatepľovaní fasády objektu – 09/2016

**V III.Q.2016 sa ťažisko prác prenieslo do vnútra budovy a zároveň sa začalo s osadzovaním okien a zatepľovaním fasády.**

## Začiatok prác na rozvodoch ÚK: Júl 2016

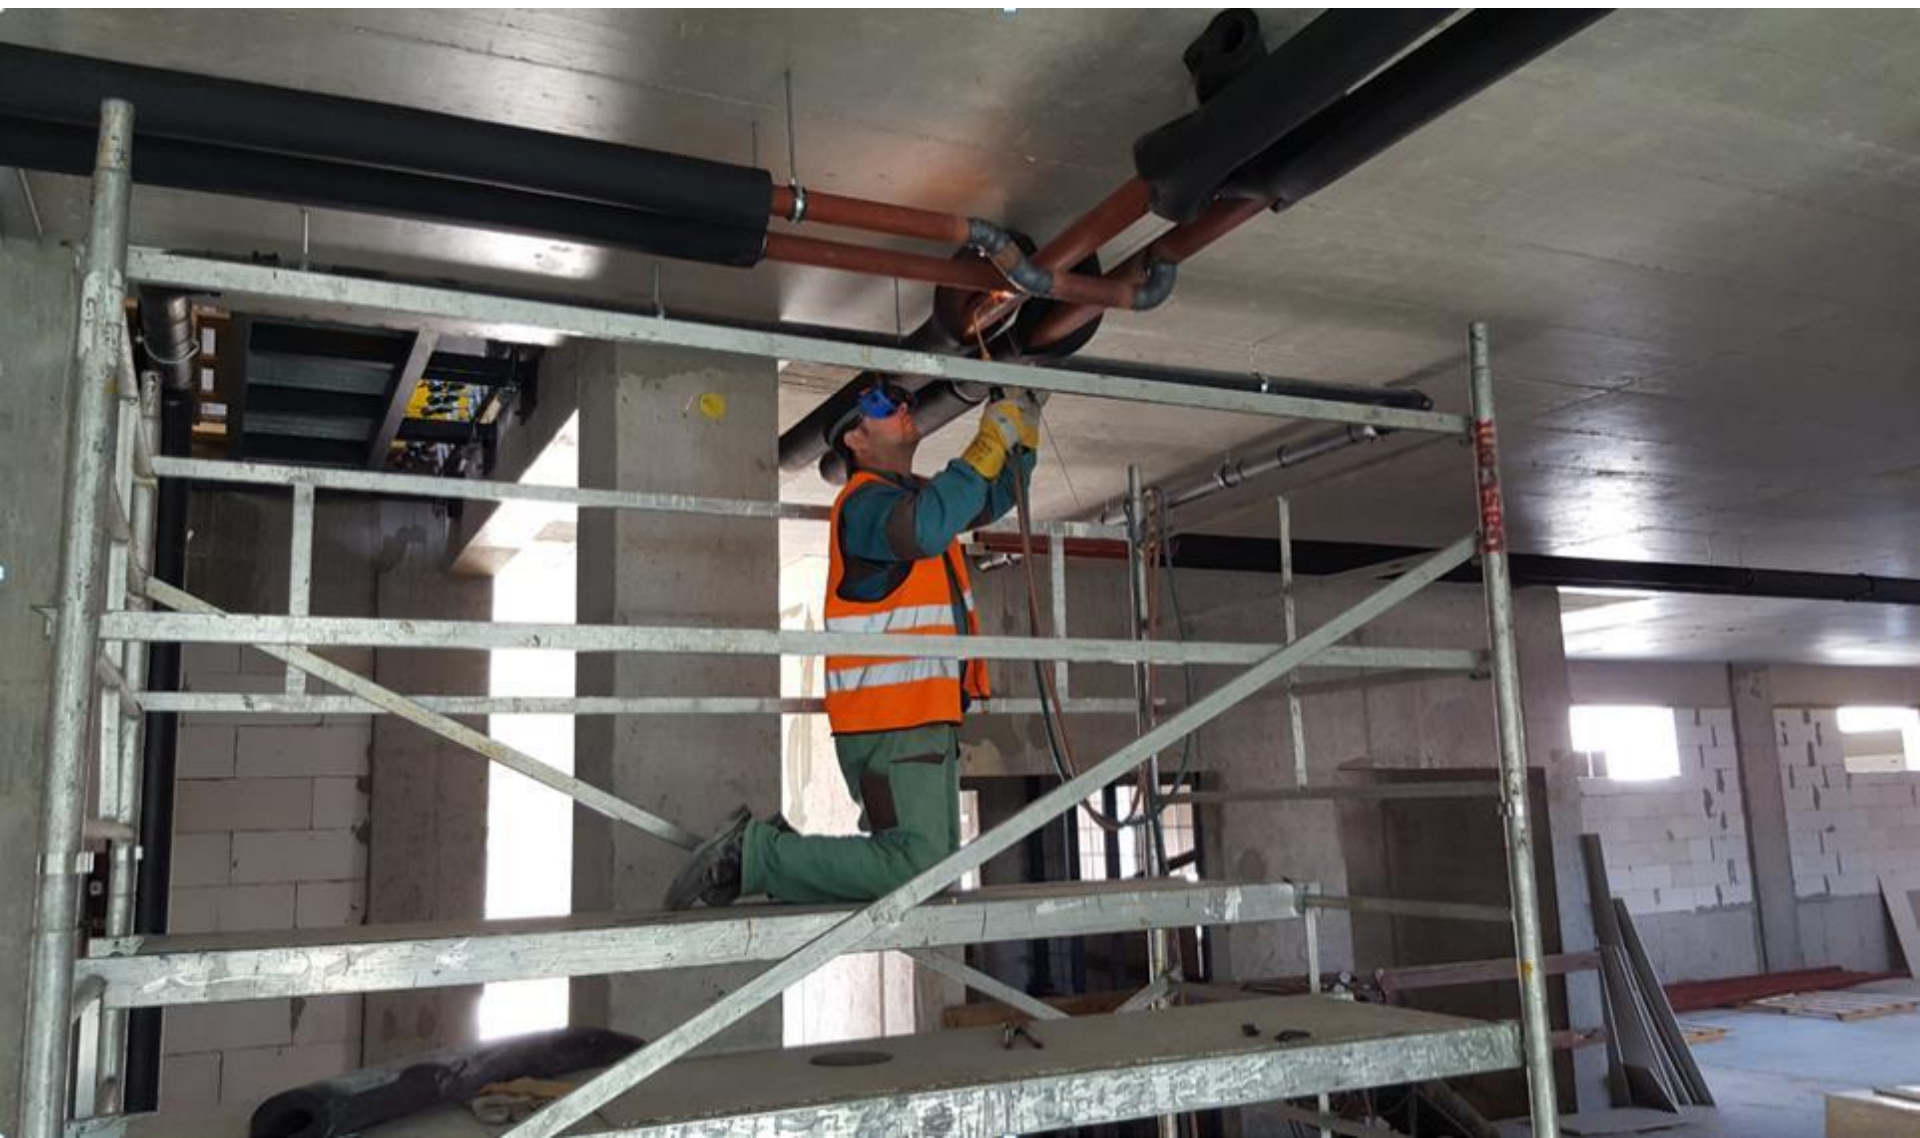


## Začiatok prác na rozvodoch VZT: Júl 2016





## Začiatok prác na rozvodoch ELI: September 2016

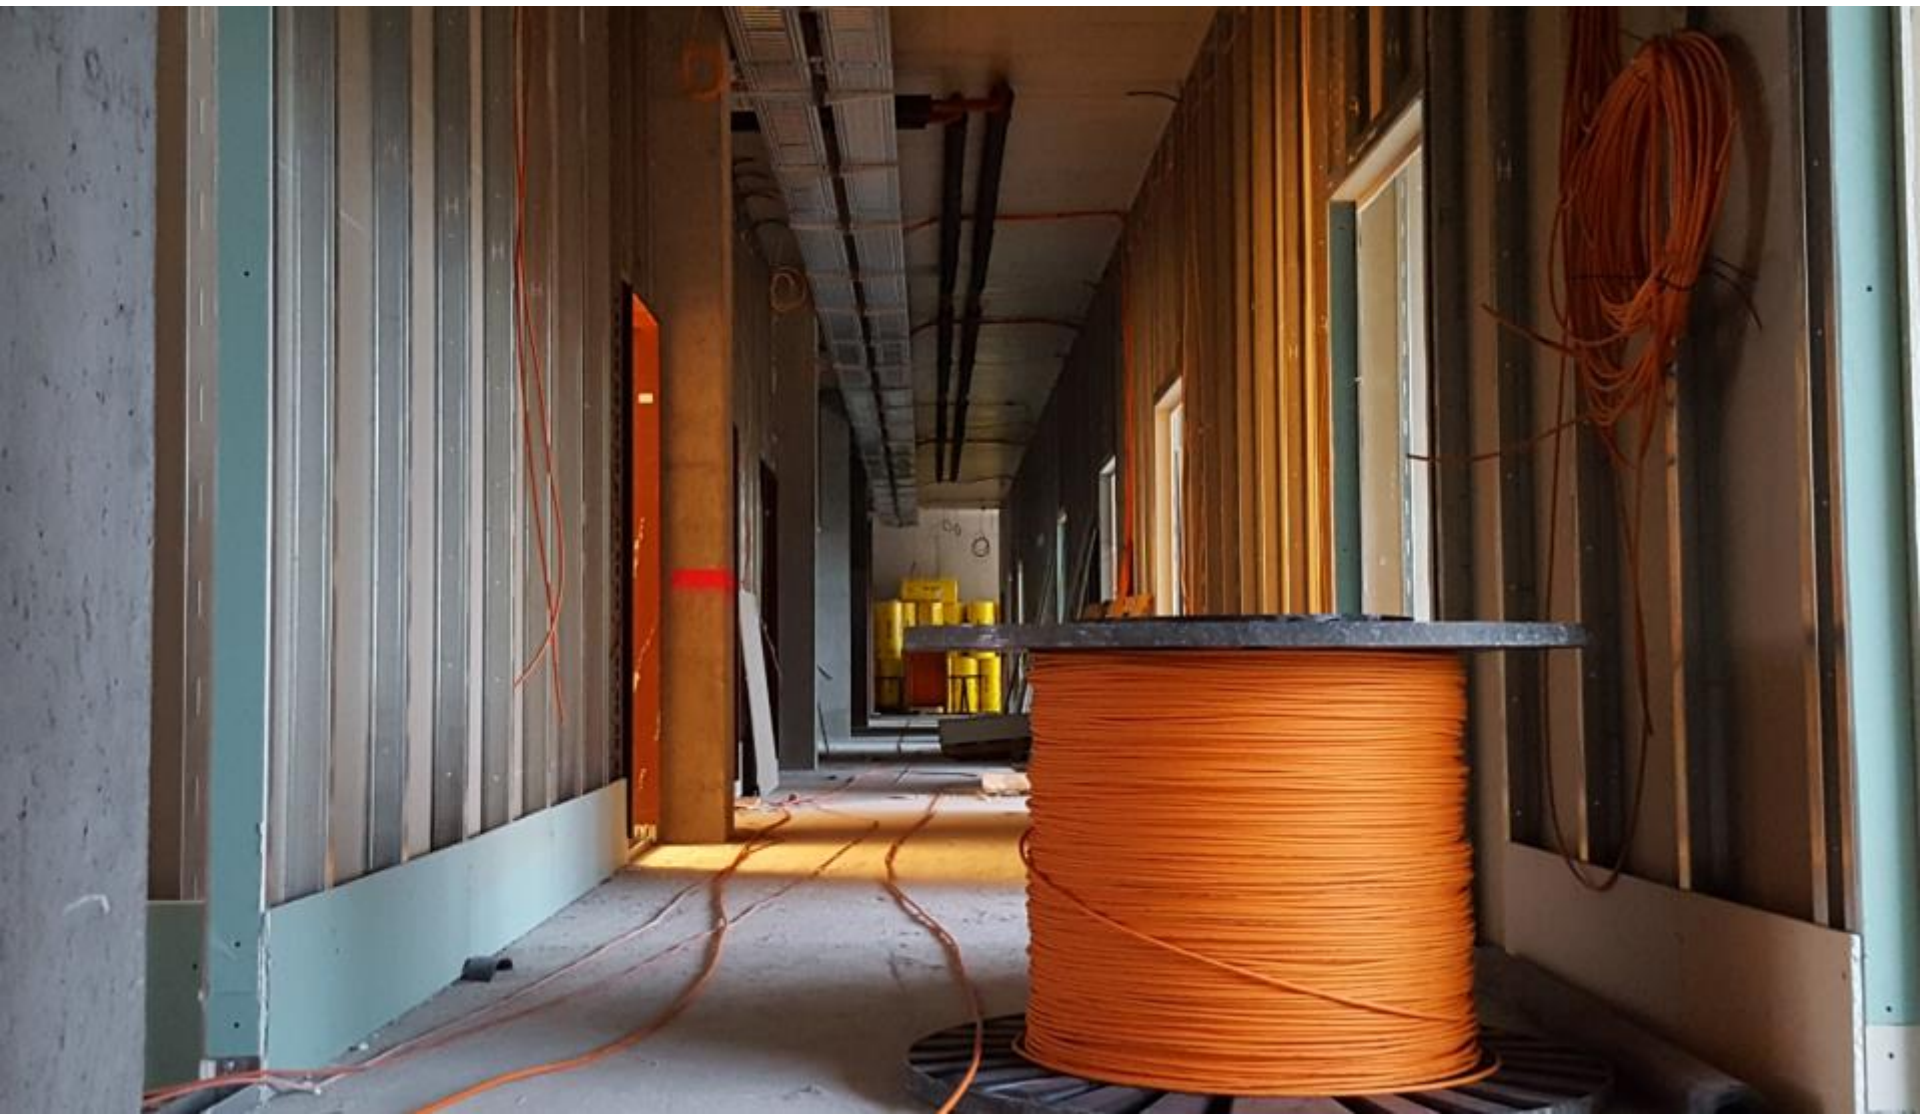

# Osadzovanie okien a zatepľovanie fasády: September 2016





# Zateplenie a hydroizolácia strešného plášt'a: September 2016





Postup výstavby NNG MI

IV.Q. 2016

## Hlavné práce projektu NNG MI: IV.Q. 2016

- Pokračovanie prác na výstavbe interiérových priečok – IV.Q.2016
- Pokračovanie prác na všetkých typoch vnútorných rozvodov – IV.Q.2016
- Realizácia prác systému podlahového kúrenia a chladenia – IV.Q.2016
- Začiatok prác na anhydritových podlahách - 10/2016
- Začiatok prác na vonkajších komunikáciách – 11/2016
- Pokračovanie prác na zateplení fasády objektu – IV.Q. 2016


**Od 12/2016 boli úspešne spúšťané do prevádzky jednotlivé okruhy podlahového kúrenia, čo umožnilo plynulý postup prác v interiéri počas zimného obdobia.**

## Pokračovanie prác na rozvodoch ÚK, November 2016





# System podlahového kúrenia a chladenia: Október 2016

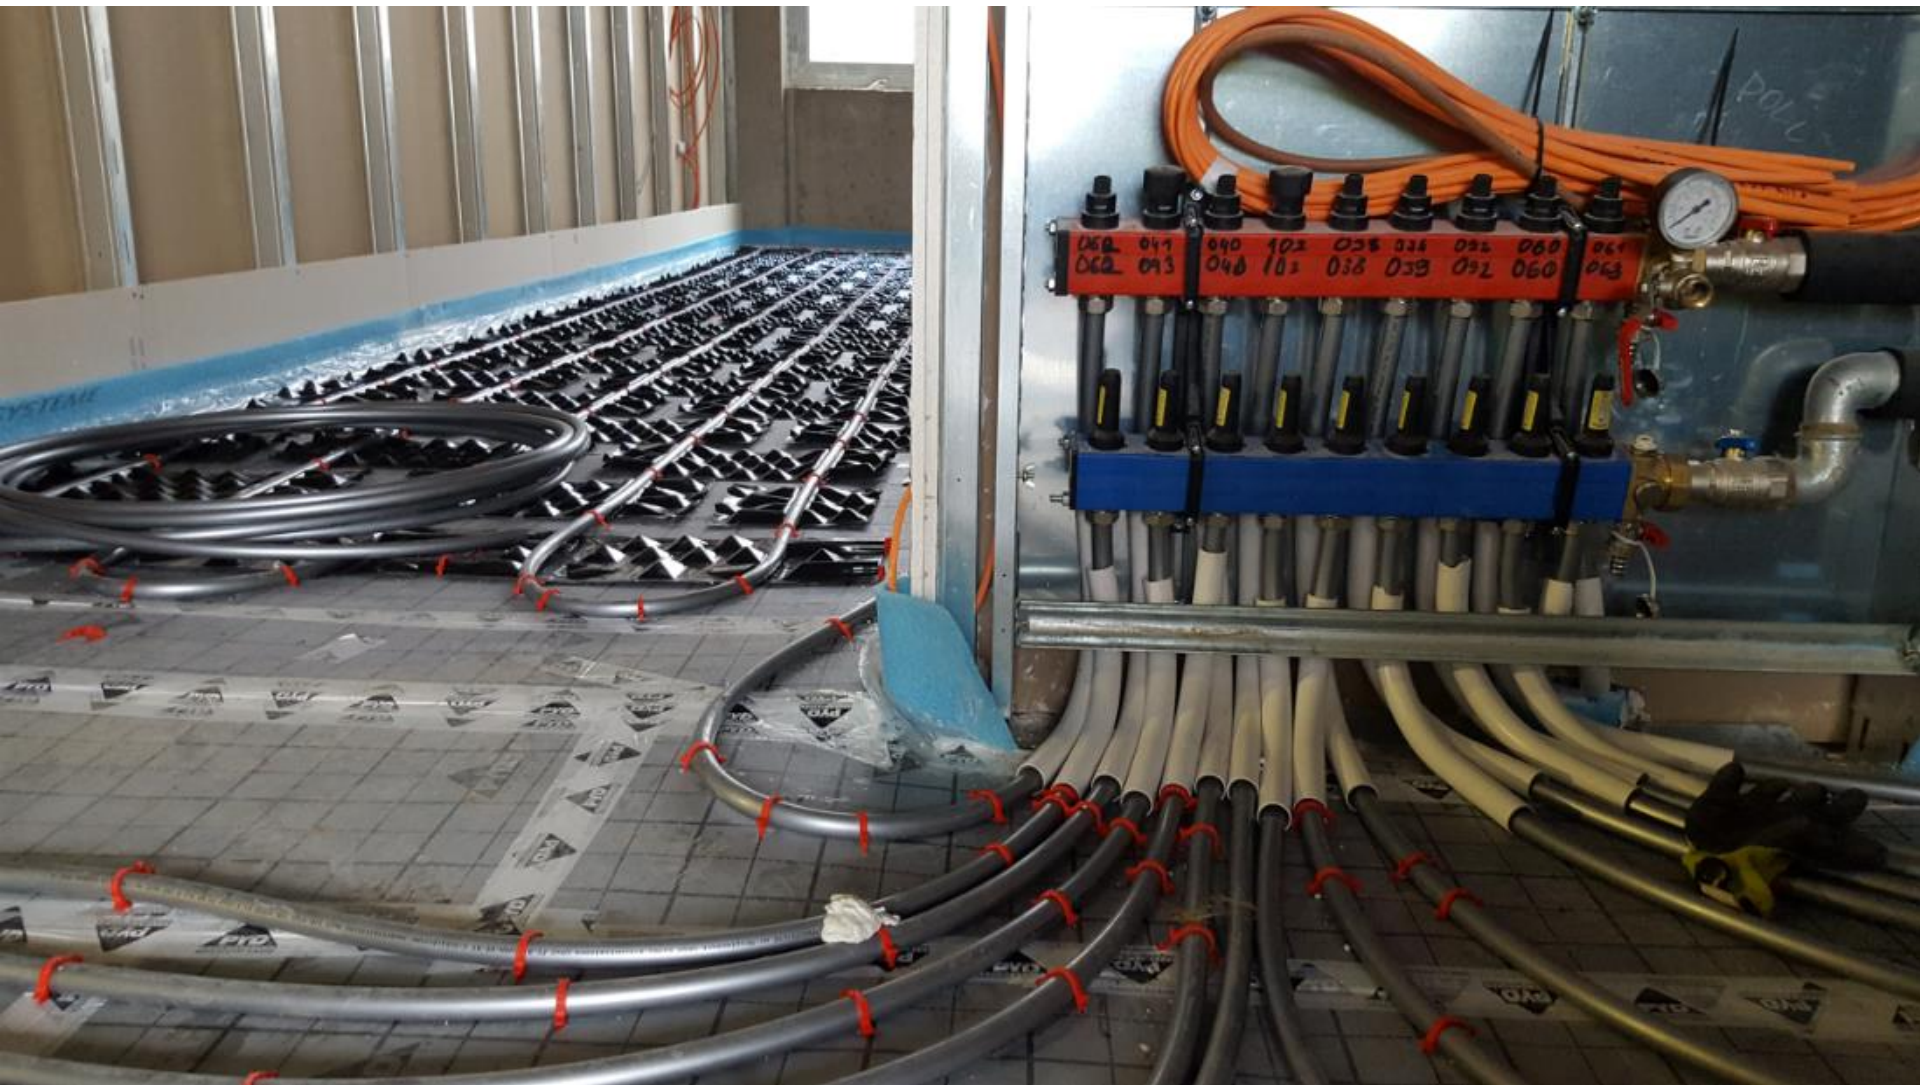



## Zalievanie anhydritových podláh: Október 2016



# Zatepl'ovacie práce na vonkajšej fasáde: November 2016



## Finalizácia omietok vo vnútorných átriach: November 2016





## Začiatok prác na spevnených plochách: November 2016





Postup výstavby NNG MI

I. a II.Q. 2017



## Hlavné práce projektu NNG MI: I. a II.Q. 2017

- Ukončovacie práce na výstavbe interiérových priečok – I. a II.Q.2017
- Ukončovacie práce na všetkých typoch vnútorných rozvodov – I. a II.Q.2017
- Ukončovacie práce na systéme podlahového kúrenia a chladenia – I. a II.Q.2017
- Realizácia prác na centrálnych operačných sálach - I. a II.Q.2017
- Obklady a dlažby – I. a II.Q.2017
- Sadrokartónové podhl'ady – I. a II.Q. 2017
- PVC podlahy – I. a II. Q. 2017
- Vonkajšie komunikácie a spevnené plochy – I. a II.Q. 2017
- Vstavaný nábytok – II.Q.2017
- Ukončenie zateplenia fasády objektu – II.Q.2017
- Začiatok inštalácie RTG techniky a medicínskych rámp – II.Q. 2017

**Do konca 06/2017 budú ukončené hlavné stavebné práce a následne bude pokračovať finalizácia interiérov a spúšťanie veľkej medicínskej techniky do prevádzky.**

# Montáž centrálných operačných sál: Apríl 2017



## Zateplená fasáda zo strany urgentného príjmu: Apríl 2017





# Výstavba spevnených plôch: Apríl 2017





Plán ďalšej výstavby NNG MI

III.Q. 2017 – IV.Q. 2017



# Projekt NNG MI napreduje plne v súlade so stavebným harmonogramom a nová nemocnica bude spustená do prevádzky začiatkom roka 2018



## Ďalšie plánované kroky:

- **07/2017:** Ukončenie stavebnej časti
- **09/2017:** Ukončenie medicínskej časti
- **12/2017:** Kompletné ukončenie interiérov, kolaudácia budovy a povolenie pre spustenie do prevádzky
- **01/2018:** Otvorenie novej nemocnice NNG MI
