

1. Vyhodnotenie plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2011

1.1. Špecifický cieľ 1. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy

Aktivita 1.1.1.1. dostavba diaľnice D1 po Slovensko-Ukrajinskú hranicu

Pokračuje projekčná príprava jednotlivých úsekov diaľnice D1. Úseky D1 od Košíc po hranicu s Ukrajinou sú tieto:

- D1 Budimír – Bidovce: spracovanie projektovej dokumentácie (PD) pre stavebné povolenie + majetkové právne vysporiadanie,
- D1 Bidovce – Dargov: štúdia,
- D1 Dargov – Pozdišovce: štúdia,
- Diaľničný privádzač Michalovce: štúdia,
- D1 Pozdišovce - št. hranica SR/UA: štúdia.

Úsek Budimír – Bidovce je v procese spracovania pre stupeň dokumentácie pre stavebné povolenie, prebieha postupné majetkové právne vysporiadanie (spracovateľom projektovej dokumentácie je Dopravoprojekt, a.s. Prešov). Plánované začatie stavby je v roku 2014.

Aktivita 1.1.2.1. Výstavba úseku R4 Košice – Milhosť

Stavba je rozostavaná. Plánovaný termín ukončenie je v roku 2013. Stavba je financovaná z Operačného programu Doprava 2007 – 2013.

Aktivita 1.1.2.2. Výstavba rýchlostnej cesty R2 na území Košického kraja

Prebieha proces projekčného spracovávaného po úsekoch:

- Šaca – Košické Olšany – spracovávanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (2012), spracovateľom je Dopravoprojekt, a.s. Prešov,
- Rožňava – Jablonov nad Turňou (tunel Soroška) – spracovávanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (12. 2011 – 2012), spracovateľom je Dopravoprojekt, a.s. Prešov,
- Moldava nad Bodvou – Šaca – v roku 2012 príprava súťaže pre spracovávanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Ostatné úseky sú v stave spracovania štúdií trasovania. Predpokladaný termín ukončenia výstavby celého úseku R2 na území KSK až po napojenie na diaľnicu D1 pri Košických Olšanoch je rok 2020.

Aktivita 1.1.4.1. modernizácie ciest II a III. triedy projekt PPP 2005

U tejto aktivity pretrvávajú rovnaké plnenie ako v roku 2010. Modernizácia bola realizovaná v roku 2006 v objeme 650 mil. Sk a je postupne financovaná z rozpočtu KSK v období 10 rokov do roku 2015. Zoznam modernizovaných (rekonštruovaných) ciest je dostupný v materiáloch predkladaných na rokovanie Zastupiteľstva KSK.

Aktivita 1.1.4.2. modernizácia ciest II. a III. triedy projekt PPP 2006

U tejto aktivity pretrvávajú rovnaké plnenie ako v roku 2010. Modernizácia bola realizovaná v roku 2007 v objeme 125 mil. Sk a postupne financovaná z rozpočtu KSK v období 5 rokov s ukončením v roku 2012.

Aktivita 1.1.4.3. modernizácia ciest II. a III. triedy projekt PPP 2007

U tejto aktivity pretrvávajú rovnaké plnenie ako v roku 2010. Modernizácia bola realizovaná v roku 2007 v objeme 311 mil. Sk a postupne financovaná z rozpočtu KSK v období 7 rokov do roka 2012.

Aktivitami 1.1.4.1 – 1.1.4.3 – modernizácia ciest II. a III. triedy – formou financovania PPP projektov (projekty PPP 2005, 2006, 2007) sa podarilo zrealizovať celkový rozsah úprav ciest v Košickom kraji v dĺžke cca 316 km.

Aktivita 1.1.4.4. modernizácia ciest úver EIB

Plnenie tejto aktivity je rovnaké, ako v roku 2010. Jednotlivé stavby sa realizovali, resp. realizujú od roku 2007. Väčšina stavieb bola ukončená do konca roka 2009, prebieha dofinancovanie.

Na základe prolongácie čerpania úverových zdrojov do konca roka 2010 a ich dofinancovania v rámci finančného vysporiadania bola celková hodnota úverových zdrojov EIB v oblasti dopravnej infraštruktúry zvýšená na 33,74 mil. €. Rozsah zrekonštruovaných ciest predstavuje 220,6 km. Okrem stavebných prác zrealizovaných v rámci rekonštrukcie cestnej infraštruktúry bola z úverových zdrojov obstaraná aj technológia pre Správu ciest KSK v celkovej výške cca 3,7 mil. €.

Prostriedky z úveru EIB boli použité aj na 5% spolufinancovanie stavieb a financovanie neoprávnených výdavkov v rámci projektov Cesty KSK 1 až 5, financovaných z Regionálneho operačného programu 2007 – 2013.

Prostriedky z úveru EIB boli vyčlenené aj na 5% spolufinancovanie stavieb v rámci projektov cezhraničnej spolupráce „HOSKA – Holloháza – Skároš – výstavba spojnice“ a „KÉKABAD – Kéked – Trstené pri Hornáde – výstavba spojnice“ realizované v rámci programu cezhraničnej spolupráce HU/SK.

Ďalšie úverové zdroje sú zahrnuté v rámci spolufinancovania projektov EÚ v rámci ROP. Splácanie úveru z rozpočtu KSK je naplánované postupne v období 30 rokov do roku 2036.

Podstatným prínosom investovania do cestnej infraštruktúry je **zlepšenie kvalitatívneho stavu ciest**. Kvalitatívny posun nastal najmä pri zvýšení kategórie ciest vo veľmi dobrom stave zo 14,2% v roku 2004 na 39,9% ku koncu roka 2011.

Aktivita 1.1.4.5. výstavba a rekonštrukcia ciest a mostov na cestách II. a III. triedy

V rámci výzvy ROP opatrenie 5.1. bolo zo strany odboru dopravy KSK podaných 5 projektov (Cesty KSK 1 až 5). Implementácia projektov prebieha v rámci Odboru regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov KSK. Aktuálny stav realizácie projektov je nasledovný:

Cesty KSK 1 – Košice-okolie: projekt je ukončený, v rámci aktivít projektu A1, A2 a A3 boli ukončené a prevzaté všetky stavebné objekty. Realizácia prebiehala v období 21. 7. 2010 – 31. 5. 2011.

Ukončené aktivity:

- Aktivita A1 Šemša – Smolník: ukončené a prevzaté 6 stavebné objekty úsekov ciest, 3 mostné objekty v termíne 11/2010,
- Aktivita A2 Smolnícka Huta – Smolník: ukončené 05/2011,
- Aktivita A3 Ploské: ukončené 05/2011.

Sú ukončené všetky stavebné objekty v rámci implementovaných aktivít projektu, t.j. rekonštrukcia ciest v dĺžke 27,23 km, rekonštrukcia 3 mostov a 1 križovatky. Oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 2 611 561,27 €, z ktorej nenávratná finančná pomoc zo štrukturálnych fondov predstavuje 2 480 983,21 €. Stavebné práce v rámci projektu boli realizované firmou Skanska SK, a.s. V súčasnosti je projekt vo fáze ukončenia finančného vysporiadania s Riadiacim orgánom pre ROP.

Cesty KSK 2 – Spišská Nová Ves, napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Spišské Vlasy, projekt sa realizuje

Realizáciou projektu sa dosiahne rekonštrukcia ciest v dĺžke 28,83 km, rekonštrukcia 2 mostov a 2 križovatiek. Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú sumu 2 357 058,93 €, nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov bude poskytnutý do výšky 2 239 205,98 €. Stavebné práce realizuje firma Strabag. V priebehu roka 2011 boli ukončené práce na takmer všetkých stavebných objektoch, s výnimkou rekonštrukcie križovatiek v Spišskej Novej Vsi a v Spišských Vlachoch a úseku Spišské Vlasy – Bystrany. Práce na týchto stavebných objektoch budú realizované v jarných mesiacoch roka 2012. Predpokladaný termín ukončenia realizácie stavieb je 31. 5. 2012.

Plnenie aktivít projektu:

Aktivita A1 Spišská Nová Ves

1. Cesta III/536010 Teplička spojka – prebiehajú rekonštrukčné práce na úseku cesty v dĺžke 4,283 km s finančným nákladom 232 tis. € s kompletným ukončením plánovaných prác v roku 2012.
2. Cesta III/536005 Spišská Nová Ves – Lieskovany zahájené stavebné práce na úseku v dĺžke 2,376 km; v spolupráci so ŽSR sa realizuje úprava pred železničným priecestím s pokládou nového asfaltového krytu, finančný náklad je 159 tis. €. V roku 2011 boli ukončené práce na pokládke asfaltového krytu okrem vodorovného dopravného značenia, ktoré je plánované na rok 2012.
3. Cesta III/536008 Lieskovany – spojka; v roku 2011 boli ukončené stavebné práce na úseku v dĺžke 0,640 km, prevedená pokládka krytu a úprava odvodnenia vo finančnom náklade 63 tis. €.
4. Mimoúrovňová križovatka ciest II/536 a III/536005 – ukončené stavebné práce na obnove a pokládke asfaltového krytu v dĺžke 0,858 km, finančný náklad 108 tis. €.
5. Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská Spišská Nová Ves – výstavba kruhovej križovatky – prebiehajú prípravné práce súvisiace so zabezpečením preložiek inžinierskych sietí, frézovanie cesty Mlynská, úprava kanalizačných poklopov a následne bude uložený nový asfaltový kryt na časti cesty. Výstavba kruhovej križovatky bude ukončená v roku 2012. Dĺžka úpravy ciest napájajúcich sa na križovatku je 1,123 km, finančný náklad 542 tis. €.

Aktivita A2: Spišské Vlasy

6. Stavebné úpravy križovatky a ciest II/536 a III/547020 Spišské Vlasy – začaté prípravné a stavebné práce v rámci budovania kruhovej križovatky. Ukončenie prác je predpokladané v roku 2012.
7. III/536017 Hincovce spojka – ukončené stavebné práce v roku 2011 na odvodnení a pokládke nového krytu v dĺžke 1,916 km, cena prác 210 tis. €.
8. III/536003 Hincovce pried'ah – ukončené stavebné práce v roku 2011 na odvodnení a pokládke nového asfaltového krytu v dĺžke 1,5 km, cena prác 148 tis. €.
9. II/536 Spišské Vlasy – Bystrany – pokládka nového asfaltového krytu bude realizovaná po ukončení kruhovej križovatky Spišské Vlasy v roku 2012. Dĺžka úpravy je 2,958 km a cena prác 185 tis. €.
10. III/547019 Spišské Vlasy – Oľšavka – ukončené stavebné práce v roku 2011 na obnove krytu v dĺžke 1,259 km. Cena prác je 128 tis. €.
11. III/547 018 Vojkovce spojka – zahájené stavebné práce na obnove krytu a odvodnenia cesty v dĺžke 2,1 km s cenou prác 289 tis. €. Ukončenie prác bude v roku 2012.

Cesty KSK 3 – Trebišov, projekt ukončený

Na stavbách v rámci projektu Cesty KSK 3 – Cesta Nižný Žipov – Zemplínsky Branč, boli dňa 21. 07. 2010 začaté stavebné práce podľa odsúhlaseného harmonogramu výstavby. Zo strany zhotoviteľa – Inžinierske stavby, a.s. boli zrealizované stavebné práce na všetkých stavbách v rámci projektu. V rámci projektu boli zrekonštruované cesty v dĺžke 10,24 km a 2 mosty. Oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 1 975 282,71 €, z ktorých NFP je vo výške 1 876 518,57 €. Stavebné práce boli ukončené 30. 11. 2010. V súčasnosti prebieha finančné vysporiadanie projektu s Riadiacim orgánom pre ROP.

Ukončené aktivity:

- Aktivita A1: cesta II/552 Nižný Žipov – I/79 – ukončené 3 stavebné objekty úsekov ciest a most Stanča.
- Aktivita A2: cesty III. triedy – ukončené 3 stavebné objekty úsekov ciest.

Cesty KSK 4 – Michalovce, projekt ukončený

Napojenie obcí na Michalovce a Sobrance. Dňa 26. 07. 2010 boli začaté stavebné práce podľa odsúhlaseného harmonogramu výstavby. Zo strany zhotoviteľa – Eurovia, a.s. boli stavebné práce na všetkých stavbách ukončené k 31. 05. 2011. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 3 068 008,71 €, nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov na projekt je vo výške 2 914 608,27 €. Realizáciou projektu boli zrekonštruované cesty v dĺžke 30,92 km. V súčasnosti prebieha finančné vysporiadanie projektu s Riadiacim orgánom pre ROP.

Ukončené aktivity v rámci projektu:

- Aktivita A1: Michalovce – Zemplínska Šírava – ukončené 2 stavebné objekty ciest, kruhová križovatka Vinianska cesta v termíne 05/2011.
- Aktivita A2: Sobrance – Kristy – ukončené práce na 3 stavebných objektoch a most Komárovce v termíne 05/2011.

Cesty KSK 5 – Rožňava: Gemerská Poloma – Hnilec, projekt sa realizuje. Projekt má byť ukončený v zmysle zmluvy o NFP najneskôr do 31.06. 2012.

Implementácia projektu pokračuje stavebnými prácami, ktoré realizuje firma Strabag. V priebehu roka 2011 boli ukončené práce na takmer všetkých troch cestných stavebných objektoch, s výnimkou opravy zosuvu v obci Hnilec. Práce na sanácii zosuvu budú pokračovať v jarých mesiacoch roka 2012. Predpokladaný termín ukončenia realizácie stavieb je 31. 5. 2012. Plánované oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1 837 468,07 €, z ktorých nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov predstavuje 1 745 594,67 €. Rekonštrukciou ciest sa zlepšila ich kvalita a tým aj dopravná dostupnosť v dĺžke 21,60 km.

Realizácia aktivít projektu:

Aktivita A1: Gemerská Poloma – Súľova – Hnilec

1. II/533 Gemerská Poloma – Súľova po okresnú hranicu Rožňava/Spišská Nová Ves – v roku 2011 boli **ukončené a prevzaté stavebné práce**. Bola realizovaná pokládka asfaltového krytu v dĺžke 13,4 km vrátane osadenia zvodidiel, úprava priepustov s celkovým nákladom 1 663 640,05 €.
2. II/533 – Hnilec prietah – stavebné práce budú pokračovať na tomto úseku cesty v roku 2012. V celkovej dĺžke 1,2 km bude uskutočnené uloženie asfaltového krytu, odstránenie zosuvu svahu a úprava odvodnenia cesty.

Správa ciest KSK (SC KSK) v priebehu rokov 2010 – 2011 pripravila a obstarala projektové dokumentácie na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie ciest a mostov II. a III. triedy pre projekty **Cesty KSK 6 – Cesty KSK 10:**

- Cesty KSK 6 – Košice okolie – napojenie obcí na Košice,
- Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves – napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Gelnicu,
- Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce,
- Cesty KSK 9 – Michalovce napojenie obcí na Michalovce a Sobrance,
- Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie obcí na Rožňavu.

V rokoch 2010 – 2011 Správa ciest KSK obstarala spracovanie projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb. Celková cena projektových dokumentácií stavieb bola 561 147,20 €. Projektové dokumentácie boli schválené príslušnými stavebnými úradmi a bolo na ne vydané platné rozhodnutie o ohlásení stavebných prác. Po vyhlásení výzvy z ROP opatrenie 5.1. budú technické dokumentácie spracované do projektových žiadostí o poskytnutie NFP a predložené na posúdenie a schválenie.

V programe cezhraničnej spolupráce HU – SK sú realizované 3 projekty zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy a rekonštrukciu mostov v celkovej výške 4 874 195,47 € vrátane partnerov projektov.

Boli schválené projekty na súvislé opravy úsekov ciest: „HOSKA – Holloháza – Skároš výstavba spojnice“ a „KEKABAD Kéked – Trstené pri Hornáde výstavba spojnice“.

Stavba „ HOSKA Holloháza – Skároš výstavba spojnice“, projekt je ukončený. Stavba bola plánovaná na obdobie 12/2009 – 06/2010, kedy prebehla aj realizácia. Projektom vo výške 1 752 352,22 € (spoločný rozpočet pre partnerov) sa vybudovala spojnica v dĺžke 7,5 km a bol rekonštruovaný 1 most. Dodávateľom stavebných prác na slovenskej strane bola firma Eurovia, a.s. V júni 2011 maďarský partner NIF Zrt. Hungary požiadal KSK ako vedúceho partnera projektu o predĺženie trvania projektu. Dôvodom bola ich dočasná platobná neschopnosť uhradiť zhotoviteľovi stavebných prác na maďarskej strane faktúru za stavebné práce, ktoré boli ukončené ešte v decembri 2010. Maďarský partner požiadal o predĺženie trvania projektu do 30. 11. 2011, ktoré bolo schválené Riadiacim orgánom. V súčasnosti prebieha finančné vysporiadanie projektu.

V prípade projektu „KÉKABAD – Kéked – Trstené pri Hornáde – výstavba spojnice“, kde je vedúci partner maďarská organizácia NIF Zrt. a bol vybraný zhotoviteľ na úsek na maďarskej strane. Na území KSK dodávateľom stavebných prác je firma Skanska SK, a.s. Projekt predpokladá (vrátane partnerov projektu) výdavky vo výške 2 095 068,40 €. Zrealizuje sa rekonštrukcia cesty v dĺžke 6,7 km a mosta. Projekt je v štádiu realizácie, termín ukončenia prác sa predpokladá v júni 2012.

V roku 2010 bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt **„STREKA – Streda nad Bodrogom – Karos - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy“**. **Projekt sa realizuje.** Zabezpečí rekonštrukciu cesty v dĺžke 4,3 km a výstavbu okružnej križovatky v Strede nad Bodrogom. Výdavky projektu sú vo výške 1 026 774,85 € vrátane partnerov. Dodávateľom stavby sú Inžinierske stavby, a.s.. Predpokladaný termín ukončenia prác je september 2012.

Projekty pre odstránenie škôd na cestách spôsobených vplyvom povodní

Celkovo bolo povodňami poškodených 58 úsekov ciest a 20 mostných objektov. Najviac poškodených ciest bolo v okrese Spišská Nová Ves 30 úsekov ciest a 14 mostných objektov. Do konca roka 2010 sa podarilo sprejazzniť všetky úseky ciest a mosty poškodené povodňami. Povodňové škody spôsobené prívalovými zrážkami v roku 2010 boli

odstraňované z kapitálových prostriedkov rozpočtu KSK ako aj zo štátneho rozpočtu. Celková výška nákladov po realizácii stavieb bola 9 924 981,77 €.

Sanácia ciest a mostov poškodených povodňami **pokračovala v roku 2011 nasledovne:**

A: Akcie financované z poskytnutého úveru vo výške 10 mil. € s názvom: „Odstránenie havarijného stavu na cestách II. a III. triedy po povodniach v KSK“

Jednalo sa o 10 úsekov ciest prevažne v okrese Spišská Nová Ves, Košice – okolie a Rožňava. Boli začaté stavebné práce na odstraňovaní zosuvov ciest ešte v roku 2010. V roku 2010 bolo dovedna 6 úsekov ukončených a sprejazdnených a ďalšie 4 poškodené úseky ciest boli ukončené v máji 2011.

- **Poškodené úseky ciest v okrese Spišská Nová Ves:** II/546 Prakovce – Helcmanovce, II/546 Gelnica, II/533 Novoveská Huta, III/546010 Turzov, II/547 Krompachy.
- **Poškodené úseky ciest v okrese Košice – okolie:** II/552 Nižná Hutka – križovatka, III/5523 Nižná Myšľa, III/068024 Ždaňa – Nižná Myšľa, III/050196 Zdobá - Byster – Košice.
- **Poškodené úseky ciest v okrese Rožňava:** III/50150 Gemerská Hôrka.

B: Akcie financované z kapitálových prostriedkov KSK s názvom: „Riešenie zosuvov pôdy v súvislosti s povodňami v Košickom kraji“

Stavebné akcie na sanáciách poškodených ciest prebiehali aj v roku 2011. Postupne sa sanovali poškodenia ciest týkajúce sa najmä poškodených krajníc a zosuvov ciest, ktoré boli prejazdne len s obmedzením. Odstránených bolo 9 poškodených úsekov ciest ako aj poškodená opravárenská dielňa v Trebišove. Výška nákladov na odstránenie uvedených škôd predstavovala čiastku 637 434,16 €. Išlo o tieto stavebné akcie:

- **Poškodené úseky ciest v okrese Košice- okolie:** IIII/068009 – zosuv na ceste Ploské, 552-007. havarijný stav na moste č.552-007 pred obcou Bohdanovce, III/050196 havarijný stav Sady nad Torysou, III/547002 havarijný stav na ceste Družstevná pri Hornáde.
- **Poškodené úseky ciest v okrese Rožňava:** III/0675 Havarijný stav na ceste Nadabula, II/526, havarijný stav na ceste Honce
- **Poškodené úseky ciest v okrese Spišská Nová Ves :** II/533 havarijný stav na ceste Harichovce, II/546 havarijný stav na ceste Švedlár – priepusty
- Poškodená dielňa **Trebišov** a poškodený úsek cesty a mostu vo Veľkých Kapušanoch.

C: Akcie financované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR boli ukončené v máji 2011.

Išlo o opravu poškodeného mosta na ceste II/536 vstupná brána do mesta Spišská Nová Ves. Novovybudovaný most z prostriedkov rezervy predsedu vlády SR bol vo finančnom objeme 902 833,22 €.

D: Akcie financované z dotácie Ministerstva financií SR vo výške 6 040 588 € poskytnutej v marci 2011 s názvom: „Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami“

Od uvedeného obdobia bola začatá príprava ďalších 30 stavebných akcií na odstraňovaní škôd po povodniach. Po procese verejného obstarávania bolo opravených 14 mostných objektov a 16 poškodených úsekov ciest vrátane zosuvov a priepustov na cestách II. a III. triedy v celkovom objeme **2 267 367,84 €**. Z uvedeného počtu bolo v roku 2011 ukončených 16 stavebných akcií v celkovej v hodnote **1 145 165,75 €**.

V súčasnosti sú pripravované ďalšie stavebné akcie - prebieha proces verejného obstarávania s cieľom pokračovať v prácach v roku 2012 v zostávajúcom finančnom náklade 3 732 632 €

Aktivita 1.1.4.6. príprava projektovej dokumentácie a majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod cestami

V priebehu roka 2011 do vlastníctva KSK boli nadobudnuté pozemky pod komunikáciami:

1. Kúpnyimi zmluvami:

- 3 pozemky v k.ú. Spišská Nová Ves o celkovej výmere 1 701 m² pre potreby stavby „Rekonštrukcia križovatky Spišská Nová Ves ciest III/5365 Markušovská cesta a III/53610 Mlynská ul.“,
- 3 pozemky v k.ú. Vyšná Slaná o celkovej výmere 7 618 m² pod cestou III/06712 v intraviláne obce Vyšná Slaná,
- 2 pozemky v k.ú. Prakovce o celkovej výmere 326 m² pod cestou II/546,
- 1 pozemok v k.ú. Gelnica o výmere 118 m² pod cestou – dopravné napojenie supermarketu TESCO Gelnica.

2. Delimitáciou od správcov majetku štátu (Slovenskej správy ciest, Slovenského pozemkového fondu, Lesov SR)

- pozemky pod cestami II. a III. triedy v 62 katastrálnych územiach o celkovej výmere 613 793 m².

3. Zrušením podielového spoluvlastníctva dohodou sa KSK stal výlučným vlastníkom pozemku registra E KN parcela č. 937/2 v k.ú. Hodkovce o výmere 1 708 m², ktorý sa nachádza pod cestou II/548.

Aktivita 1.3.1.1. vytvorenie a rozvoj integrovaného dopravného systému (IDS) časť A.

Zo šiestich stavieb uvedených v „Štúdii integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc“ ukončenej v septembri 2009 podľa rozhodnutia Pracovnej skupiny Ministerstva dopravy SR a po jej schválení v r.2010 boli pre ďalšiu realizáciu určené stavby:

1. Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou mesto
2. Elektrifikácia železničnej trate Haniska pri Košiciach –Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto
3. TIOP Sever (Ťahanovce) – Nám. Maratónu mieru
4. Nám Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na ŽSR
5. TIOP Sever – sídlisko Ťahanovce.

Aktívne sme sa zúčastňovali rokovaní pracovnej skupiny Integrovaného dopravného systému koľajovej dopravy (IDS K) pri MDVRR SR pre budovanie integrovaného dopravného systému (IDS) v Košickom regióne. Prebieha projekčná príprava všetkých stavieb okrem stavby č. 2. Financovanie je zabezpečené z Prioritnej osi 7 Operačného programu Doprava. Na stavbu č. 2 GR ŽSR plánuje vyhlásiť novú verejnú súťaž na jar 2012.

Aktivita 1.3.1.2. realizovanie Košickej osobnej regionálnej integrovanej dopravy (KORID) z európskeho fondu regionálneho rozvoja časť B.

Dňa 8. 2. 2010 bolo na 2. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 33/2010 prijaté rozhodnutie o založení spoločnosti ORID, s.r.o.. Spoločnosť vznikla na základe zakladateľskej listiny, pričom zakladajúcim spoločníkom je Košický samosprávny kraj. Spoločnosť ORID, s.r.o. vznikla 1. 3. 2010, kedy bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I.

Na základe projektu „Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy“ a uzavretej dohody o spolupráci medzi KSK a Mestom Košice na realizácii integrovaného dopravného systému bolo prijaté uznesenie Zastupiteľstva KSK č. 727/2009 z 24. 8. 2009 o založení obchodnej spoločnosti ORID, s.r.o. Uvedené uznesenie

predpokladalo vznik spoločnosti ORID, s.r.o. ešte v roku 2009. Mesto Košice a jeho Zastupiteľstvo vlastné uznesenie o založení spoločnosti ORID, s.r.o. neprijalo. V roku 2011 sa na rôznych úrovniach uskutočnili rokovania s mestom Košice, ktorých výsledkom je oficiálne stanovisko primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho MPH predsedovi KSK JUDr. Zdenkovi Trebuľovi. V stanovisku sa okrem iného uvádza, že mesto Košice zriadilo pracovnú skupinu, ktorá sa bude usilovať o administratívne zavŕšenie procesu vstupu do spoločnosti ORID, s.r.o. s predpokladom, že sa tak stane najneskôr v priebehu 1. polroka 2012. Výsledkom celého procesu bude príprava dodatku k Zakladateľskej listine, v ktorom sa zadefinuje pomer účasti KSK a Mesta Košice v spoločnosti ORID, s.r.o..

Od svojho vzniku spoločnosť ORID, s.r.o. pracuje na podporných projektoch, ktoré vedú k zavádzaniu a riešeniu problémov týkajúcich sa integrovanej dopravy v KSK a k jej aplikácii do praxe, pričom sa snaží o zlepšenie ekonomického využitia verejných finančných zdrojov investovaných do pravidelnej dopravy v Košickom kraji, skvalitnenie poskytovaných služieb a získavanie nových cestujúcich. Rovnako pracuje na podpore aktivít, ktoré sa týkajú investičnej výstavby v rámci budovania infraštruktúry integrovanej dopravy.

V roku 2011 spoločnosť ORID, s.r.o. plynule nadviazala na činnosť z predchádzajúceho obdobia. Spoločnosť naďalej riešila aktuálne problémy v rámci verejnej dopravy, ale zaoberala sa činnosťami, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s verejnou prepravou osôb v regióne Košického kraja. Okrem priebežných činností spoločnosť ORID, s.r.o. participuje na projektoch, činnostiach úlohách, ktoré sú dlhodobého charakteru:

- budovanie informačného systému v spoločnosti ORID, s.r.o.,
- participácia na projekte „Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou mesto“,
- analýza spojov autobusovej linky 802 433 Košice – Prešov – Bardejov,
- analýza prepravných prúdov cestujúcich v rámci Košického kraja,
- participácia na činnosti pracovnej skupiny pre vybudovanie integrovaného dopravného systému koľajovej osobnej dopravy v Košickom regióne a na území mesta Košice.

Aktivita 1.4.1.1. výstavba Globálneho logistického industriálneho parku v Košiciach (GLIP)

Dňa 2.6.2011 bolo vydané Územné rozhodnutie pre „Verejný terminál intermodálnej prepravy“, ktorého investorom sú Železnice SR. V súčasnej dobe sa prebieha výber zhotoviteľa dokončenia projektovej dokumentácie a realizácie 1. etapy stavby. Stavba je umiestnená v katastri Košice – Šaca a obce Sokoľany juhozápadne od Košíc, pod U.S.Steel, s.r.o. Košice. V spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR očakávame vstup do formálnych rokovaní so strategickým investorom v oblasti logistiky pre nadväznú Logistické centrum (cca 110 ha).

1.2. Špecifický cieľ 2. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia

Aktivita 2.1.1.1. spracovanie stratégie dobudovania zásobovania obyvateľstva pitnou vodou

Aktivita 2.1.1.2. spracovanie stratégie dobudovania odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd

Aktivity spolu súvisia. V novembri 2009 bol MŽP SR odsúhlasený „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Košického kraja“, ktorý rieši problém zásobovania pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd v súlade so Smernicou o vodách a legislatívou SR. Ide o vybudovanie infraštruktúry v navrhnutých aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných

obyvateľov (EO) do roku 2015. Problémom zostávajú obce s nižším počtom obyvateľov, ktoré nie je možné spojiť do požadovaných aglomerácií. Stratégia dobudovania zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a takisto stratégia odvádzania odpadových vôd by sa mala sústrediť na osídlenia, ktoré nie sú v „Pláne“ navrhnuté na riešenie. V súčasnosti je napĺňanie „Plánu“ veľmi pomalé z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, resp. nečerpania z fondov EU, dôvodom sú nevyhlásené výzvy v tomto opatrení a problémy robí aj spoluúčasť vodárenských spoločností v investičných projektoch, ktoré len s veľkým úsilím vedú pokrývať. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa uvedené stratégie nespracovali. Z iniciatívy KSK sme rozbehli prípravu stratégie využitia zachytávanej dažďovej vody ako náhrady za pitnú vodu. Rozbehli sa prípravy projektov (Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. Košice) na vypracovanie štúdie, ktorá sa bude zaoberať aj touto problematikou, finančné prostriedky by mali byť zabezpečené z ROP.

Aktivita 2.1.3.1. skvalitnenie územného protipovodňového plánovania na obmedzenie hospodárskych škôd z titulu záplav na území povodia Hornádu

V marci 2011 bol úspešne ukončený projekt „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“. Realizáciou projektu boli riešené úseky vodných tokov Hornád (od hranice s MR po vodnej nádrže Ružín), Svinka, Malá Svinka, Torysa (od ústia do Sekčova po Tichý potok), Sekčov, Ľutinka. Všetky toky sú v povodí Hornádu. Celková dĺžka riešených tokov je 241 km. Hlavným cieľom bolo skvalitnenie územného protipovodňového plánovania na obmedzenie hospodárskych škôd z titulu záplav na území povodia Hornádu. Tento cieľ bol splnený. Okrem iného boli identifikované územia pri vodných tokoch najviac ohrozených povodňami, čo má do budúcnosti veľký význam v územnom plánovaní, pri návrhoch využitia územia. Za predpokladu získania finančnej podpory z Nórskeho finančného mechanizmu má KSK záujem pokračovať v podobných projektoch aj na iných tokoch a povodiach.

Aktivita 2.1.4.1. zlepšenie zariadenia a vybavenia monitorovacích staníc zabezpečujúcich sledovanie stavu povrchových a podzemných vôd

V roku 2011 sa monitorovacia sieť predpovednej služby rozšírila len minimálne. Až koncom roka 2011 bola výzva na ďalšie zahustenie monitorovacej siete v rámci fungujúceho systému POVAPSYS, kde bol oprávneným žiadateľom SHMÚ, ktorý tieto siete aj spravuje. Samotná inštalácia monitorovacích staníc aj na drobných vodných tokoch so zvýšeným rizikom povodní bude realizovaná v roku 2012.

Aktivita 2.2.1.1. Energetická certifikácia budov v pôsobnosti KSK

Povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov KSK ukladá zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje postupy a opatrenia s cieľom optimalizácie energetickej náročnosti budov a zníženia emisií CO₂ z prevádzky budov. **Energetická certifikácia je povinná pri predaji budovy, pri prenájme budovy a pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.**

Na základe výsledkov výpočtu energetickej hospodárnosti bude každá budova zatriedená do energetickej triedy a ako úradne osvedčenie jej bude vydaný energetický certifikát. V prípade veľkej budovy, v ktorej sídli orgán verejnej správy alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí je povinnosťou vlastníka vo verejne prístupných priestoroch vyvesiť energetický štítok, ktorý je výňatkom z energetického certifikátu. Energetický certifikát je platný najviac 10 rokov. Výsledkom celého procesu energetickej certifikácie je dokumentácia kvalitatívnych vlastností budovy, na základe ktorej sa prijímajú opatrenia na ich zlepšenie a optimalizáciu z pohľadu energetickej náročnosti a tým aj na zníženie nákladov na energiu,

zníženie emisie oxidu uhličitého a tým aj podpora racionálneho využitia spotrebovanej energie.

Podľa § 2 ods. 2 uvedeného zákona sa tento zákon okrem budov uvedených v bodoch a) až f) nevzťahuje na historické objekty, vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, budovy v pamiatkových rezerváciách a na budovy uvedené do užívania pred 1. 1. 1947.

Aktivita 2.3.3.1. eliminácia starých environmentálnych záťaží prostredníctvom implementácie dostupných nespáľovacích technológií pre deštrukciu perzistentných organických látok (POPs)

Čiastkové aktivity:

1. Projekt „Globálny program na preukázanie životaschopnosti a odstránenie prekážok zabráňujúcich prijatiu a úspešnej implementácii dostupných nespáľovacích technológií pre zneškodnenie perzistentných organických látok (POPs) so skráteným názvom **„Demonštračný projekt nespáľovacích technológií PCB na Slovensku“:**

Projekt bol zameraný na environmentálne bezpečné zneškodnenie tuhých PCB odpadov uskladnených v areáli Chemka Strážske (destilačné zvyšky z bývalej výroby v objeme 600 t) a ďalších podobných odpadov na Slovensku.

Minister životného prostredia SR József Nagy navštívil v novembri 2010 podnik Chemko Strážske. Po oboznámení sa so situáciou rozhodol projekt uzavrieť z dôvodu, že je zle nastavený a ani po ôsmich rokoch sa prakticky nezačal. **Dňa 23.6.2011 bola KSK z MŽP SR doručená oficiálna informácia, že minister ŽP rozhodol o ukončení projektu.**

2. **Projekt „Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB vo vybraných lokalitách okresu Michalovce“**

Cieľom projektu je spracovanie bezpečnostnej štúdie zameranej na environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov kontaminovaných PCB látkami – stanovenie rozsahu a charakteru kontaminácie pôdy v areáli Chemka Strážske.

Dňa 4.3.2010 bola medzi MŽP SR a KSK podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmetný projekt. Zrealizovalo sa verejné obstarávanie (VO) na externý manažment projektu, ktoré bolo ukončené podpisom zmluvy medzi KSK a firmou JKL production s.r.o dňa 24. 9. 2010. Úlohu koordinátora za KSK vykonáva RNDr. V. Rovňáková. Verejné obstarávanie na dodávateľa odborných technických služieb realizovala na základe mandátnej zmluvy s KSK spoločnosť SB Development s.r.o. Dňa 21.6.2011 bola kompletná dokumentácia z VO doručená na kontrolu Riadiacemu orgánu pre Operačný program Životné prostredie. Riadiaci orgán listom zo dňa 4.10.2011 neoveril dokumentáciu VO a odporučil zrealizovať nové VO. Nové VO je realizované pracovníkmi ÚKSK. Predbežné oznámenie o vyhlásení nového VO bolo zverejnené vo Vestníku VO dňa 4.1.2012. Súťažné podklady boli odoslané Riadiacemu orgánu na kontrolu pred vyhlásením VO. Predpokladaný termín vyhlásenia VO je marec 2012.

3. **Informačná brožúra – Polychlórované bifenyly a ich obsah v životnom prostredí regiónu Zemplín**, Brožúra bola v priebehu rokov 2010 a 2011 distribuovaná starostom obcí okresov Michalovce, Sobrance, mestu Strážske, Komisii ÚP a ŽP Zastupiteľstva KSK a zverejnená na webovej stránke KSK.

1.3. Špecifický cieľ 3. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry

Aktivita 3.1.1.1. racionalizácia škôl a školských zariadení, II. etapa

II. etapa racionalizácie bola ukončená v roku 2008

Uznesením Z/KSK č. 207/2011 zo dňa 21. 2. 2011 bol schválený materiál Zmeny v sieti škôl a školských zariadení s účinnosťou k 31. 8. 2011. Išlo o nasledovné zmeny:

I. vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR s účinnosťou k 31. 8. 2011 a následné zrušenie týchto škôl a školských zariadení:

- Školský internát a Školský majetok , Kapušianska 4, Michalovce ako súčasť Strednej odbornej školy technickej Michalovce,
- Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska – Szőlészeti és Gyümölcsstermesztő Szakközépiskola a Školský internát Viničky, právny nástupca: Stredná odborná škola, Trebišov,
- Stredná odborná škola, Južná trieda 48, Košice, právny nástupca: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice,
- Gymnázium a Školská jedáleň Exnárova 10, Košice, právny nástupca: Gymnázium, Alejová 1, Košice,
- Spojená škola a Školský internát Exnárova 8, Košice s organizačnými zložkami Stredná umelecká škola a Konzervatórium, právny nástupca: Konzervatórium, Exnárova 8, Košice,
- Stredná priemyselná škola hutnícka, Košice, právny nástupca: Stredná priemyselná škola strojnícka Košice,
- Stredná odborná škola - Szakközépiskola Medzev, právny nástupca: Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,
- Stredná priemyselná škola stavebná, Rožňava, právny nástupca: Stredná odborná škola Rožňava,
- Stredná odborná škola Štítnik, právny nástupca Stredná odborná škola Rožňava,
- Stredná odborná škola Dobšiná, právny nástupca: Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná s organizačnými zložkami Gymnázium Dobšiná a Stredná odborná škola Dobšiná,
- Gymnázium Dobšiná, právny nástupca: Spojená škola Dobšiná s organizačnými zložkami Gymnázium Dobšiná a Stredná odborná škola Dobšiná.

II. vyradenie Strednej priemyselnej školy, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. augustu roku nasledujúcom po roku, keď počet žiakov k 15. septembru bude nižší ako 300 a jej následné zrušenie, právny nástupca: Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves.

III. zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR s účinnosťou od 1. 9.2011 a následné zriadenie týchto škôl a školských zariadení:

- Konzervatórium Exnárova 8 Košice,
- Školský internát a Výdajňa školská jedáleň Košice ako súčasť Konzervatória, Exnárova 8, Košice,
- Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná s organizačnými zložkami Gymnázium Dobšiná a Stredná odborná škola Dobšiná.

Od roku 2006 v dvoch racionalizačných etapách došlo najmä k zníženiu počtu odborných škôl a školských zariadení. Posledná zmena v sieti škôl realizovaná v roku 2011 sa dotkla aj gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Košický samosprávny kraj realizoval racionalizáciu siete škôl resp. zmeny v sieti škôl z ekonomických dôvodov s cieľom znížiť prevádzkové náklady na školy a školské zariadenia, ktoré boli ovplyvnené najmä pomerne veľkým poklesom počtu žiakov, ale aj z dôvodu zabezpečenia a zvyšovania kvality vzdelávania žiakov.

Aktivita 3.1.1.2. úspora energie v zariadeniach školskej infraštruktúry

V priebehu roka 2011 boli dokončené práce na investičných projektoch realizované v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 1: Infraštruktúra vzdelávania pre 3 školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, a to na školách:

1. Gymnázium Trebišov,
2. SOŠ drevárska Spišská Nová Ves,
3. Gymnázium Kráľovský Chlmec.

Celkové náklady realizovaných projektov na týchto školách boli 4 014 507,38 €, z týchto nákladov bolo 5% spolufinancovanie z rozpočtu KSK, čo predstavovalo 200 725,38 €. Realizáciou projektov sa podarilo zvýšiť energetickú hospodárnosť budov. Odrazilo sa to v znížení prevádzkových nákladov škôl, čo umožnilo modernizáciu učebných pomôcok a ďalších zariadení využívaných pri edukačnej činnosti škôl.

Aktivita 3.1.2.1. rekonštrukcia zariadení sociálnych služieb

Regionálny operačný program:

1. **DSS RAMIREZ** – Domov sociálnych služieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké šance a lepší život pre mentálne postihnutých klientov v Košickom kraji,“ ktorý je realizovaný pre Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou 45, t.č. ONDAVA – Domov sociálnych služieb. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác.
2. „Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb Trebišov,“ ktorý je realizovaný pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, Trebišov, t.č. **LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.** V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác.
3. „Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce – Matilda Huta“, ktorý je realizovaný pre Domov sociálnych služieb, Breziny 264, Prakovce, t.č. IDEA – Domov sociálnych služieb. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác.
4. „TIS – Technická Inovácia Služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb,“ ktorý je realizovaný pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Skladná č. 4, Košice, t.č. **ARCUS – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.** V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác.

Program Švajčiarsko – slovenskej spolupráce, podanie projektu s názvom „Vstúpte k nám“:

DOMKO – DSS, Park mládeže Košice

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (projekt v kvalite konečného návrhu) spolu s povinnými prílohami bola zaslaná Úradu vlády SR dňa 15. 8. 2011. Dňa 12. januára 2012 bolo Národnému kontaktnému bodu pre Program Švajčiarsko – slovenskej spolupráce doručené stanovisko Švajčiarskej konfederácie k predloženej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v Kvalite konečného návrhu projektu s názvom „Vstúpte k nám“. Žiadosť bola schválená. Košický samosprávny kraj akceptoval ponuku na poskytnutie grantu pre projekt „Vstúpte k nám“ v zmysle Rozhodnutia Švajčiarskej konfederácie.

Projekt v rámci Nórskeho finančného mechanizmu:

„SK0108 – Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra“

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo dňa 30.5. 2011. Záverečná správa bola Riadiacemu orgánu zaslaná dňa 6. 9. 2011. Dňa 9.12. 2011 bola schválená nová organizačná štruktúra pre zariadenie IDEA – DSS so zvýšením počtu o 2 zamestnancov pre potrebu začatia prevádzky rehabilitačného centra. Zároveň z dôvodu prehľadnosti bol spracovaný zoznam a rozpis

jednotlivých procedúr, ktorými sú: masáže, parafín, sauna, vírivka, vodoliečba, bazén, masážne kreslo, perličkový kúpeľ, posilňovňa, telocvičňa. Do budúcnosti sa v záujme zvýšenia otvorenosti zariadenia aj pre verejnosť pripravuje návrh cenníka k jednotlivým procedúram.

Projekt podaný v rámci OP Životné prostredie

VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Projekt zahŕňa výmenu okien za plastové, odstránenie bariér balkónových dverí, zateplenie obvodového plášťa budovy a inštaláciu slnečných kolektorov.

Celkové výdavky: 1 090 497,30 €. Projekt bol podaný v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia a bol vyhodnotený ako úspešný. Implementácia projektu bola ukončená v mesiaci december 2009.

Projekt je monitorovaný. Úspora energie predstavuje približne 13%.

Aktivita 3.1.3.1. modernizácia vybavenia v zdravotníckych zariadeniach

V priebehu roka 2011 neboli z rozpočtu KSK vyčlenené zdroje na nákup a modernizáciu prístrojovej techniky v nemocniciach. Realizované boli návratné finančné výpomoci za účelom riešenia záväzkov, z ktorých bezprostredne hrozili exekúcie. Dňa 22. augusta 2011 schválilo Zastupiteľstvo KSK dlhodobý prenájom majetku Košického samosprávneho kraja v užívaní Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s., Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., pre spoločnosť Vranovská investičná, s.r.o.. Zmluva o dočasnom prevode akcií nadobudla účinnosť dňa 1. 9. 2011. Košický samosprávny kraj na základe predmetnej Zmluvy o dočasnom prevode akcií protokolárne odovzdal dňa 22. 9. 2011 spoločnosti Vranovská investičná, s.r.o. 39 ks rubopisovaných Akcií, čím nadobudol kupujúci vlastnícke práva k predmetným Akciám na dobu určitú 20 rokov. Modernizácia vybavenia v zdravotníckych zariadeniach pokračuje naďalej – výlučne však z vlastných zdrojov nemocníc a zo zdrojov spoločnosti Vranovská investičná, s.r.o..

Aktivita 3.1.4.1. obnova pamiatkovo chránených projektov

1. **Rekonštrukcia Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi – Provinčný dom**
Stavebný projekt je hotový. Čaká sa na vhodnú výzvu pre podanie projektovej žiadosti.
2. **Projekt „Letohrádok Dardanely“ revitalizácia areálu hudobného múzea** bol podaný v rámci ROP 2. 11. 2009. Projekt bol schválený, nenávratný finančný príspevok je v objeme 1 274 995 €. Zatiaľ nie je schválené verejné obstarávanie na stavebné práce.
3. **Rekonštrukcia Moussonovho domu v Michalovciach** – Hvezdáreň: Projekt rekonštrukcie objektu bol pod názvom „Rekonštrukcia Moussonovho domu v Michalovciach“ podaný v rámci ROP 2.11.2009. Projekt **nebol schválený**. Bude pripravený na podanie do ďalšej výzvy na podávanie projektových žiadostí.
4. **Rekonštrukcia a inovácia prezentačného mobiliáru a expozícií v múzeách KSK:** v projekte Mediavel je zahrnutá čiastočná **rekonštrukcia a inovácia expozícií v múzeách: Múzeum Spiša, Banícke múzeum, Zemplínske múzeum, Múzeum a KC južného Zemplína**. Projekt bol podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko. Implementácia projektu začala 1.1.2011 a mala by byť ukončená 31.3.2012.
5. **Dofinancovanie rekonštrukcie účelovej budovy Východoslovenského múzea (VsM):** Projekt na rekonštrukciu VsM, čo je v podstate ďalšia etapa dostavby VsM, bol podaný pod s názvom „Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea“ v rámci Regionálneho operačného programu dňa 5. 11. 2009. Projekt bol

schválený, nenávratný finančný príspevok je v objeme 2 333 770 €. Zatiaľ nie je ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.

6. Rekonštrukcia budovy Múzea a KC južného Zemplína.

Stavebný projekt je hotový. Čaká sa na vhodnú výzvu na podanie projektovej žiadosti.

7. Komplexná rekonštrukcia budovy Gemerského osvetového strediska:

Projekt na rekonštrukciu Gemerského osvetového strediska pod názvom: Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer bol podaný v rámci ROP dňa 21. 10. 2009. Projekt bol schválený; nenávratný finančný príspevok je v objeme 1 031 540,02 €. Zatiaľ nie je ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.

8. Rekonštrukcia Východoslovenskej galérie: Na čiastočnú rekonštrukciu Východoslovenskej galérie bol dňa 17.11.2009 podaný projekt v rámci ROP pod názvom „Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie“. Projekt bol schválený, nenávratný finančný príspevok je v objeme 1 283 129,85 €. Zatiaľ nie je ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.

9. Rekonštrukcia kaštieľa – Zemplínske múzeum Michalovce. Stavebná dokumentácia bola predložená na schválenie stavebnému úradu. Projektová žiadosť bude podaná do vhodnej výzvy na podávanie projektových žiadostí.

10. Rekonštrukcia bansko-hutníckej expozície Banického múzea – zážitkové centrum Sentinel. Po prepracovaní sme projekt podali do programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Investičné projekty KSK v projekte Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 sú reprezentované koncepciou Ostrovy kultúry – otvorené zóny. V rámci Ostrovov kultúry sa realizuje 6 Otvorených zón a Ulička remesiel, lapidárium:

- a. Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice,
- b. Východoslovenská galéria,
- c. Bábkové divadlo,
- d. Barkóczyho palác, knižnica,
- e. Verejná knižnica Jána Bocatia,
- f. Divadlo Thália,
- g. Ulička remesiel – Lapidárium.

Projekty sú v rôznom štádiu rozpracovania od už podaných po projekty tesne pred ukončením a podaním.

Aktivita 3.1.4.2. spracovanie výskumného projektu: Postavenie, vplyv a prínos kultúry v súčasnej spoločnosti

Výskumný projekt by mal byť riešený v rámci projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry formou medzinárodnej konferencie organizovanej v roku 2013 so zameraním na postavenie miestnej a regionálnej kultúry. V rámci tejto úlohy neboli zatiaľ realizované žiadne aktivity.

Aktivita 3.1.4.3. rekonštrukcia Katovho bytu – projekt bol ukončený

Aktivita 3.3.1.1. spracovanie projektu vybudovania jednotného regionálneho turisticko-informačného systému

V rámci projektu Infotour Odbor kultúry a cestovného ruchu KSK pracuje na tvorbe priestorového informačného systému k turistickým cieľom Košického kraja, a to prostredníctvom dopravného značenia umiestneného na cestách I., II. a III. triedy a informačných tabúl.

Aktivita 3.3.1.2. spracovanie marketingovej stratégie Košického samosprávneho kraja

Aktivita sa bude realizovať v rámci pripravovanej stratégie „Stratégia a realizácia marketingu pre KSK“, ktorú KSK pripravuje na podanie v rámci ROP, opatrenie 4.1d-2012/01 vyhlásenej 20.02.2012

Aktivita 3.3.1.3. podpora vzniku združení cestovného ruchu a turisticko-informačných kancelárií na Vínnej ceste, Železnej ceste, Gotickej ceste a Cisársko-kráľovskej poštovej ceste

Na uvedených tematických cestách pôsobia už dlhšiu dobu združenia, ktoré sa venujú rozvoju cestovného ruchu. Gotická cesta – združenie Gotická cesta, Vínna cesta – Tokajská vínná cesta a Turnianska vínná cesta, Železná cesta – Slovenská železná cesta. Odbor kultúry a cestovného ruchu spolupracuje s týmito združeniami v oblasti propagácie turistickej ponuky na týchto cestách. Na Gotickej ceste vzniklo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 informačné centrum v Kluknave – Informačná kancelária Via Mirabilis. Odbor kultúry a cestovného ruchu KSK implementuje projekt Klaster Terra Incognita, základom ktorého je vytvárať partnerstvá a klastre v rámci programu Terra Incognita.

Aktivita 3.3.2.3. spracovanie investičného projektu vybudovania Tokajskej cyklotrasy

V rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus združenie Tokajská vínná cesta mala odsúhlasený projekt „Tokaj je len jeden“, v rámci ktorého bude riešené aj budovanie cyklotrás v Tokajskej oblasti.

Aktivita 3.3.2.4. spracovanie investičného projektu vybudovania Zemplínskej cyklotrasy Zatiaľ neboli realizované žiadne aktivity.

Aktivita 3.3.2.1. spracovanie projektu historického zmapovania Vínnej cesty

Aktivita 3.3.2.2. spracovanie projektu umeleckého zmapovania Vínnej cesty

Aktivita 3.3.3.1. spracovanie projektu historického zmapovania Železnej cesty

Aktivita 3.3.3.2. spracovanie projektu umeleckého zmapovania Železnej cesty

Aktivita 3.3.4.1. spracovanie projektu historického zmapovania Gotickej cesty

Aktivita 3.3.4.2. spracovanie projektu umeleckého zmapovania Gotickej cesty

Aktivita 3.3.5.1. spracovanie projektu historického zmapovania Kráľovsko-cisárskej poštovej cesty

Aktivita 3.3.5.2. spracovanie projektu umeleckého zmapovania Kráľovsko-cisárskej poštovej cesty

Mapovanie tematických ciest prebiehalo v rámci programu Terra Incognita. Základom programu sú aktivity na troch tematických cestách. Kráľovsko – cisárska poštová cesta vzhľadom na menší potenciál v oblasti kultúrneho turizmu bola nateraz z koncepcie programu Terra Incognita vypustená. Atraktivity na tejto ceste budú zahrnuté do abovskej vetvy Gotickej cesty. Mapovanie aktérov cestovného ruchu a atraktivít na týchto cestách bolo zrealizované prostredníctvom projektu Via regia + (projekt ARR) a jeho spresnenie bolo súčasťou projektu Mediavel (implementovaný na Odbore kultúry a CR KSK). Všetky činnosti cielené na mapovanie atraktivít tematických ciest boli splnené a ukončené.

Nadalej však pokračuje projekt Pamäť ľudu, ktorý mapuje nehmotné kultúrne dedičstvo KSK.

1.4. Špecifický cieľ 4. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti ľudských zdrojov

Aktivita 4.1.1.1. spracovanie stratégie financovania projektov zamestnanosti zameraných na tvorbu nových pracovných miest s cieľom dosiahnutia stavu plnej zamestnanosti

Od začiatku celosvetovej hospodárskej krízy v roku 2009 sa výraznejšie prehlbuje nerovnováha na trhu práce, rastie počet nezamestnaných, pričom výraznou mierou na počte nezamestnaných sa podieľajú dlhodobo nezamestnaní. Takáto situácia je aj v Košickom kraji. Umiestnenie dlhodobo nezamestnaných na trhu práce je obtiažne z dôvodu nízkej kvalifikácie, nedostatku pracovných miest vyžadujúcich nízku kvalifikáciu, ale aj neochoty pracovať. Negatívom dlhodobej nezamestnanosti je strata pracovných návykov a odkázanosť na sociálne dávky, ktoré nevytvárajú predpoklady a podmienky pre plnohodnotný život.

KSK v nadväznosti na zverejnenú výzvu v rámci ROP v súčasnosti pripravuje projektovú žiadosť s cieľom získania finančných prostriedkov na vypracovanie stratégie zameranej na dosiahnutie dôstojného a kvalitného života deklarovovaných skupín obyvateľov. Projektová žiadosť bude predložená v rámci výzvy ROP - opatrenie 4.1d-2012/01 vyhlásenej vo februári 2012.

Aktivita 4.1.2.1. spracovanie stratégie využitia potenciálu voľných segmentov odberateľského trhu vnútri i mimo územia samosprávneho kraja

Pre naplnenie zámerov v rámci tejto aktivity sa uberáme dvomi základnými smermi, **prvým je podpora vidieka, kde pripravujeme podporu odbytu pomocou farmárskych trhov ako aj prípravu programu logistického parku pre agrokomodity**. Druhým základným smerom je príprava marketingovej stratégie pre oblasti kreatívnej ekonomiky, ktorá by mala doriešiť otázku dopytu po produktoch kreatívnej ekonomiky.

Prvý smer: podpora odbytu pomocou farmárskych trhov a príprava programu logistického parku pre agrokomodity

V súčasnej dobe prebieha príprava projektovej dokumentácie podľa podmienok výzvy ROP - opatrenie 4.1d-2012/01 vyhlásenej 20.02.2012. V rámci tejto výzvy plánuje KSK podať projektovú žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom vypracovania sektorového rozvojového dokumentu na úrovni NUTS 3 s názvom **Program budovania Logistického centra pre agrokomodity**. Cieľom projektu je vypracovanie programu vybudovania logistického centra pre agrokomodity za účelom ako príspevok pre zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a potravinovej sebestačnosti Košického kraja. Následným vybudovaním logistického centra sa prispeje k posilneniu lokálneho trhu, zachovaniu domácej poľnohospodárskej produkcie, vytváraniu nových pracovných miest i podpore rozvoja vidieka.

Druhý smer: Príprava Stratégie popularizácie kreatívnej ekonomiky Košického samosprávneho kraja, ktorá by mala doriešiť otázku dopytu po produktoch a službách kreatívnej ekonomiky

KSK plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP (Opatrenie 4.1d-2012/01), vyhlásenej dňa 20.2.2012. Jedným z hlavných cieľov projektu je popularizácia kreatívnych odvetví a vytvorenie zázemia pre spoluprácu, rozvoj obchodných a pracovných príležitostí a ponuky atraktívnych kreatívnych služieb. Cieľom je nastavením vhodných opatrení a aktivít:

- posilniť prezentáciu a propagáciu kultúry, talentov, kreatívnych aktérov, produktov a služieb v regióne, na Slovensku a v zahraničí,
- viac využiť kreatívny potenciál, ktorý môže priniesť posilnenie zamestnanosti, rozvoj kreatívnych služieb a produktov, rast konkurencieschopnosti a exportnej výkonnosti

firiem Košického kraja a Slovenska, aj zlepšenie kvality života, rast hospodárstva a zvýšenie atraktivity regiónu.
Momentálne prebieha príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok a súvisiacich podkladov.

Aktivita 4.2.1.1. vytváranie nástrojov miestnej samosprávy pre komunitnú prácu

Odbor krízového riadenia, BOZP a KR KSK na základe PHSR v roku 2011 sa sústredil na dobudovanie partnerstiev v sociálne vylúčených spoločenstvách. Aktivity sme zamerali na odkrývanie kapacít ľudských zdrojov a sieťovanie významných partnerských organizácií. Takto sme podporili tvorbu partnerstiev pre oblasť Spiš, Gemer a okres Trebišov. Aj v roku 2012 pokračujeme v sieťovaní a tvorbe partnerstiev v okrese Košice-okolie, Michalovce a Sobrance.

V oblasti terénnej sociálnej práce a komunitnej sociálnej práce aj napriek vybudovaným kapacitám nás Fond sociálneho rozvoja odmietol. Pre metodické usmerňovanie, koordináciu a budovanie terénnej a komunitnej sociálnej práce kontrahoval 5 mimovládnych organizácií. Pre územie Košického samosprávneho kraja bolo kontrahované ETP Slovensko, ktoré by malo zabezpečovať rozvoj obidvoch významných nástrojov v oblasti individuálneho i komunitného rozvoja. Daný stav sme pripomienkovali, ale zatiaľ bez zjavného výsledku. Obidva národné programy sú v štádiu prípravy.

Pre koordináciu aktivít v rámci kraja sme vytvorili odborný poradný orgán predsedu KSK – Radu Rómov. Oslovili sme významných aktivistov, ktorí vykonávajú aktivity priamo v rómskych komunitách. Súbežne zabezpečujeme projektové krytie činnosti poradného orgánu a pripravujú sa výstupy do oblasti zamestnanosti, zamestnatel'nosti, vzdelávania a ochrany zdravia.

Ďalším smerom činnosti je kooperácia s organizáciami, ktoré sa zaoberajú osobami so zdravotným postihnutím. Vyhľadávame aktivity, ktoré je možné podporiť a koordinovať tak, aby mali celokrajský dopad. Ide najmä o nerovnomerné pokrytie územia jednotlivými službami pre osoby so zdravotným postihnutím a pod..

Vzhľadom na nastavenie aktivít zo strany Fondu sociálneho rozvoja úlohu považujeme za priebežne plnenú.

Aktivita 4.2.2.1. tvorba sociálnych podnikov a sociálnych inkubátorov

Myšlienka zakladania sociálnych podnikov bola zameraná najmä na vytváranie a udržanie pracovných miest, zvyšovanie zručností pre adaptabilitu pracovnej sily prostredníctvom projektov územnej samosprávy pri starostlivosti o všestranný rozvoj územia. Ich hlavným cieľom bolo najmä **zlepšenie prístupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie k pracovným príležitostiam, zvýšenie adaptability pracovnej sily a ich lepšia zamestnatel'nosť**. Problémom pri zakladaní sociálnych podnikov podporovaných z fondov EÚ boli najmä chýbajúce jednoznačné legislatívne podmienky a **právne rámce zo strany EK a ich dodržiavanie na vnútroštátnej úrovni** z hľadiska neporušovania zásad hospodárskej súťaže a poskytovanej výšky štátnej pomoci.

Aktivita 4.3.1.1. spracovanie koncepcie rodinnej politiky KSK

Aktivita sa bude realizovať v ďalšom období v nadväznosti na realizáciu aktivít vyplývajúcich z Politiky súdržnosti v programovacom období 2014 – 2020, Nadregionálnej stratégie KSK v rámci iniciatívy Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, aktivita 7.6.4. – Podporovať nové spôsoby nastolenia rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a politiky zamerané na aktívne starnutie a podpora rodovej rovnosti. KSK bude spolupracovať pri hľadaní nových spôsobov nastolenia rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a podporovať rodovú rovnosť.

Aktivita 4.3.2.1. spracovanie koncepcie služieb pre rodiny v KSK

Aktivita zatiaľ nebola realizovaná.

Aktivita 4.3.3.1. príprava návrhov na riešenie problémov vytýčených v projekte Výskum špecifik pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami v Košickom kraji, projekt bol ukončený

Výstupom projektu sú zistenia, že celkovo je nedostatok: sociálnych služieb (vývarovňa, opatrovateľská služba), nedostatočná zdravotná starostlivosť, problémy s bývaním, nevyhovujúca doprava, málo predškolských zariadení, nedostatok pracovných miest, nízky počet občianskych združení zameraných na pomoc matkám a i.

Riešenie problémov vyplývajúcich zo záverov projektu má dlhodobý charakter a je v kompetencii jednak regionálnej samosprávy (stredné školstvo, sociálne zariadenia, cesty II. a III. triedy, regionálna preprava osôb, zdravotníctvo, kultúra a cestovný ruch), ale aj štátnej správy (cesty vyššej úrovne, železničná doprava, vytváranie podmienok pre vznik nových pracovných miest, výstavba nájomných bytov a i.), resp. územnej samosprávy (zriaďovanie predškolských zariadení a i.), ako aj občianskych združení a dobrovoľných organizácií (organizácie zamerané na pomoc matkám, starým ľuďom, bezdomovcom a pod.). KSK pri realizácii úloh, ktoré má vo svojej kompetencii a v súlade so zákonom o územnej samospráve sa stará o všestranný rozvoj územia samosprávneho kraja. V tom zmysle schvaľuje a implementuje odvetvové koncepcie a stratégie rozvoja s prihliadnutím na zvyšovanie kvality života obyvateľov v Košickom kraji. Výstupy predmetného projektu sú riešené v rámci jednotlivých aktivít PHSR KSK a prispievajú k plneniu záverov vyplývajúcich z predmetného projektu.

1.5. Špecifický cieľ 5. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania

Aktivita 5.1.1.1. spracovanie stratégie prispôsobenia obsahovej náplne vzdelávania potrebám podnikateľského sektora technologicky vyspelých pobočiek multinacionálnych spoločností a potrebám podnikateľského sektora malých a stredných podnikov v domácom vlastníctve

Aktivita sa dotýka stredných odborných škôl (SOŠ) v oblasti spracovania školských vzdelávacích programov pre skupiny odborov vzdelávaných na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. V súlade so spracovanou Koncepciou rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v súlade s požiadavkami zamestnávateľov boli do školských vzdelávacích programov zapracované ich požiadavky na absolventov. V roku 2011 sa spolupráca SOŠ so zamestnávateľmi rozšírila aj na oblasť tvorby predmetov, do ktorých boli zapracované nové technológie. 23 firiem spolupracovalo pri vymedzení odborných kompetencií absolventov, 74 firiem spolupracovalo pri vymedzení odborných zručností absolventa, 29 firiem spolupracovalo pri zmene obsahu existujúceho odborného predmetu. V 16 prípadoch v spolupráci s firmou boli vypracované osnovy pre nový vyučovaný predmet. Uvedené informácie sú spracované na základe dotazníkového prieskumu, v rámci ktorého reagovalo spolu 217 firiem. Z uvedených firiem má 35% firiem do 20 zamestnancov, do 50 zamestnancov 23% firiem, do 100 zamestnancov 13% firiem a nad 100 zamestnancov 29% firiem zúčastnených v prieskume.

Aktivita 5.1.3.1. vzdelávanie zamestnancov

Projekt KVApka je implementovaný v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prebehlo druhé verejné obstarávanie na dodávateľa vzdelávacích služieb

na vzdelávanie zamestnancov, ktoré bolo Riadiacim orgánom MPSVaR SR schválené. Pripravujú sa zmluvy s víťazmi verejného obstarávania spolu s časovým harmonogramom na zabezpečenie jednotlivých aktivít. Časový harmonogramu aktivít projektu bol Riadiacim orgánom predĺžený do 10/2012.

Cieľom projektu je vyššia vzdelanostná úroveň zamestnancov a tým aj lepšia kvalita poskytovaných služieb v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Na implementáciu projektu bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 320 tisíc €. Cieľovou skupinou sú riadiaci pracovníci zariadení KSK, zamestnanci zariadení poskytujúcich sociálne služby, ako aj zamestnanci kultúrnych zariadení a informačných centier.

Projekt Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ

Banskobystrický samosprávny kraj spolu s partnermi – Košickým, Prešovským, Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom začal v decembri 2011 realizovať 19 mesačný projekt zlepšenia a rozvoja kapacít jednotlivých samosprávnych krajov, pri realizácii verejných politík a poskytovaní verejných služieb občanom prostredníctvom efektívneho riadenia programov a projektov financovaných EÚ resp. inými zdrojmi. Projekt vytvorí efektívny mechanizmus na prípravu a implementáciu verejných politík v podobe systému riadenia pomoci. Prostredníctvom zvýšenia odborných zručností bude na rôznej úrovni vyškolených do 500 zamestnancov, ktorí budú pripravení zvládať úlohy súvisiace s rozšírenými kompetenciami samosprávnych krajov ako s nástupom nového programového obdobia. Špecifickými výstupmi budú vypracované štúdie, ktoré ako inovatívne nástroje umožnia samosprávnym krajom využívať proklientsky orientovaný prístup najmä pri projektoch a verejných službách, v ktorých sú zapojení aj regionálni partneri ako obce, mestá, MVO ako aj samotná verejnosť. V súčasnosti sa rozbiehajú prvé aktivity, medzi prvými sa spustil procesný audit v samosprávnych krajoch zameraných na projektový cyklus a manažment eurofondov. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Aktivita 5.1.4.1. podpora kombinovaných foriem vzdelávania

Aktivita 5.1.5.2. zlepšenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu

Cieľom prvej aktivity bolo zníženie vysokého počtu neprospievajúcich žiakov na základných školách poskytnutím kombinovanej formy vzdelávania na osemročných združených školách“ a cieľom druhej aktivity príprava projektu pokusného overovania pre umožnenie prístupu ku vzdelávaniu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia formou 8 ročného odborného vzdelávania v internátnej forme.

Aktivita je **ukončená** spracovaním návrhu na experimentálne overovanie 8-ročnej strednej odbornej školy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia pri SOŠ v Medzeve a zamietnutím podaného experimentu Ministerstvom školstva SR.

Aktivita 5.1.5.1. efektívne prepojenie vzdelávacieho systému

Aktivita **ukončená** zmenou legislatívy v oblasti školstva. Súčasná legislatíva neumožňuje navrhnuté pôvodné riešenie. Nové riešenie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo schválené v Zastupiteľstve KSK dňa 20.2.2012 v materiáli „Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK odpovedajúcej požiadavkám trhu práce“ v časti III. Návrh riešenia vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Aktivita 5.1.5.3. spracovanie Koncepcie aktívnej politiky mládeže v Košickom kraji

Koncepcia rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja bola schválená na 22. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 8. 12. 2008. Úlohy vyplývajúce z koncepcie sa na školách plnia, v súčasnosti prebieha zber údajov zo stredných škôl a školských zariadení.

Vyhodnotenie koncepcie za rok 2011 bude predložené na rokovanie Zastupiteľstva KSK v mesiaci jún 2012. V súčasnosti je v štádiu vyhodnocovania.

Na stredných školách a v školských zariadeniach bolo celkom v roku 2011 do krúžkov zapojených 26 602 žiakov

Aktivita 5.2.1.1. podpora mládežníckeho športu

Odbor školstva Košického samosprávneho kraja vypracoval Koncepciu rozvoja športu KSK. Hlavným cieľom vytvorenia koncepcie bolo monitorovanie stavu športových aktivít všetkých vekových skupín a vytvorenie mechanizmov na podporu rozvoja vrcholového, výkonnostného a mládežníckeho športu na celom území Košického kraja s dobou realizácie v rokoch 2007 – 2013. Darí sa plniť aj jednu z najdôležitejších úloh v prijatej koncepcii - dlhodobo a masovo zapojiť do športových súťaží žiakov stredných škôl v kraji. Na základe toho odbor školstva organizuje v spolupráci s CVČ-RCM dlhodobé postupové súťaže družstiev žiakov stredných škôl. Doposiaľ každým ďalším ročníkom sa žiakom vytvárajú lepšie možnosti - rozširuje sa počet športov a aj dosahujeme vyšší počet žiakov, ktorí sa zapojili do súťaží. Za hodnotiaci rok to bolo 9 362 žiakov v 16 druhoch športov.

Aktivita 5.2.2.1. podpora vrcholového športu

Ministerstvo školstva SR na základe zverejnenej výzvy a vyhodnotenia predložených žiadostí pridelo certifikát Centra olympijskej prípravy (COP) na obdobie od 1.9.2009 do 30.6.2013 Športovému gymnáziu, Trieda SNP 104, 04011 Košice. Na základe udeleného certifikátu škola s COP každoročne predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie pre aktuálny školský rok. Poslaním COP je zabezpečenie komplexnej starostlivosti pre mladých talentovaných športovcov za účelom budúcej úspešnej reprezentácie SR v olympijských športoch a výchovy týchto športovcov ako hodnotové vzory pre občanov SR.

Športy v COP: basketbal dievčatá, hádzaná chlapi, plávanie, športová streľba, stolný tenis, vzpieranie, zápasenie.

Počet športovcov za rok 2011: 69 žiakov

Aktivita 5.2.3.1. podpora športu pre všetkých

Aktivita 5.2.4.1. podpora športových podujatí

V školskom roku 2010/2011 bol zorganizovaný tretí ročník dlhodobých športových súťaží pre žiakov stredných škôl v pôsobnosti KSK. Odbor školstva KSK okrem tejto celoplošnej aktivity zapája žiakov do ďalších športových súťaží, na ktorých je spoluorganizátorom (napr. „S Optimou do formy“, „Košický minimaratón“ a pod.). Okrem týchto činností školy poskytujú svoje telocvične širokej verejnosti na športové využitie. Organizuje sa množstvo turnajov určených pre žiakov a ich rodičov.

V októbri 2008 Zastupiteľstvom KSK ustanovilo VZN KSK č.7/2008 o poskytnutí dotácie na rozvoj športu za účelom upraviť podmienky poskytovania dotácie na rozvoj mládežníckeho športu, rekreačného športu, podporu materiálno-technického zabezpečenia existujúcich športových zariadení a podporu výstavby a stavebných úprav športových objektov, zariadení a športových plôch o dotáciách na podporu rozvoja športu, na základe ktorého poskytne právnickým a fyzickým osobám podnikateľom na podporu športovej činnosti na území KSK finančnú dotáciu na základe ich žiadosti. Zdroj financovania: každoročne 2% z rozpočtu KSK, štátny rozpočet - kapitola MŠ SR, súkromné zdroje, štrukturálne fondy EÚ (ROP). Mrzí nás, že vzhľadom na dopady finančnej krízy v roku 2011 na túto aktivitu neboli vyčlenené finančné prostriedky.

Aktivita 5.2.5.1. podpora technického zabezpečenia športu

V roku 2011 sa napriek nepriaznivej finančnej situácii na 14 školách podarilo zrealizovať opravy rôzneho charakteru v telocvičniach a príslušných zariadeniach. Niektoré opravy sa realizovali po etapách, aby došlo k rozloženiu finančného zaťaženia. V štyroch etapách prebehla oprava telocvične na SOŠ technickej v Košiciach. Podobne tomu bolo s opravou strechy na športovom gymnáziu v Košiciach. Strechy sa opravovali aj na Strednej zdravotníckej škole, Kukučínova Košice, či SOŠ Moldava nad Bodvou, pracovisko Medzev. Ďalšiu skupinu tvoria školy, kde sa opravovala podlaha v telocvičniach (Gymnázia - Javorová Spišská Nová Ves, Poštová Košice, Kuzmányho Košice). V Michalovciach na SOŠ technickej sa zase uskutočnila oprava sociálnych zariadení pri telocvični a na OA Michalovce oprava okien, dverí a radiátorov. Zlepšili sa teda podmienky tak pre žiakov týchto škôl ako aj pre športové kluby a rôzne skupiny športových nadšencov, ktoré tieto telocvične využívajú.

1.6. Špecifický cieľ 6. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky

Aktivita 6.1.4.1. vznik IT klastra

Plán aktivít 2011 v rámci IT Valley plynule nadväzoval na plány predchádzajúcich rokov a zároveň v aktivitách združenia ukázal jasnú profiláciu na 3 oblasti:

- Vzdelávanie – aktivity zamerané na podporu vzdelávania, žiakov a študentov
- Inovácie – aktivity zamerané na inovácie v oblasti IKT
- Investície – aktivity zamerané na vytvorenie nových investičných príležitostí, zlepšenie investičného prostredia

Vzdelávacie aktivity sa v roku 2011 sústredili na podporu extrakurikulárnych aktivít pre stredné a vysoké školy a ich študentov. Za zmienku stojí realizácia odborného seminára Inovácia stredoškolskej výuky IKT, informačný seminár Agilné technológie, informačný seminár Vysokovýkonné počítanie na Slovensku, informačný seminár Hospodárska informatika.

Oblasť inovácií je pre IT Valley novou oblasťou, aj keď inovačné aktivity sa objavili už aj v minulých rokoch. V oblasti inovácií sa IT Valley v roku 2011 zamerala na tieto aktivity:

- Regionálna podpora inovácií a transferu technológií v rámci Univerzitného centra inovácií (UCITT)
- Informačný seminár Venture kapitál
- Noc výskumníka v Košiciach
- Seminár Rozviň svoju budúcnosť

Oblasť investičného prostredia v oblasti IKT je pre združenie IT novou oblasťou, podobne ako inovácie. Rozpracovali sme práce na IKT profile KSK, realizovali sa semináre Podnikanie a siete, uskutočnil sa pracovný obed s veľvyslancom USA a uskutočnil sa seminár To je IT: Diskusie RWE IT Slovensko. Za úspech považujeme aj to, že študenti Technickej univerzity v Košiciach vyhrali slovenské kolo Imagine Cup a postúpili do svetového finále v USA.

Aktivita 6.2.1.1. vznik vedecko-technologického parku (VTP)

Vypracovali sme urbanistickú štúdiu vedecko-technologického parku v priemyselnej zóne Kechnec a pripravujeme zadanie pre štúdiu uskutočniteľnosti VTP parku. Zároveň Technická univerzita Košice a Univerzita P. J. Šafárika Košice pripravili žiadosť do prvého kola pre zriadenie vedeckého parku. V prípade, že v rámci prvého kola budú úspešní, očakávame, že aj v spolupráci s KSK sa kompletná žiadosť spracuje v I. polroku 2012.

Aktivita 6.2.2.1. spracovanie inovačnej stratégie KSK

Regionálna inovačná stratégia (RIS) KSK bola Zastupiteľstvom KSK schválená v apríli 2008, pravidelne 1x ročne sa vyhodnocuje. RIS sa naplňa prostredníctvom realizácie akčného plánu. KSK na základe aktivít stanovených v RIS realizuje projekt KNOWBRIDGE.

Vzhľadom k tomu, že vláda SR v roku 2011 pripravila zásadné zmeny v oblasti inovácií, t.j. program Minerva 2.0 a program Fénix, budeme nútení naše pôvodné projekty RIC a RMC stiahnuť (z plnenia uznesení Z/KSK) resp. prepracovať v súlade s novou politikou. Budeme to realizovať prostredníctvom novej Regionálnej inovačnej stratégie 2012 – 2020, ktorú pripravujeme.

Aktivita 6.2.2.2. zlepšenie efektívnosti a súdržnosti politík vedy a výskumu na európskej, národnej a regionálnej úrovni

V nadväznosti na vyššie uvedenú aktivitu od 1.1.2010 je KSK partnerom v rámci medzinárodného projektu OCOPOMO. Projekt je zameraný na „modelovanie politík“, na proces prípravy a spracovania stratégií a politík s organizáciami verejnej správy v rámci strategického plánovania. Projekt z hľadiska časového plnenia sa nachádza v dvoch tretinách plnenia aktivít, úspešne prešiel priebežnou oponentúrou v Bruseli. V súčasnosti KSK a región Campania testuje iteratívny proces identifikácie parametrov modelov politík z naratívnych scenárov, vrátane vytvárania a simulácie modelov politík (so zameraním na ich možné následky a vplyvy, vrátane identifikácie neočakávaných a nepredpokladaných stavov).

1.7. Špecifický cieľ 7. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka

Aktivita 7.3.1.1. projekt ROBINWOOD, projekt bol ukončený v roku 2008

Aktivita 7.3.1.2. program využívania obnoviteľných zdrojov energie v subregiónoch Košického kraja

Aktivita sa bude realizovať v rámci pripravovanej „Regionálnej stratégie využívania obnoviteľných zdrojov energie z hľadiska energetickej efektívnosti“. KSK pripravuje projektovú žiadosť na podanie v rámci zverejnenej výzvy v rámci ROP, opatrenie 4.1d-2012/01 vyhlásenej 20.02.2012

Aktivita 7.3.2.1. štúdia územia Východoslovenskej nížiny z hľadiska jej energetického a balneologického využitia

Aktivita 7.3.2.3. štúdia o využití geotermálneho potenciálu Východoslovenskej nížiny

Aktivita je čiastočne splnená, štúdia o využití geotermálneho potenciálu bola vypracovaná v roku 2008 v rámci projektu ROBINWOOD.









Aktivita 7.3.2.2. geofyzikálna štúdia vybraného územia







Aktivita zatiaľ nebola realizovaná z dôvodu vysokej finančnej náročnosti projektu.

Aktivita 7.5.1.1. projekt UNDP – projekt bol ukončený v roku 2010









2. Vyhodnotenie merateľných indikátorov za rok 2011







2.1. Špecifický cieľ 1. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy

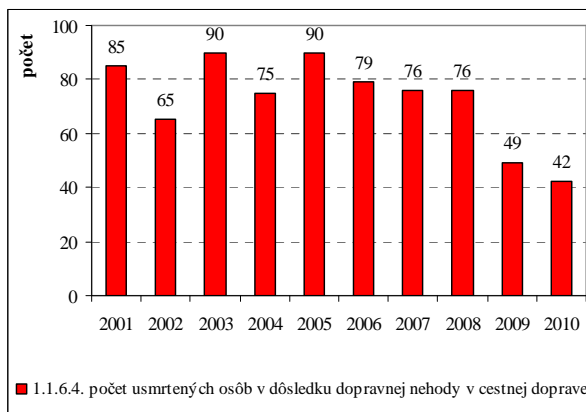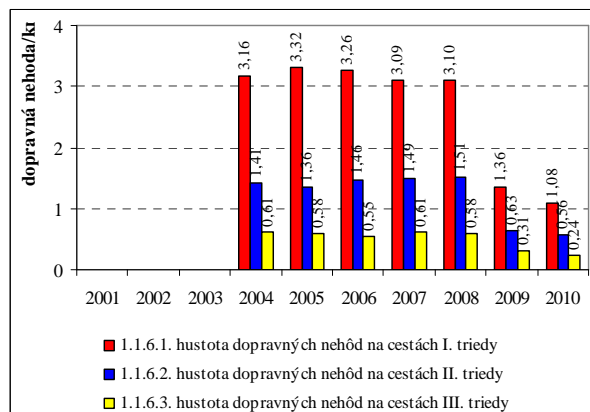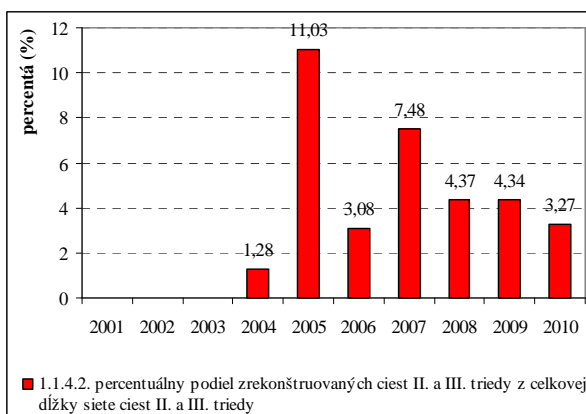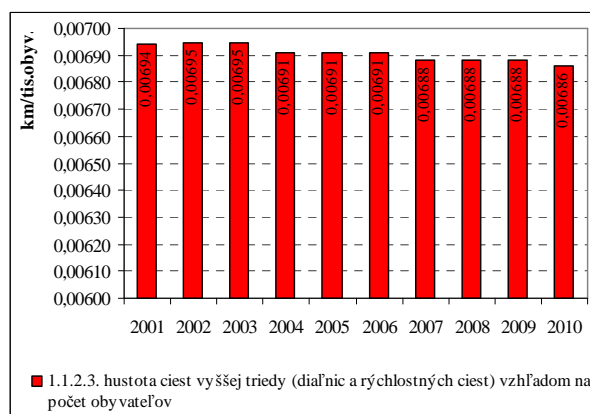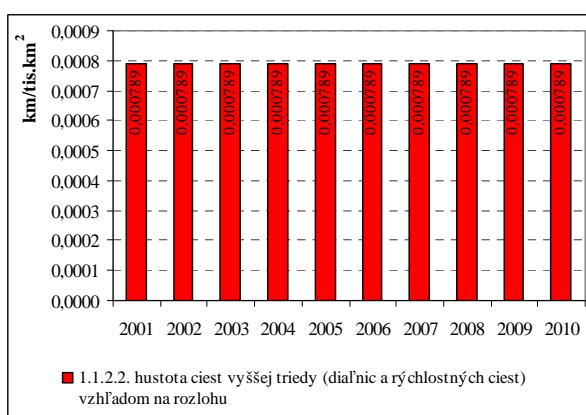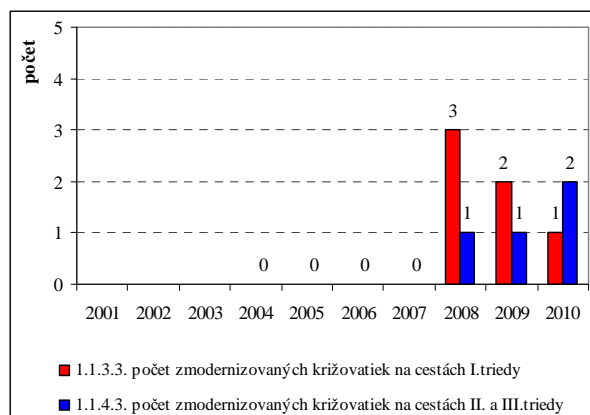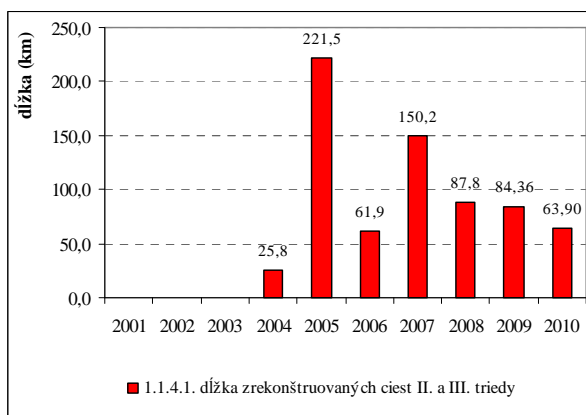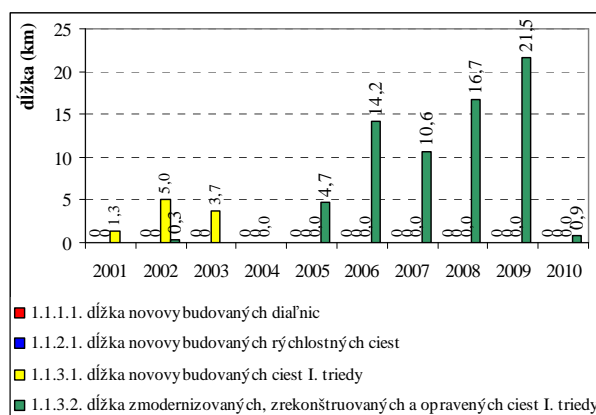

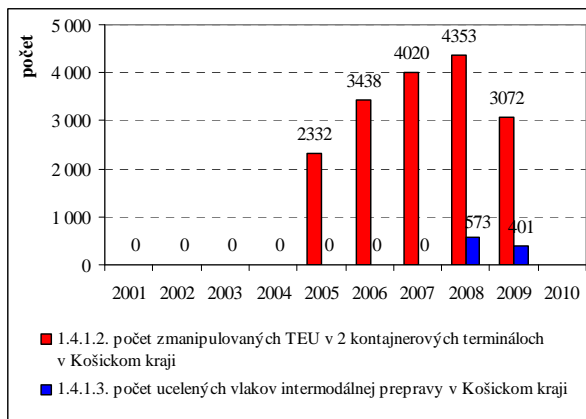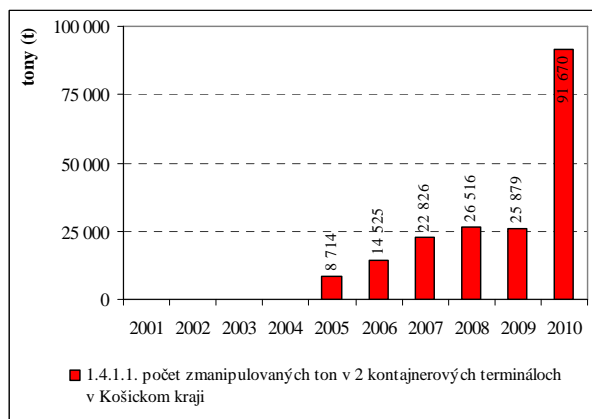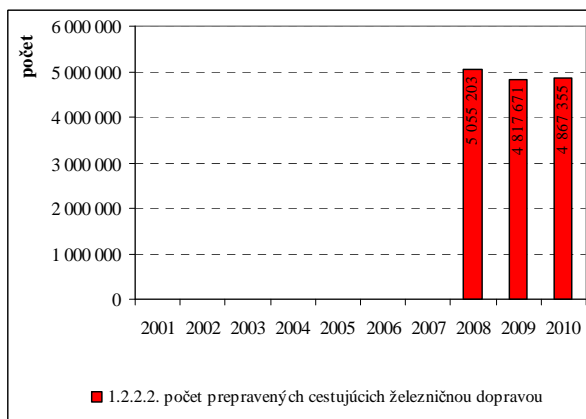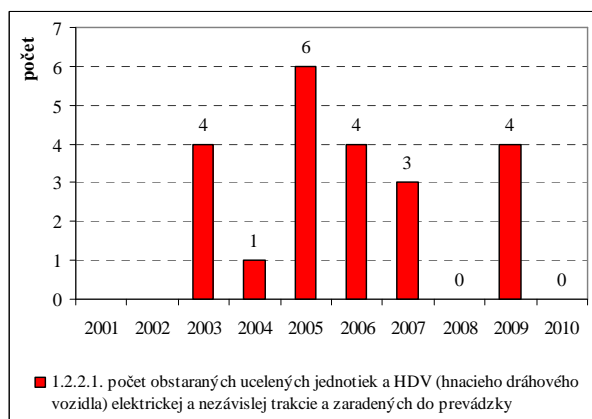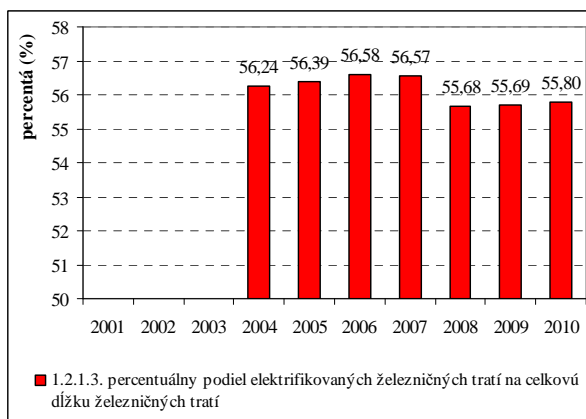
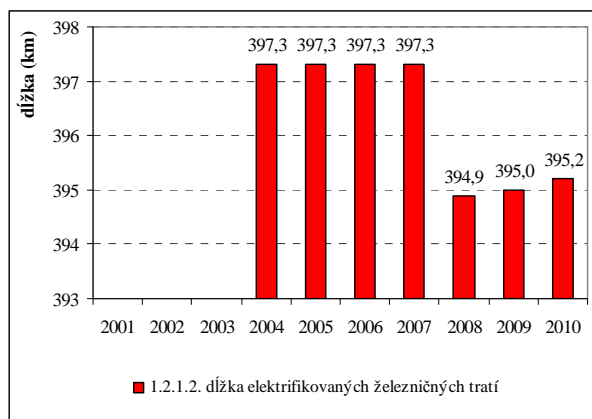









2.2. Špecifický cieľ 2. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia

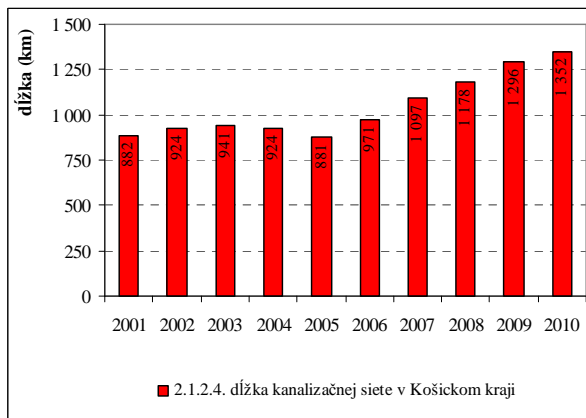
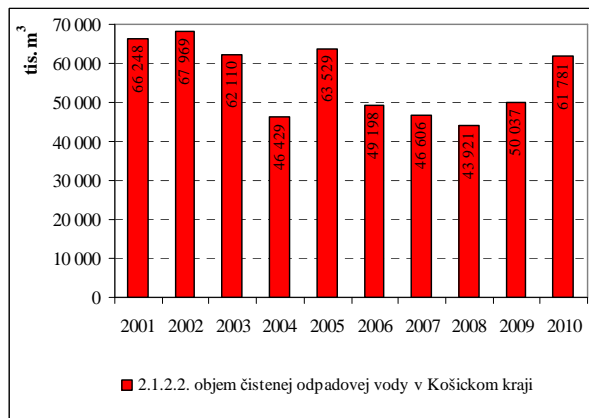
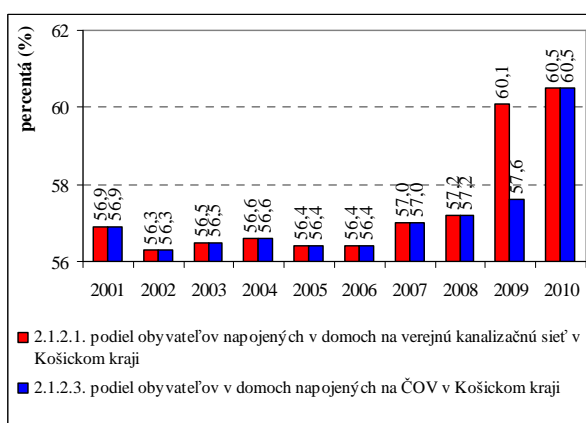
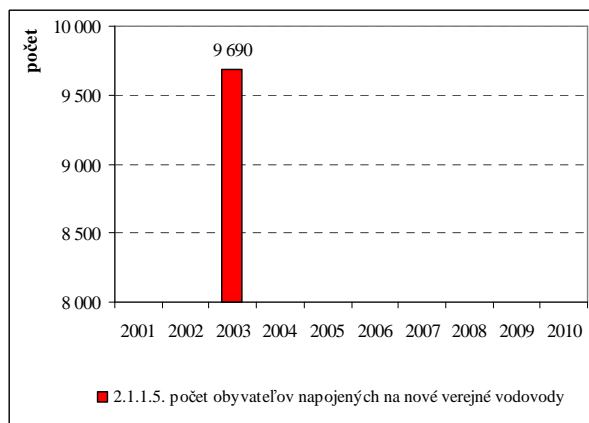
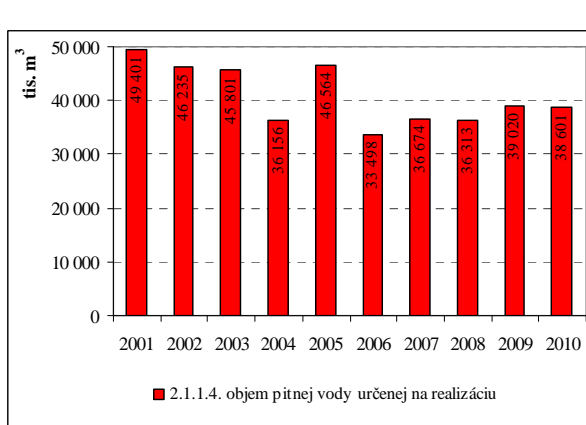
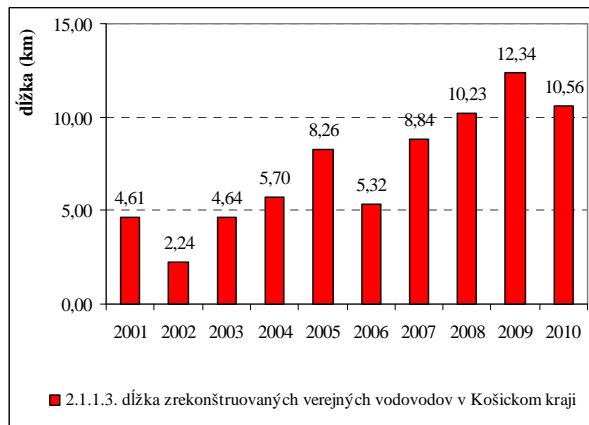
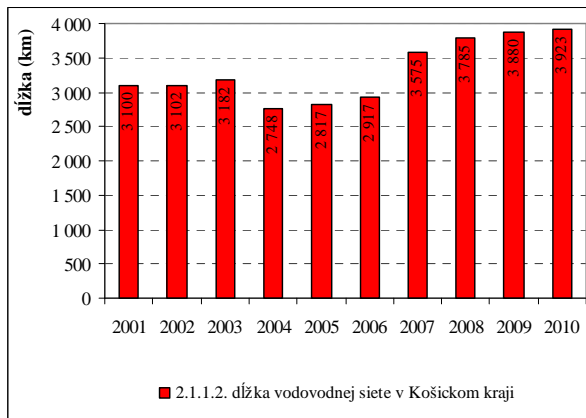
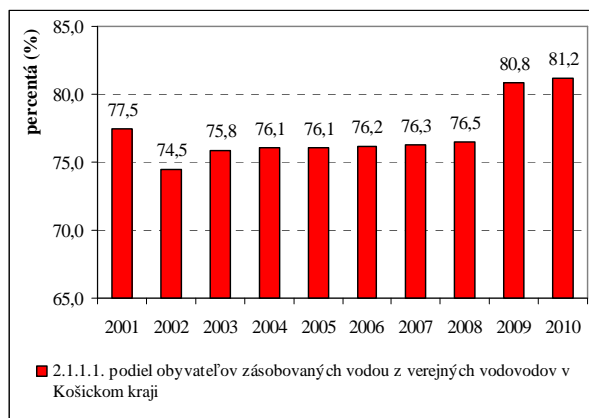


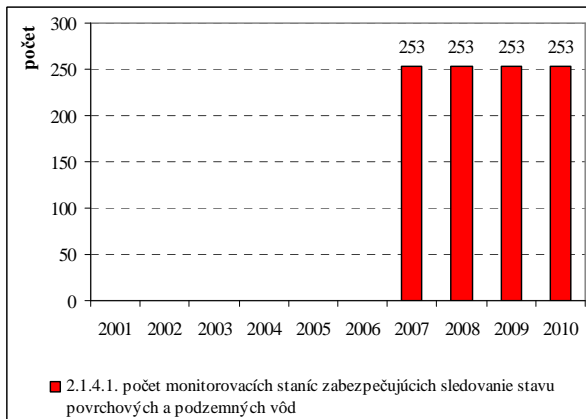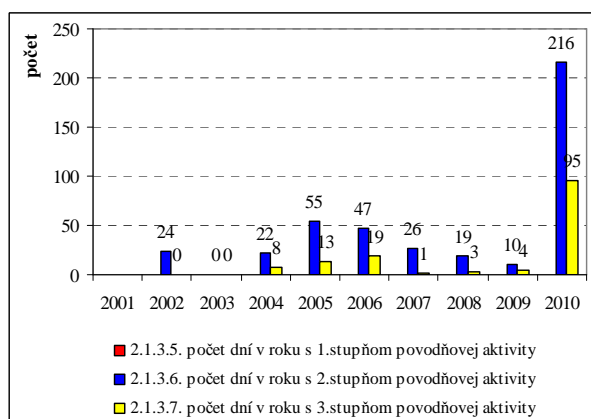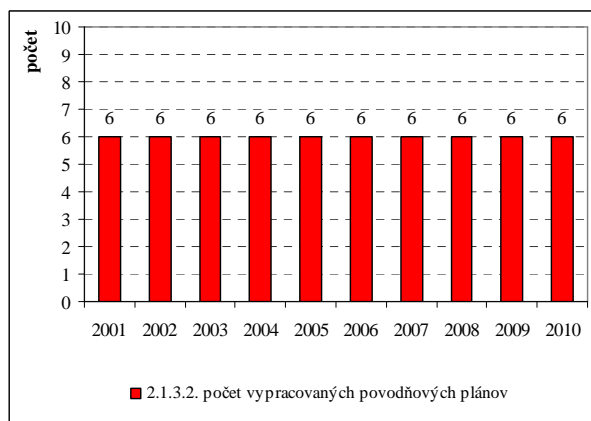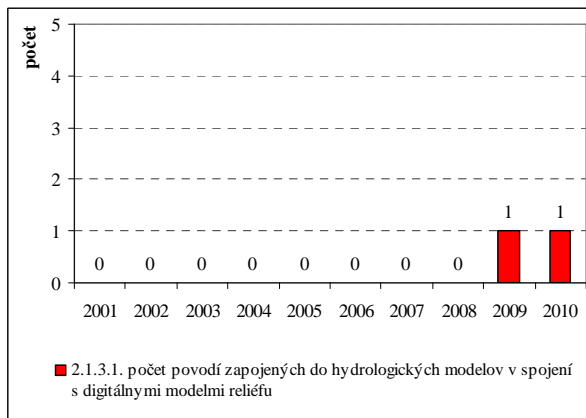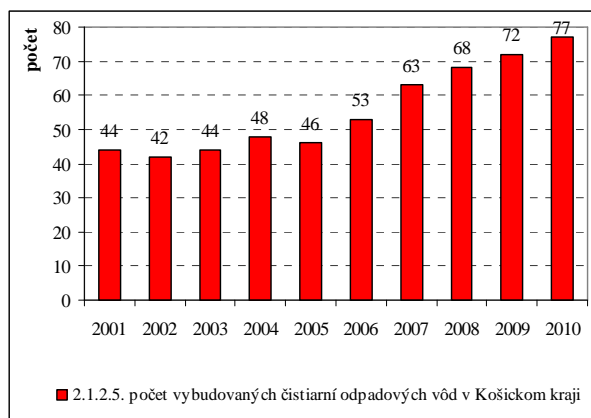









Indikátor 2.1.3.6. a 2.1.3.7. – v roku 2010 boli veľké povodne od konca mája a povodňové stupne boli ponechané na niektorých tokoch až do konca roku 2010 kvôli vykonávaným záchranným a zabezpečovacím prácam







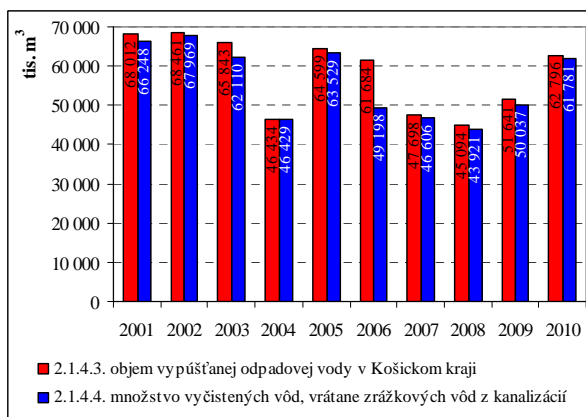
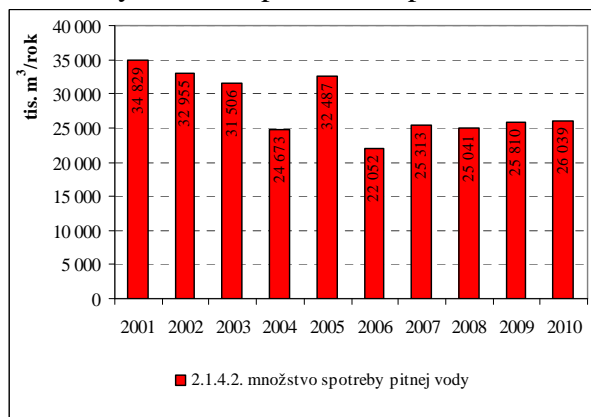


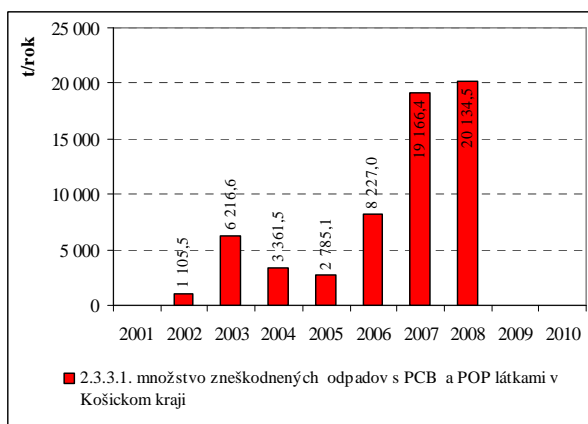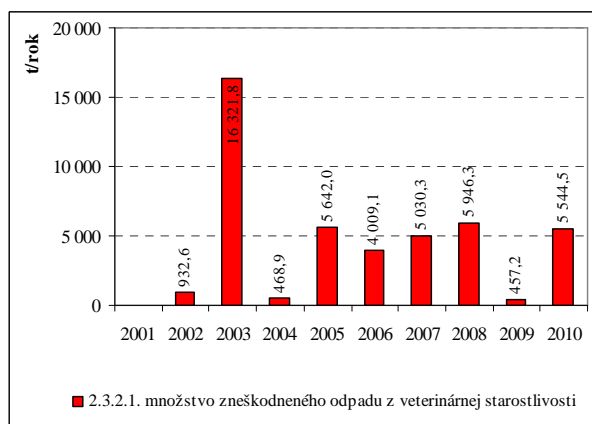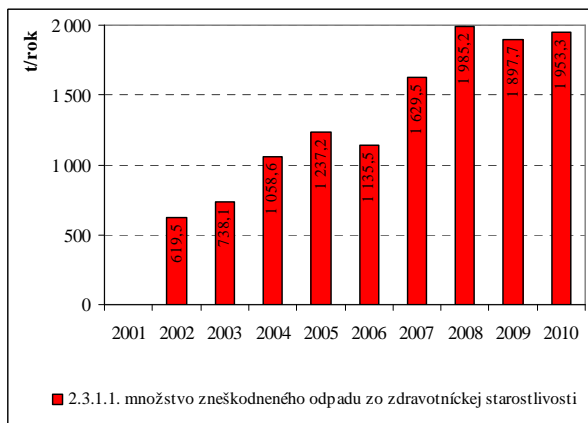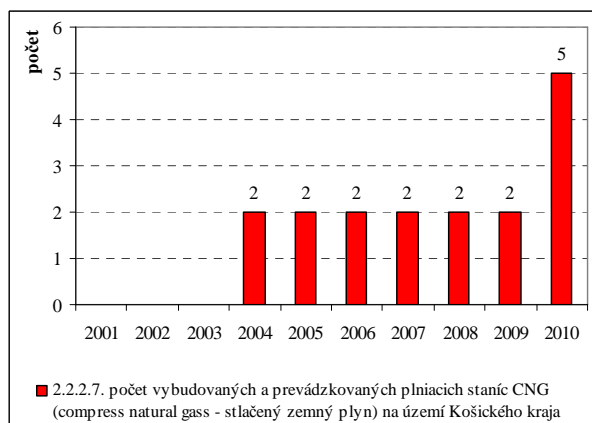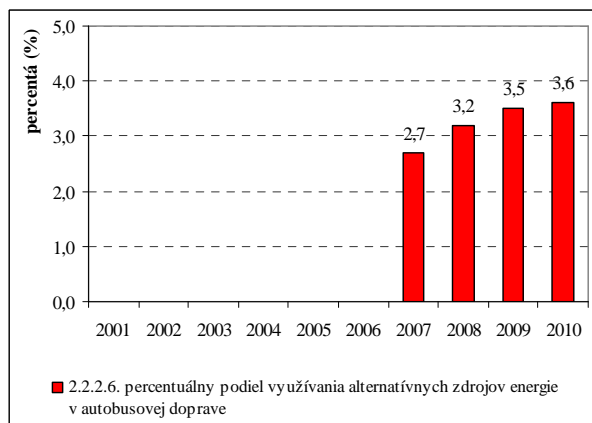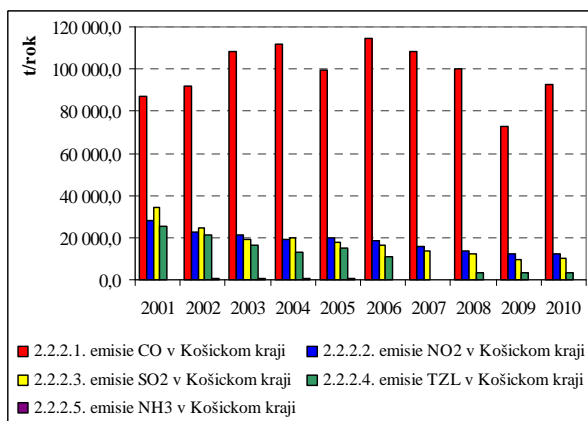
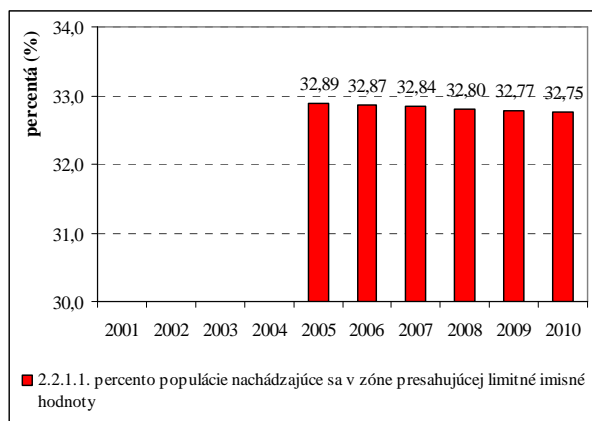


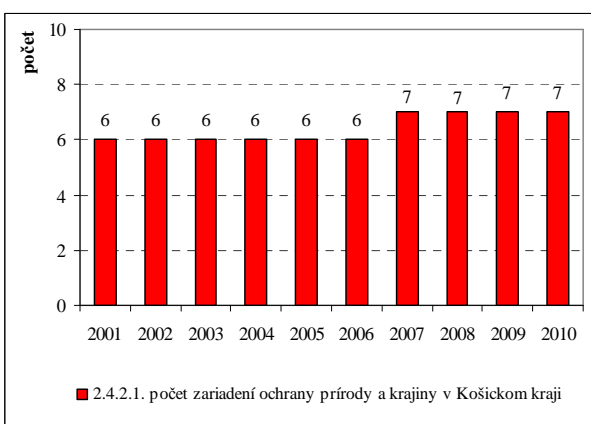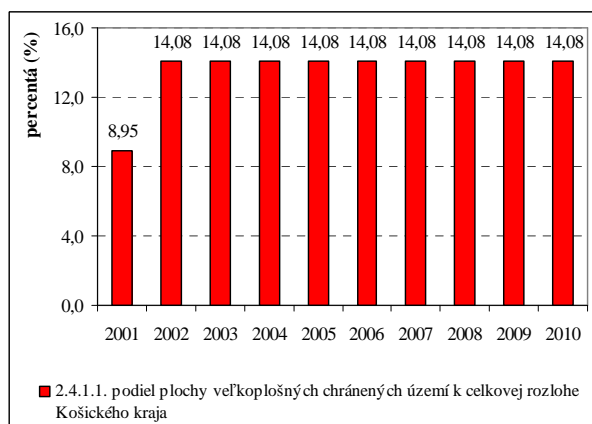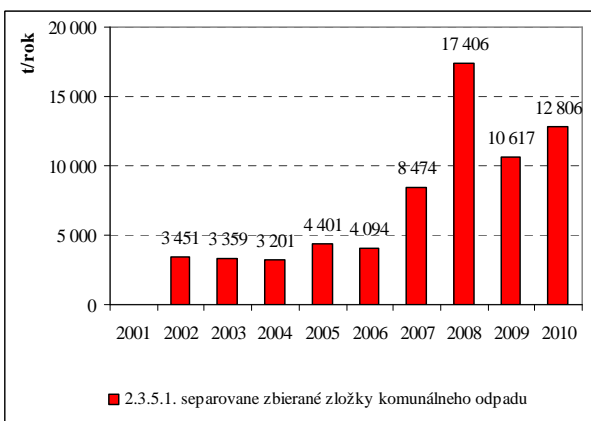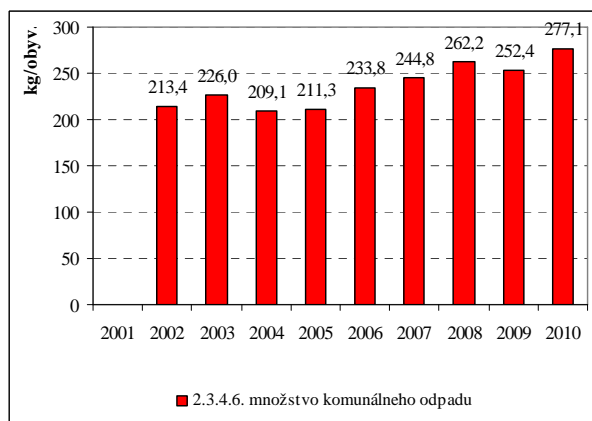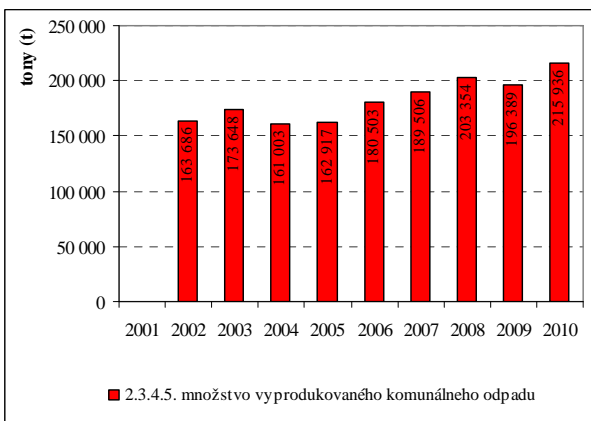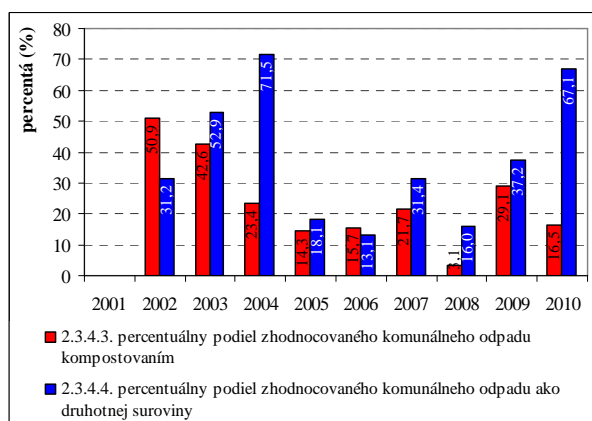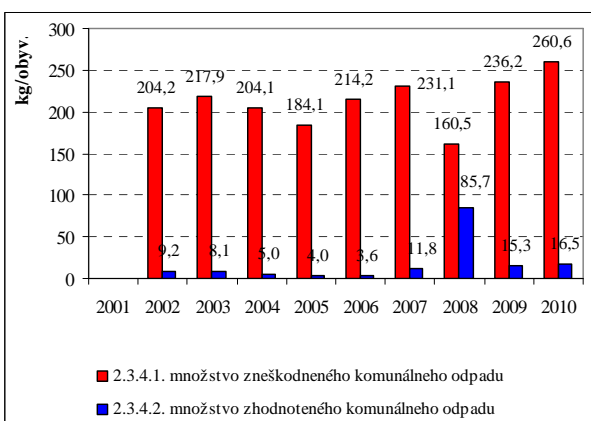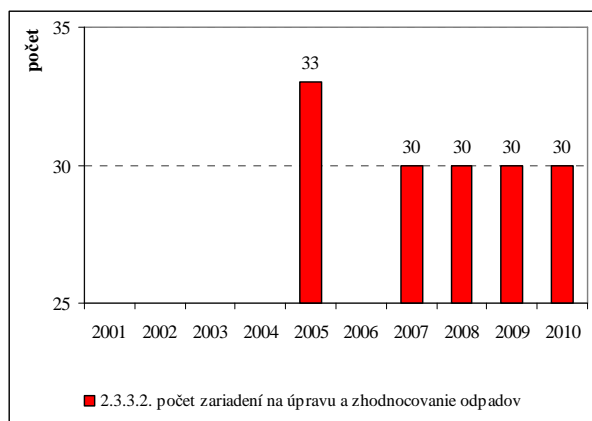







2.3. Špecifický cieľ 3. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry

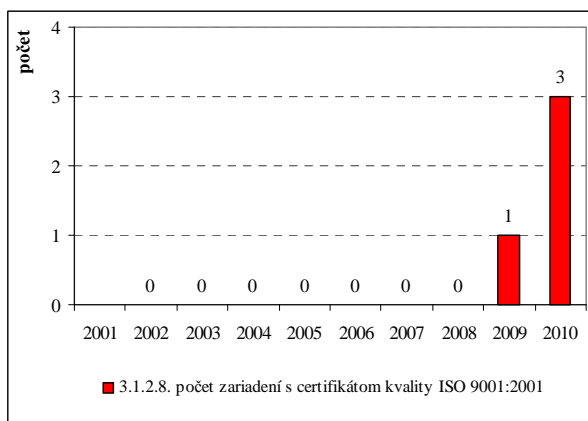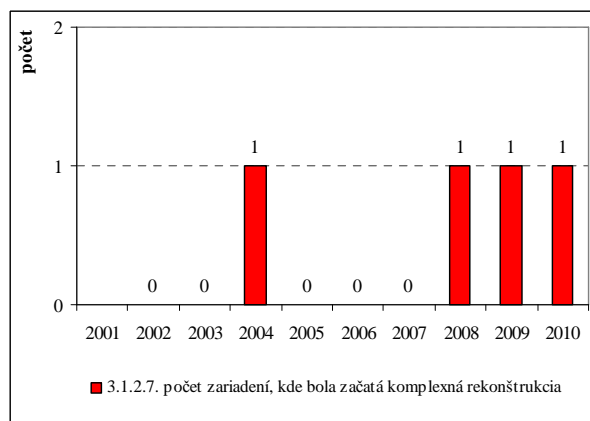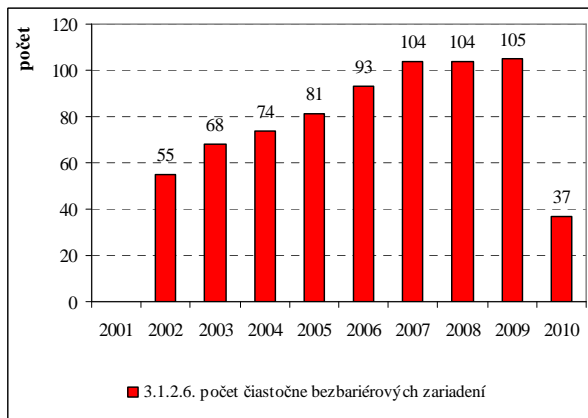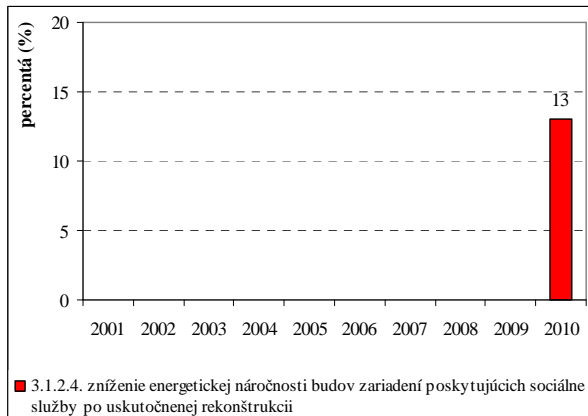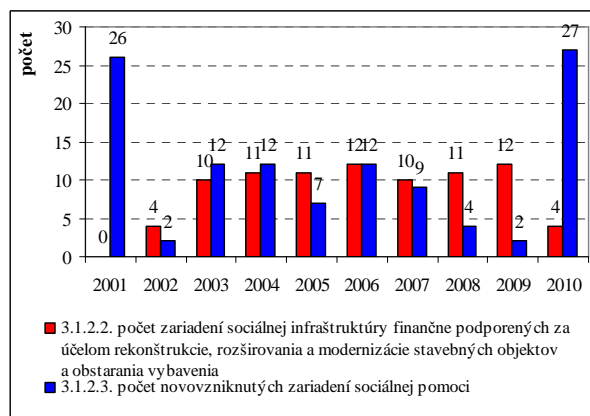
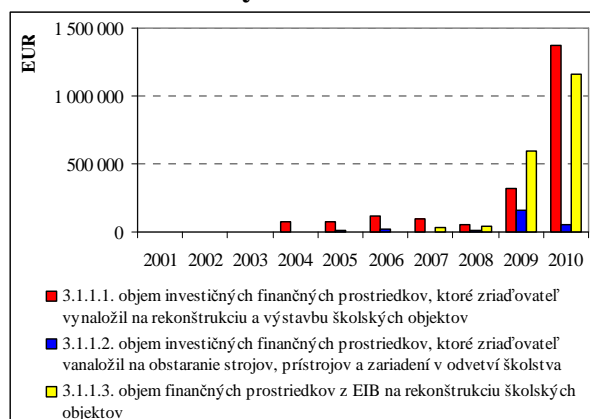


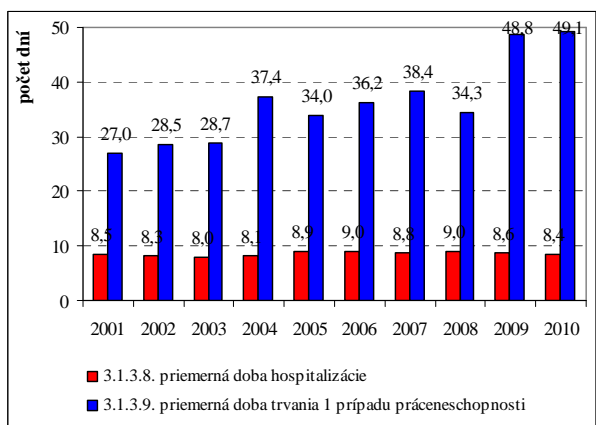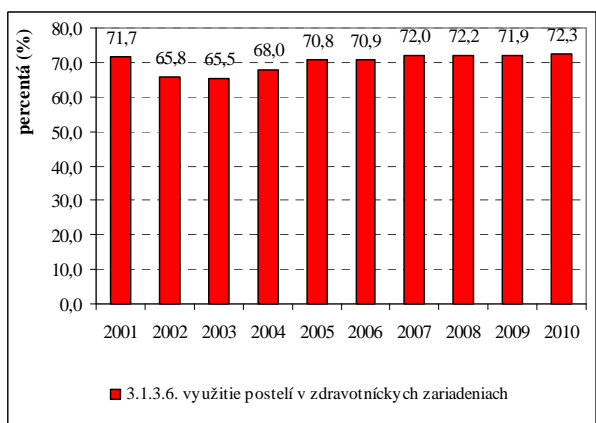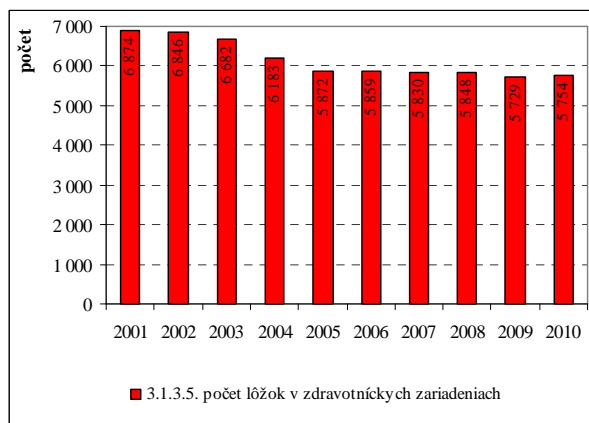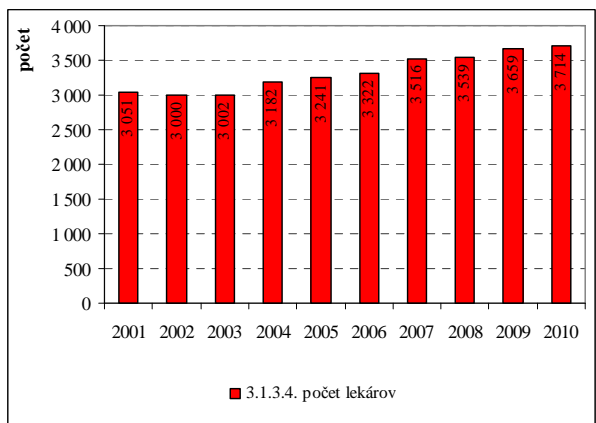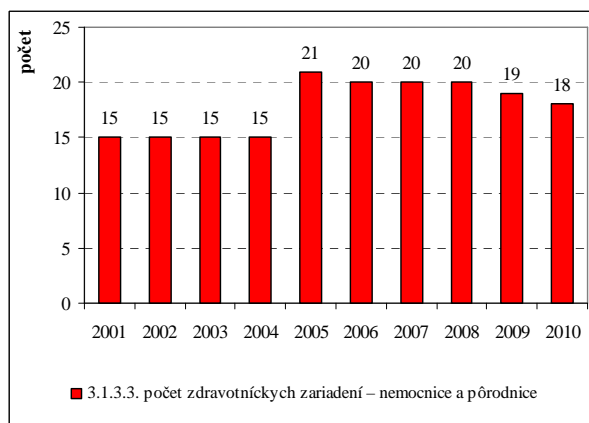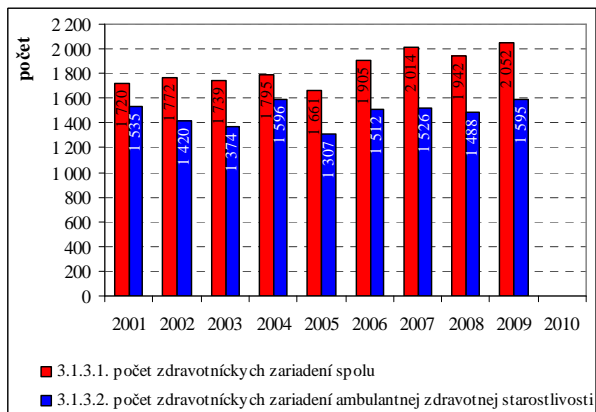





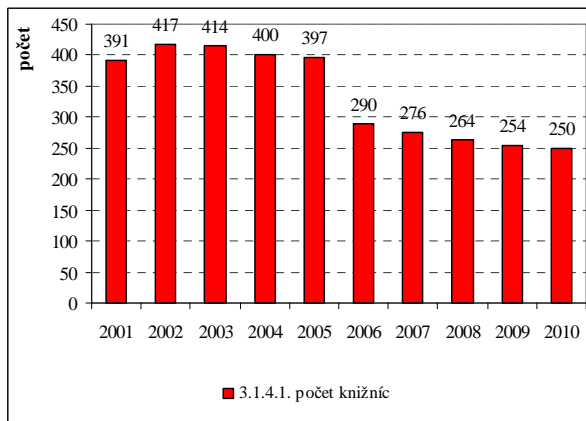











Indikátor 3.1.4.1. – od roku 2006 sa počítajú iba fungujúce knižnice

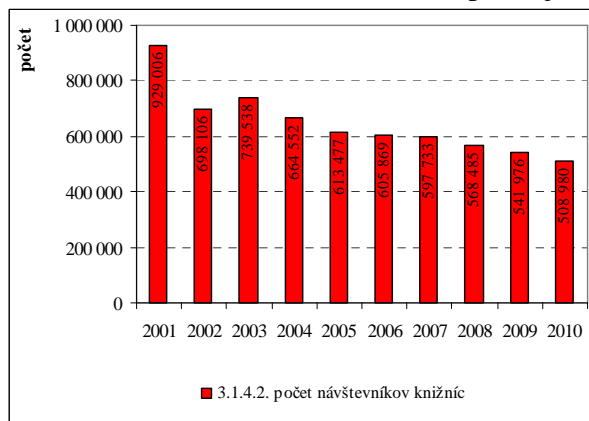




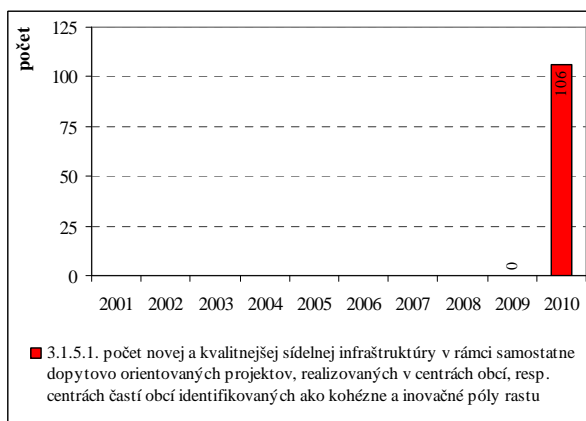



Indikátor 3.1.5.1. a 3.1.5.2. – v roku 2009 má sledovaný indikátor nulovú hodnotu, pretože v tomto roku nezasadala výberová komisia; na SORO pre ROP ÚKSK bolo prijatých 77 projektov, z ktorých do výberovej komisie postúpilo 50 v celkovej hodnote 38,225 mil. EUR


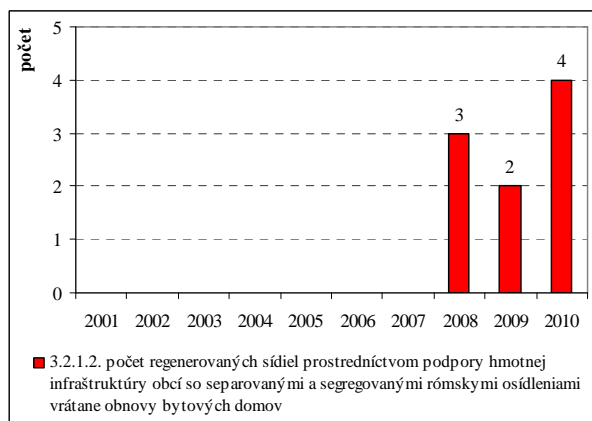
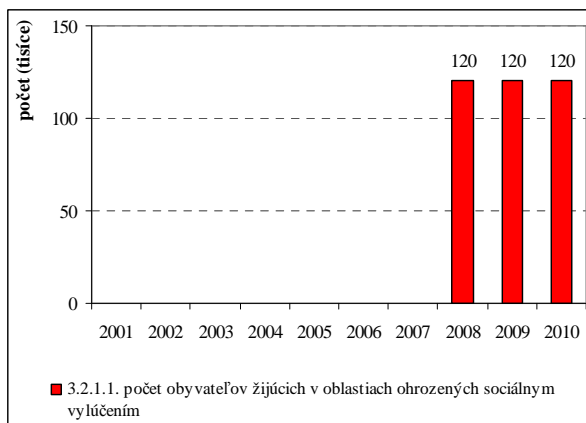
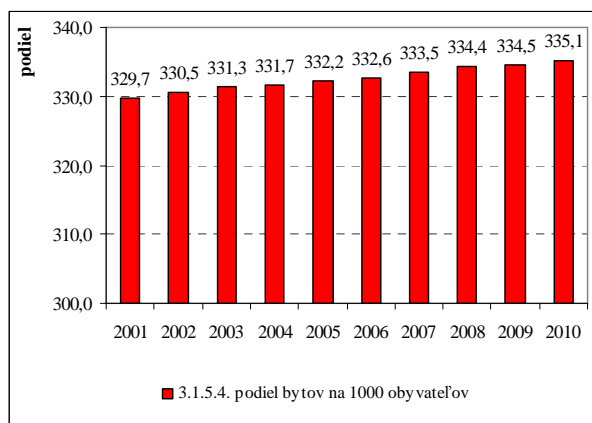
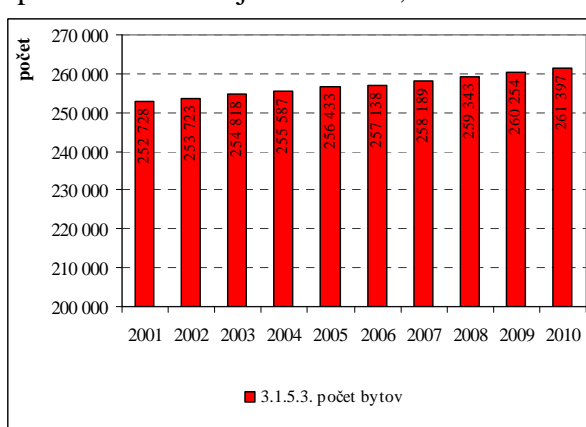
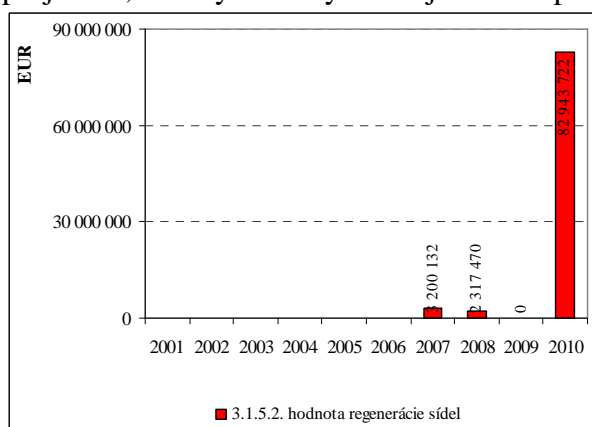


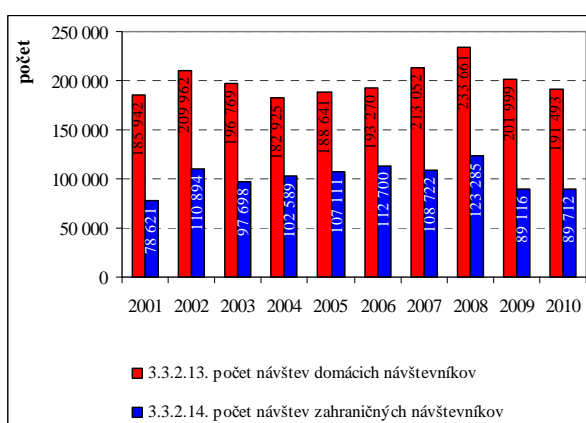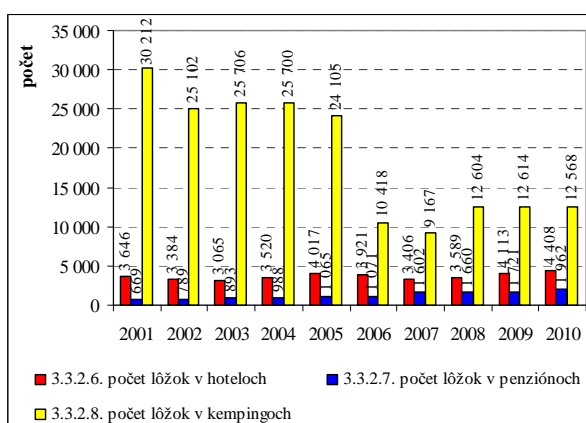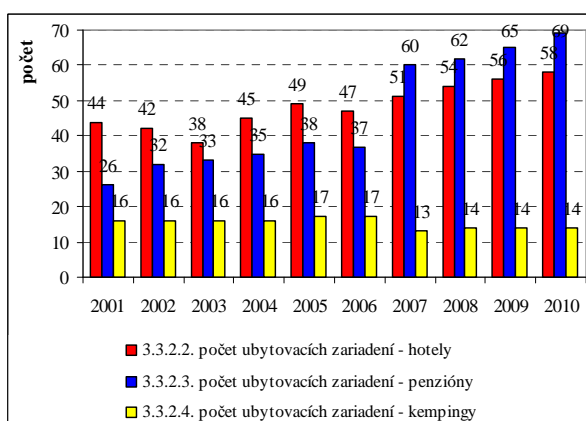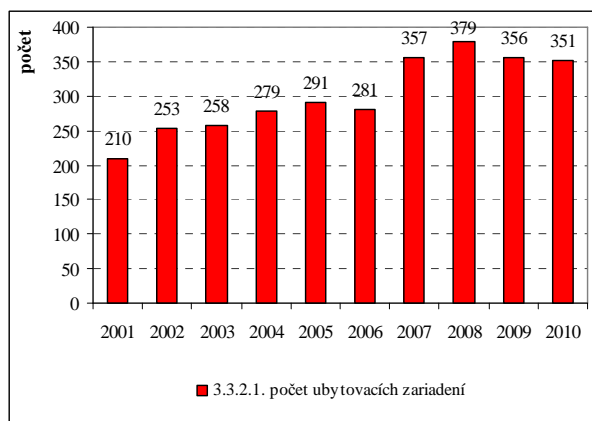



Indikátor 3.3.2.17. – tržby za vlastné výkony a tovar za ubytovacie a stravovacie služby (od roku 2008), do roku 2008 za hotely a reštaurácie








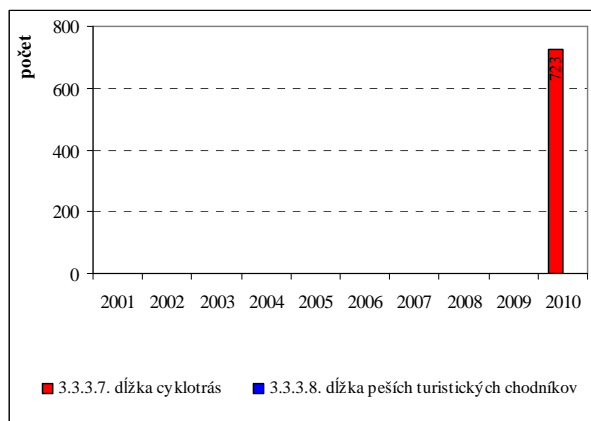






2.4. Špecifický cieľ 4. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti ľudských zdrojov

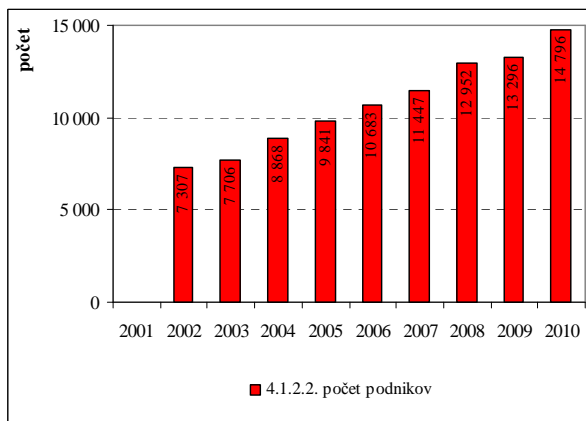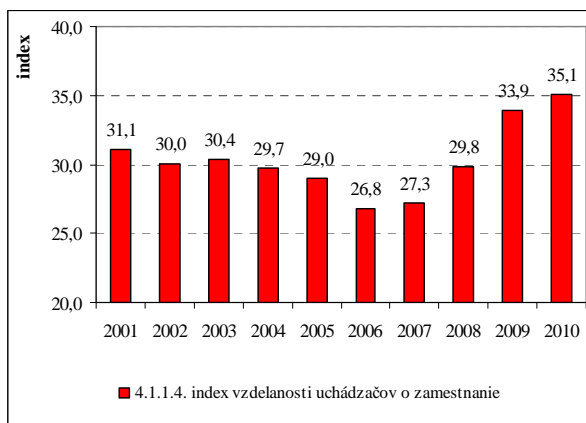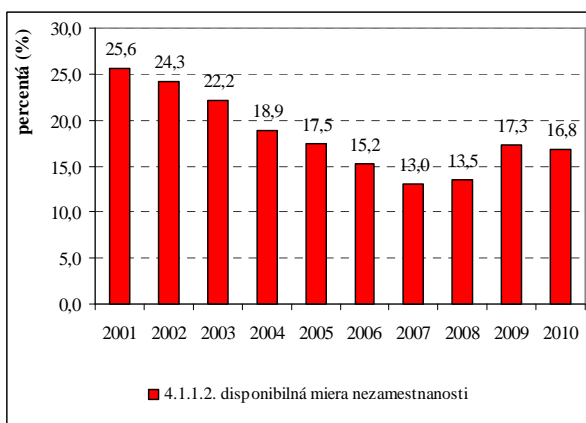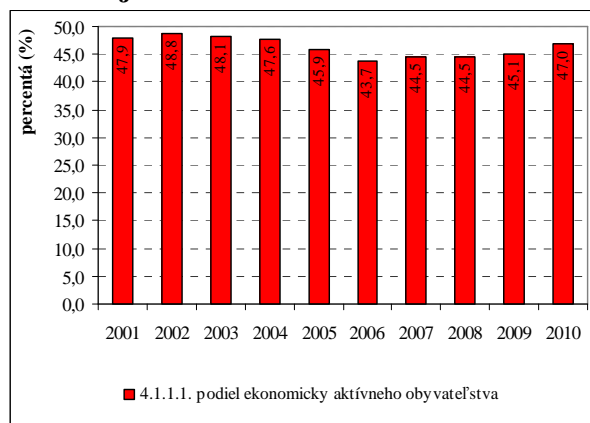

Indikátor 4.1.2.2. – chýbajú podniky s nezisteným počtom zamestnancov







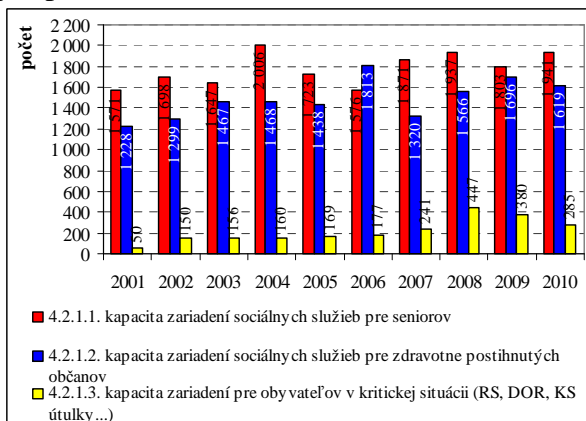
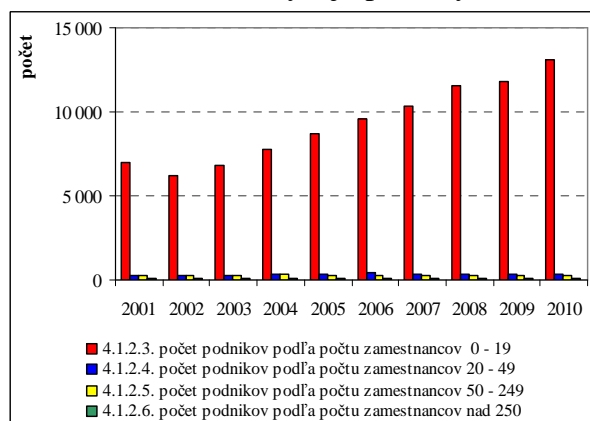


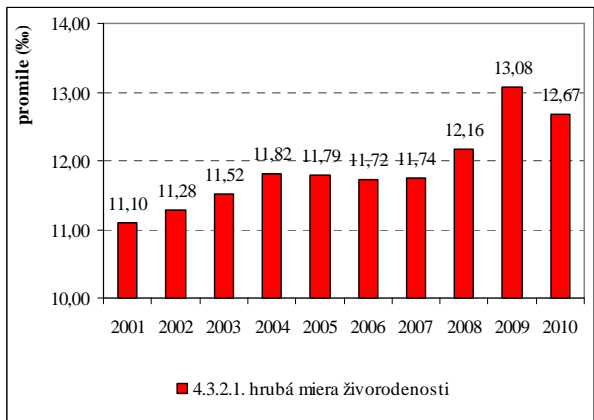




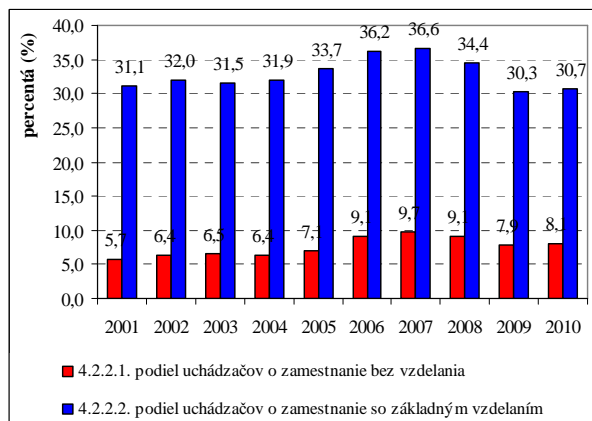

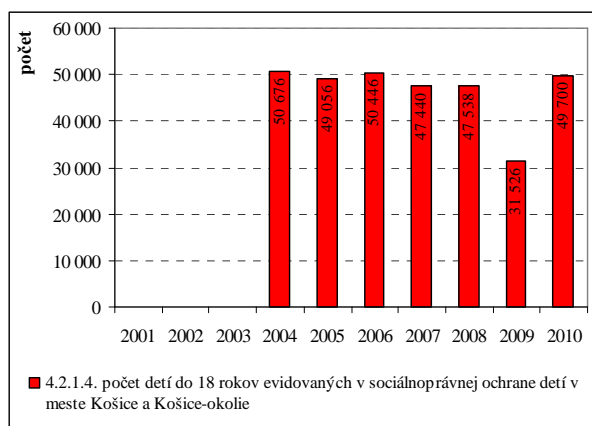




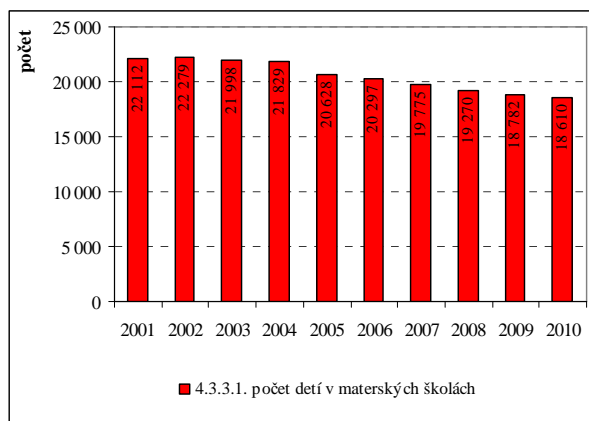


Indikátor 4.3.3.5. – údaj sa zisťuje iba pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov



2.5. Špecifický cieľ 5: zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania


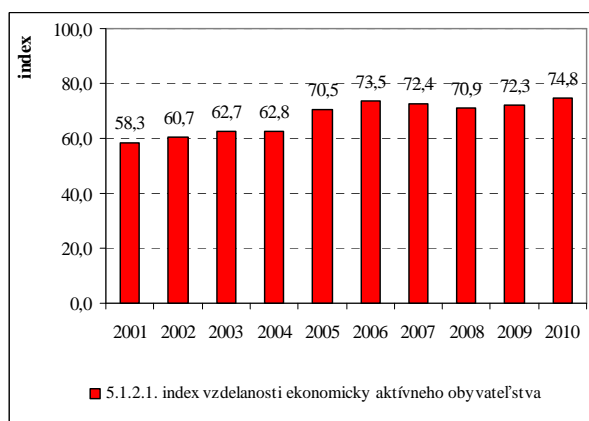


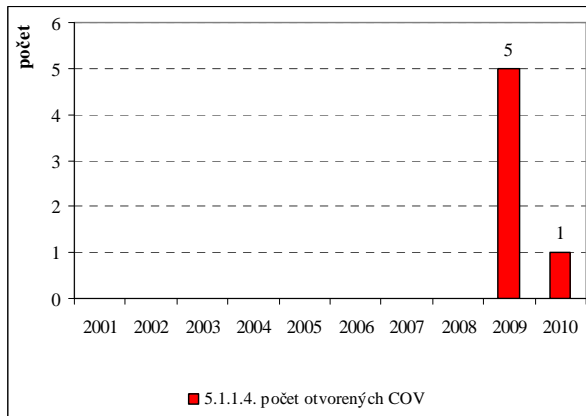
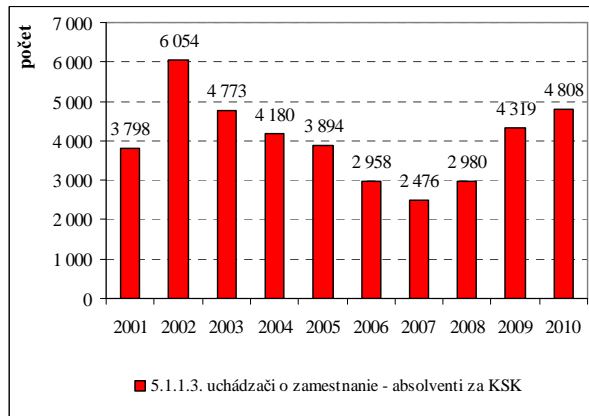
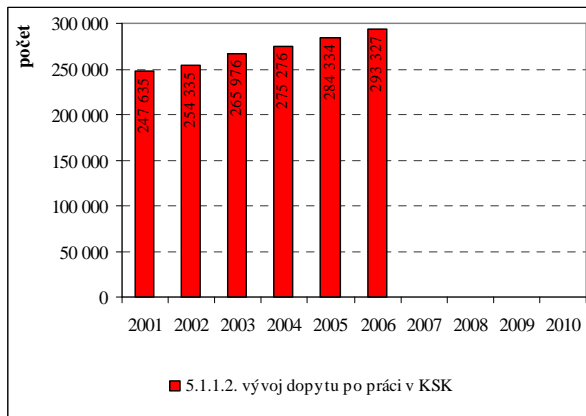
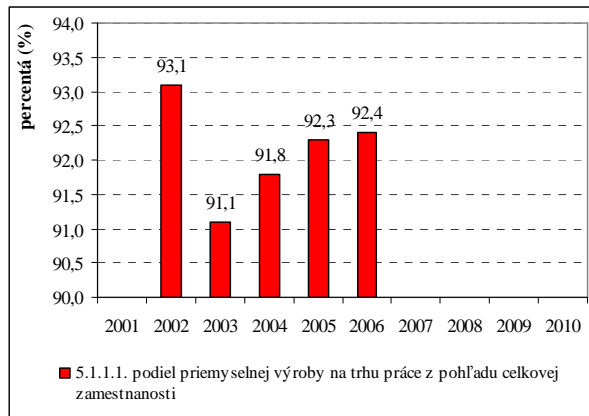


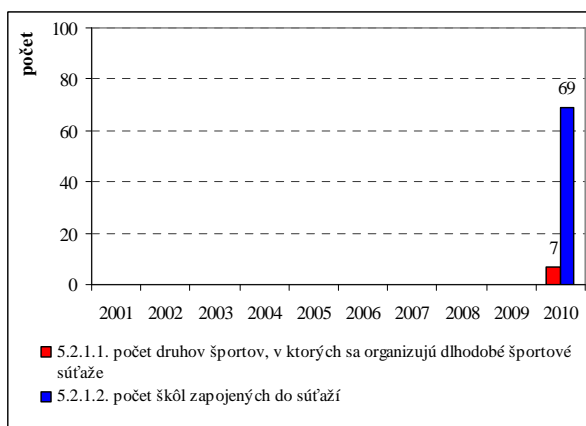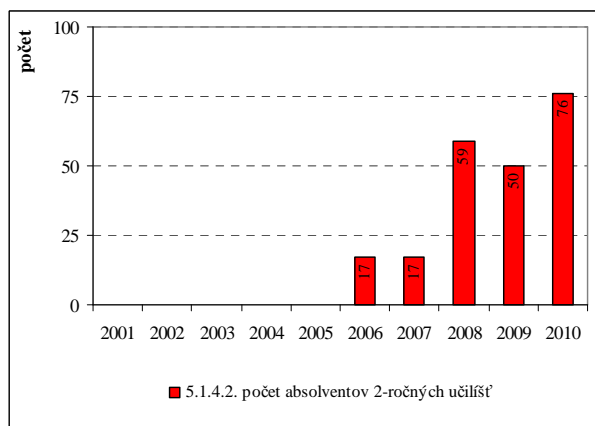
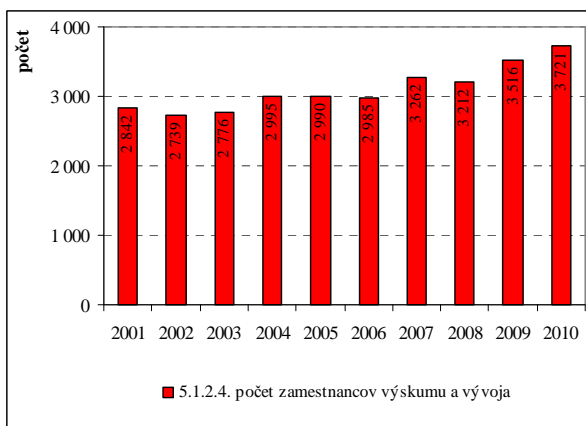



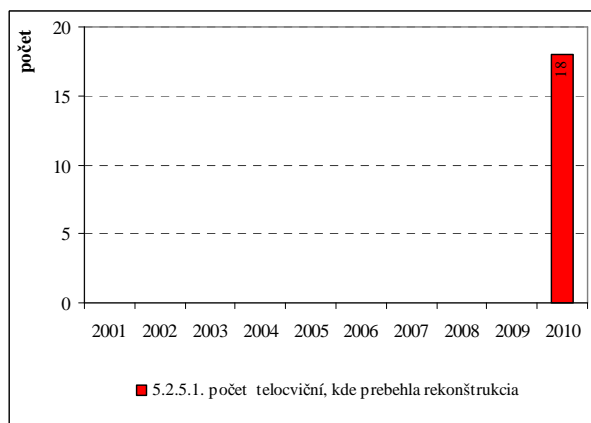



2.6. Špecifický cieľ 6: zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky







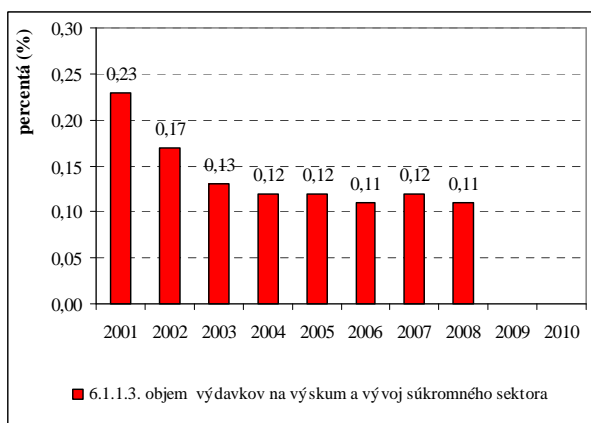



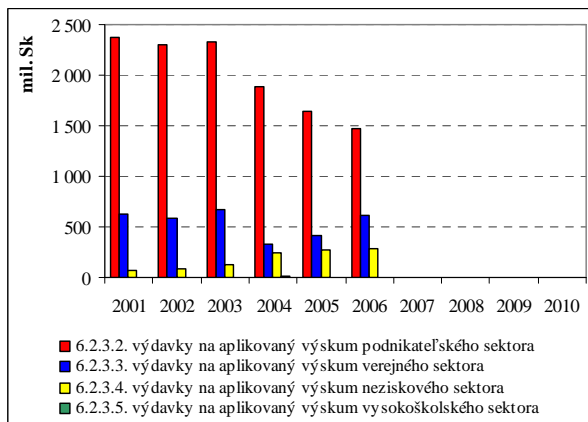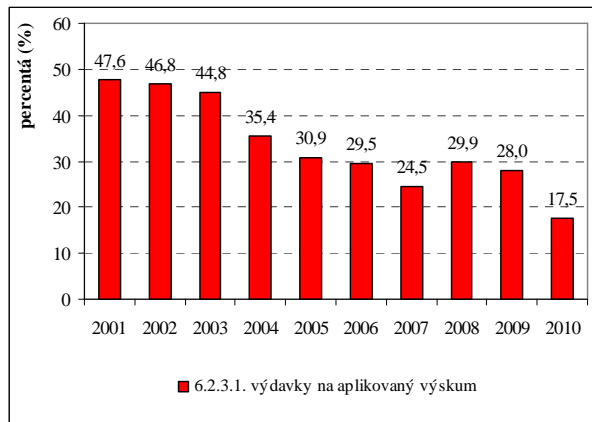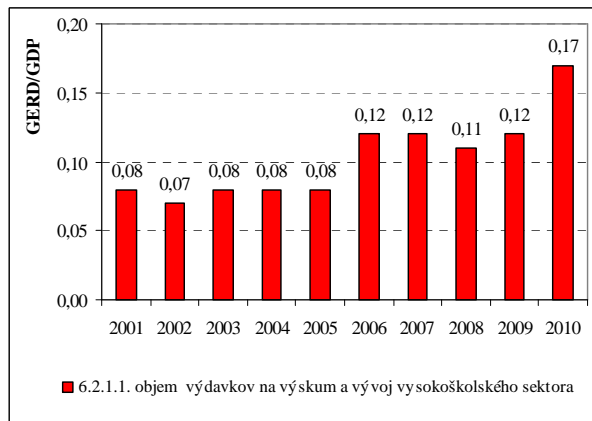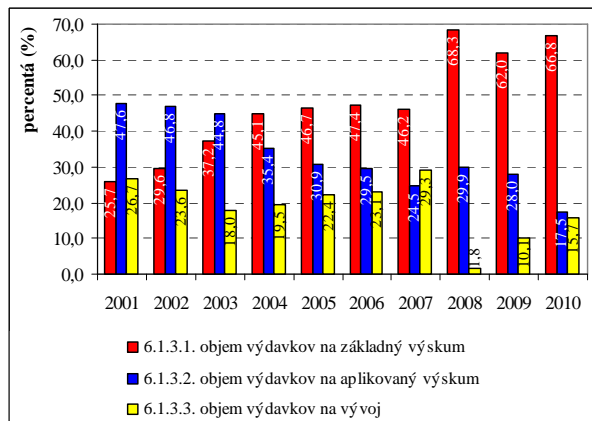



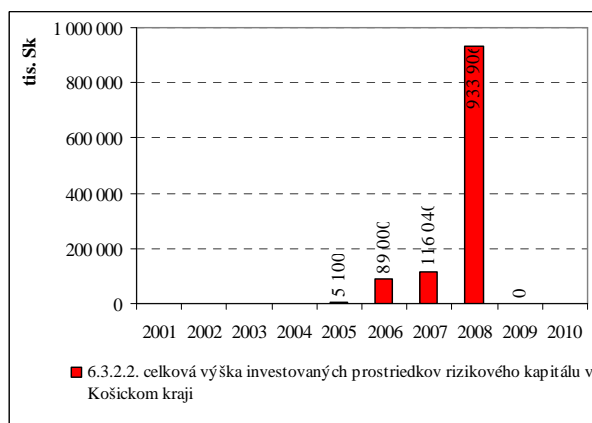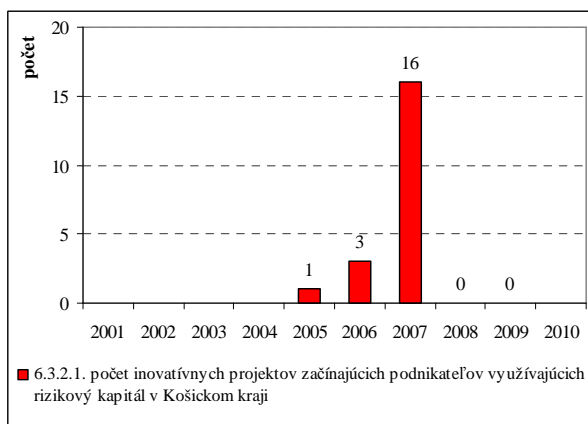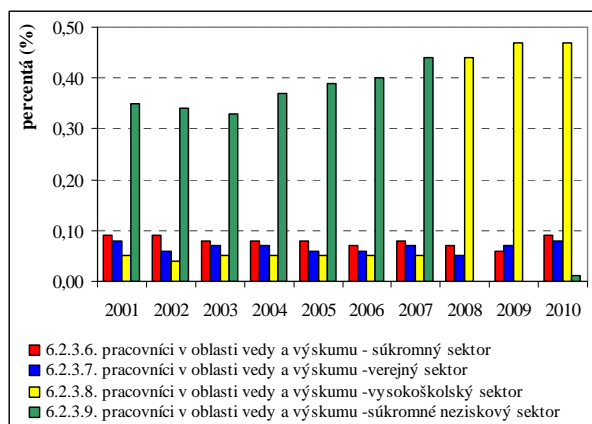







2.7. Špecifický cieľ 7: zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka







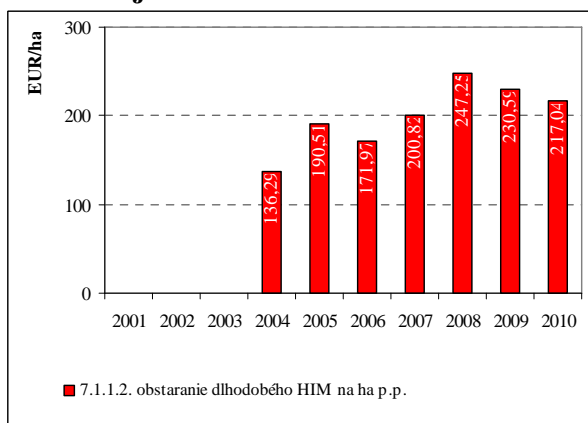
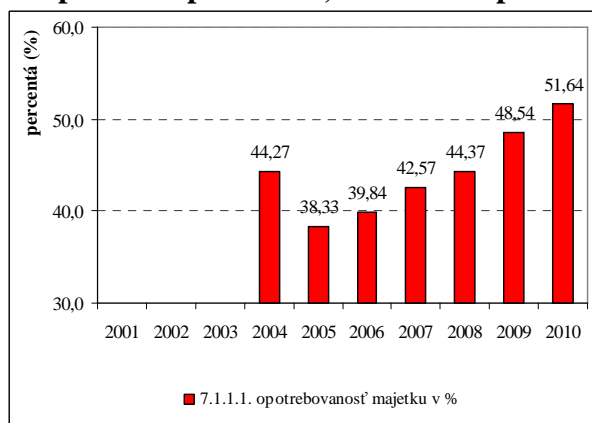


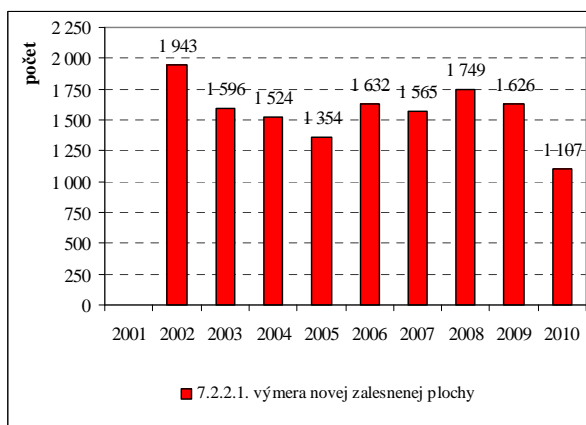

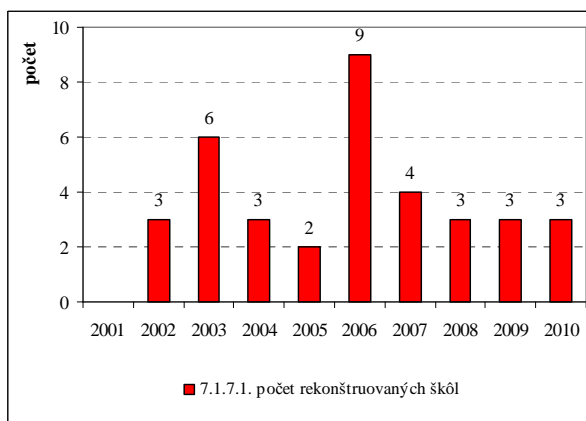
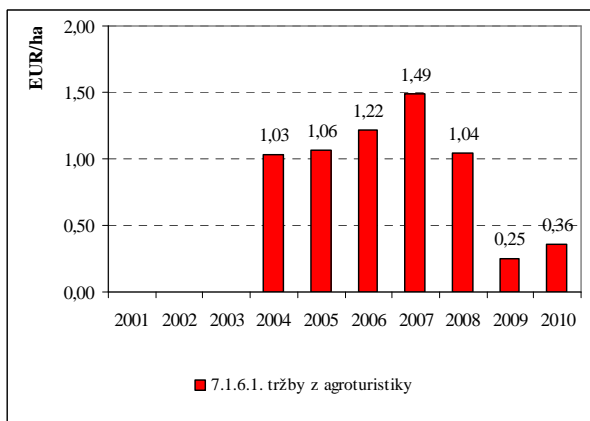
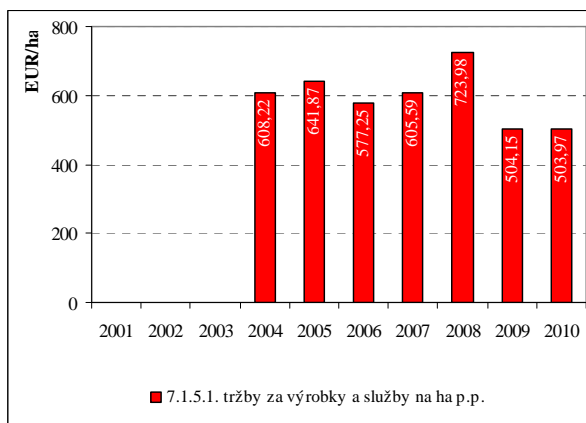
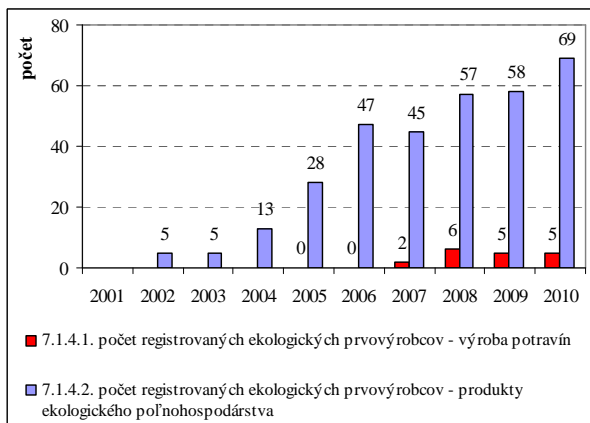
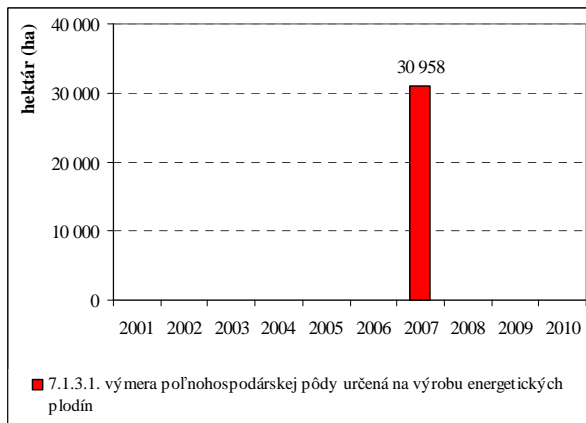
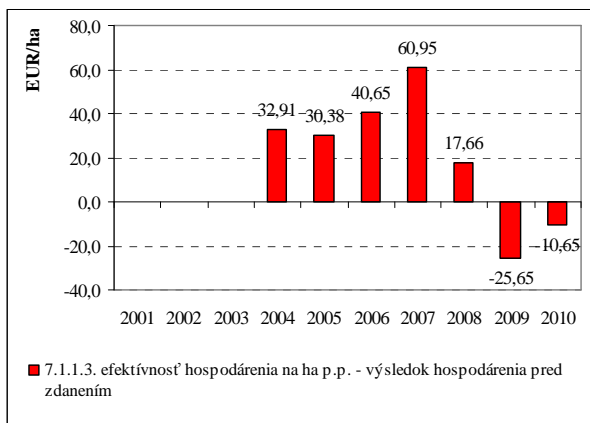








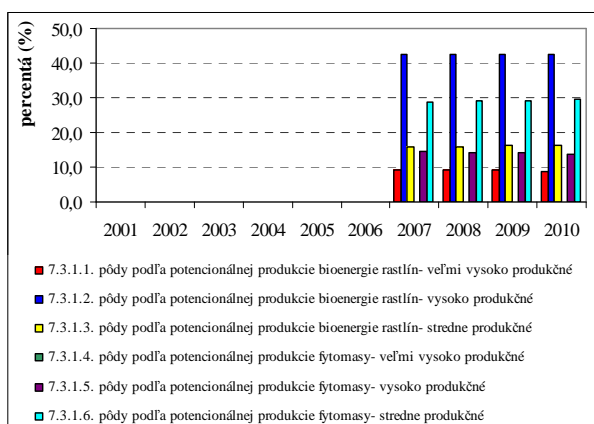
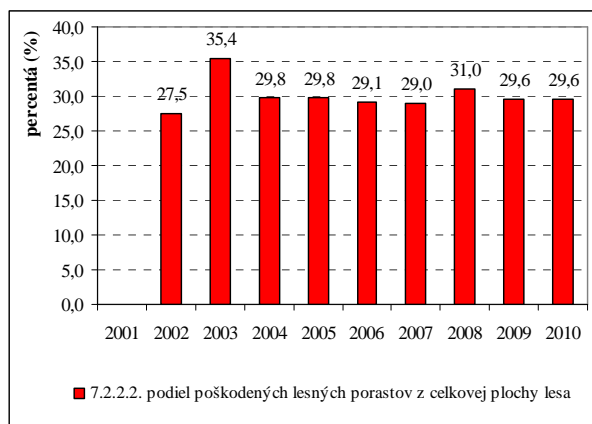







2.8. Špecifický cieľ 8: zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti kvality života

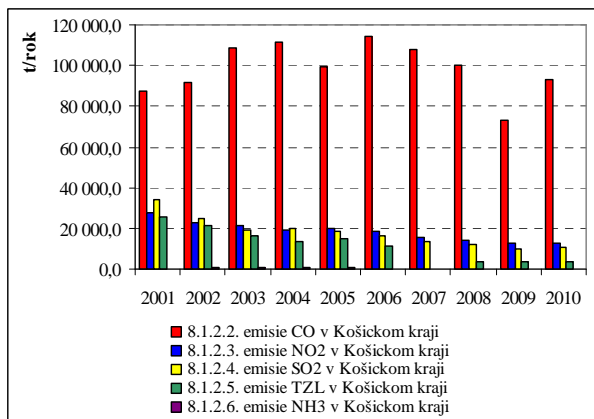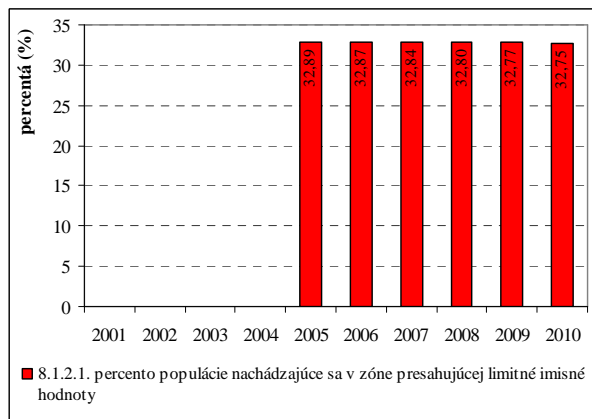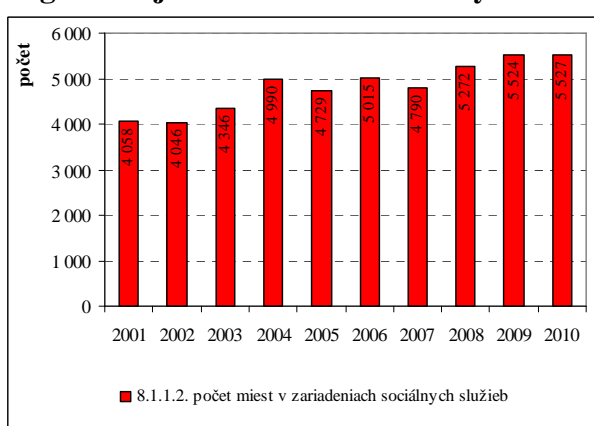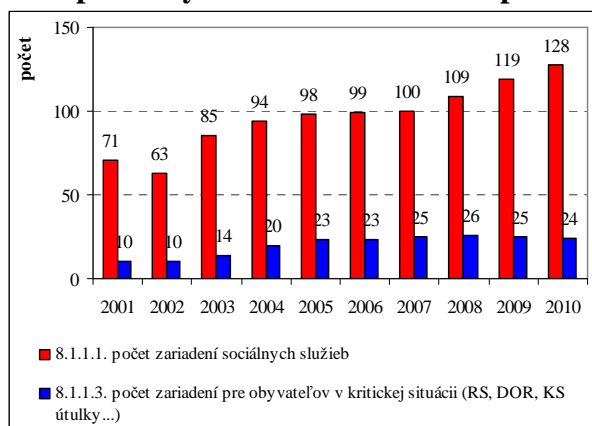

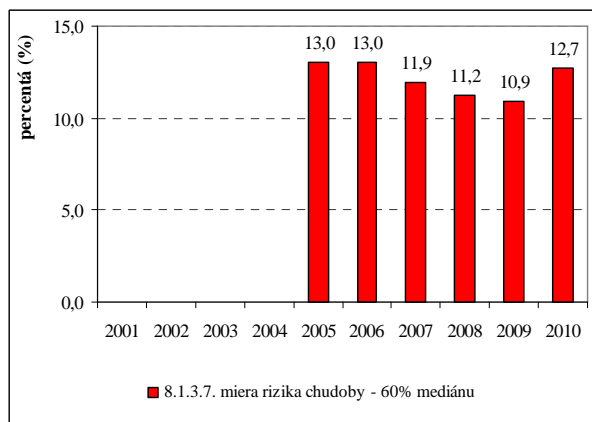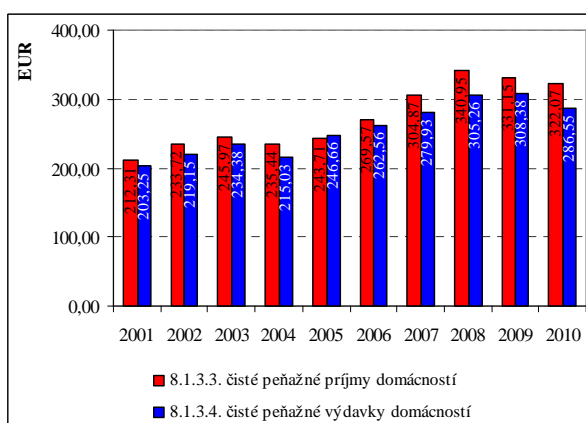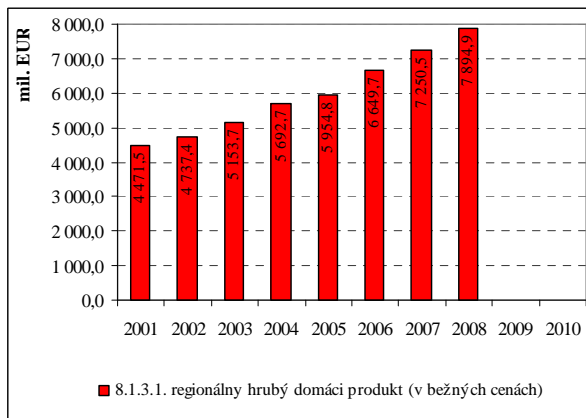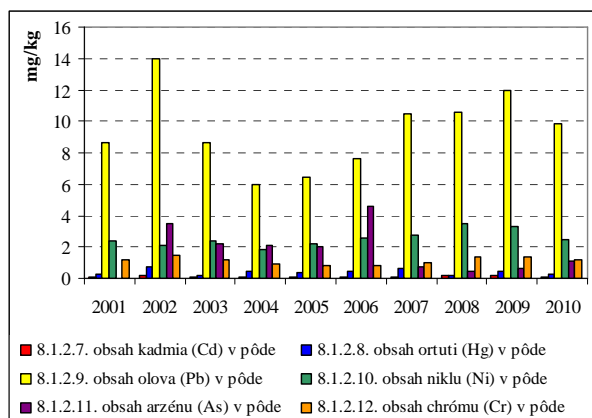

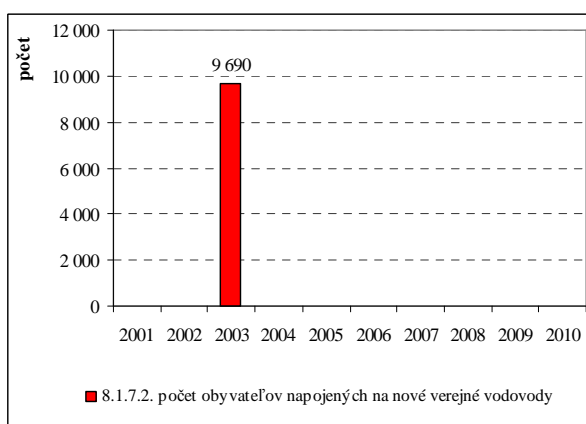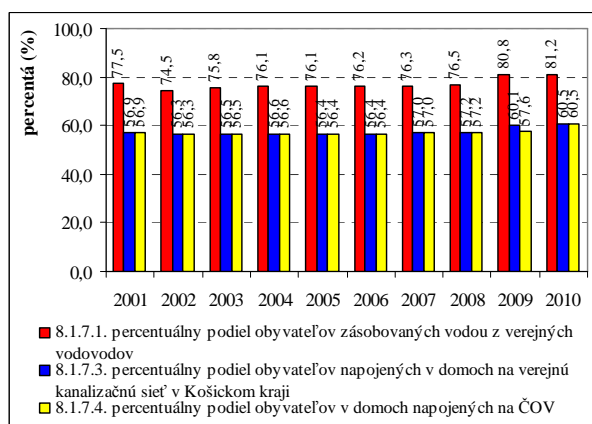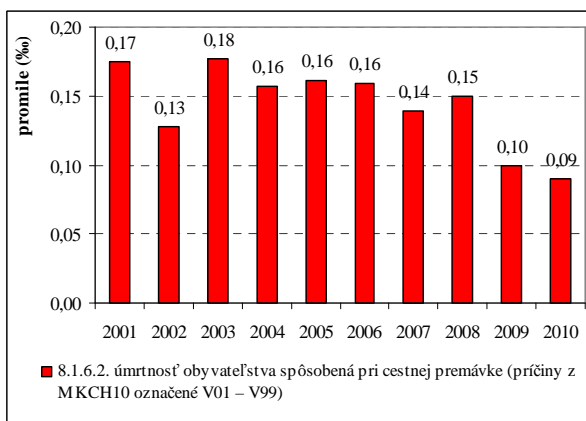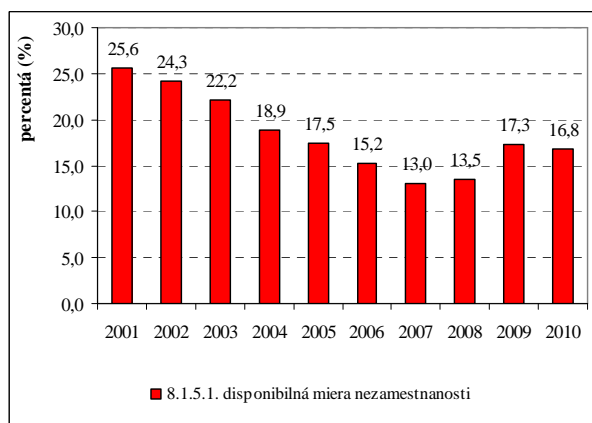



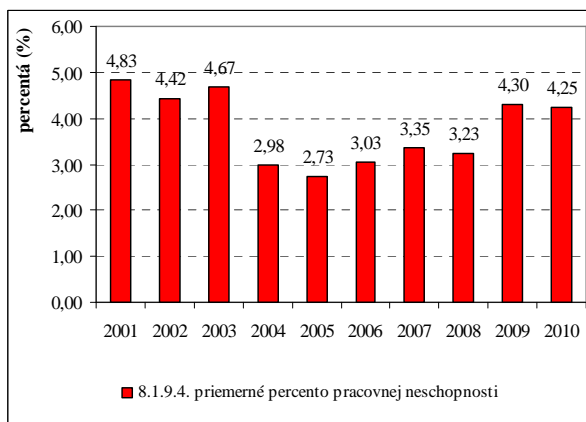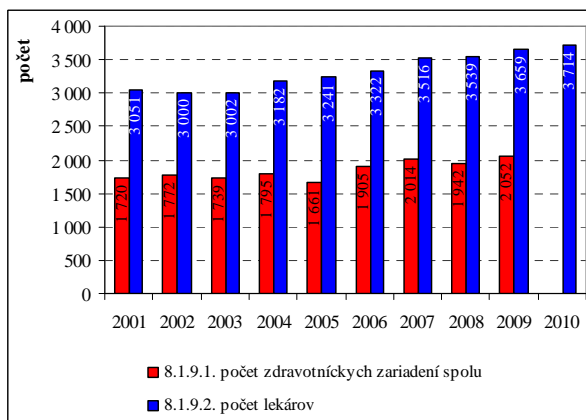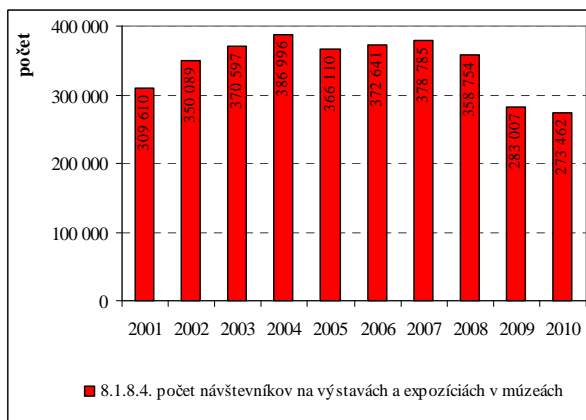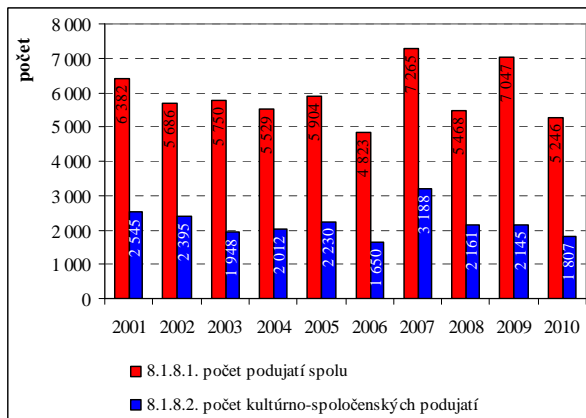

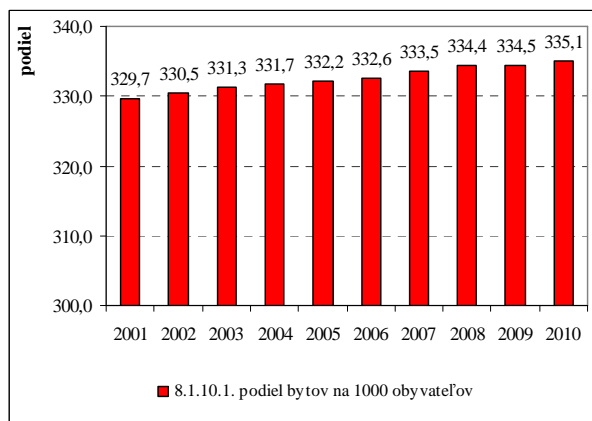




2.9. Vyhodnotenie merateľných indikátorov Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na úrovni NUTS 3 za Košický kraj za rok 2011





Prioritná oblasť č.1. veda, výskum a inovácie

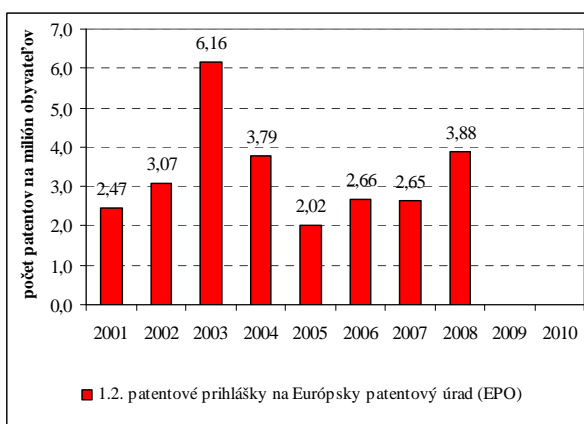




Prioritná oblasť č.2. ľudské zdroje

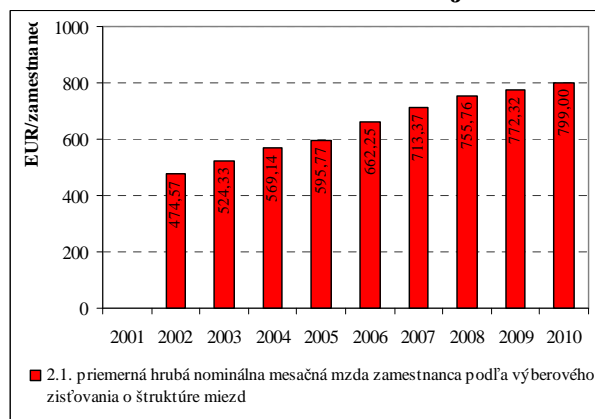





Prioritná oblasť č.3. zamestnanosť

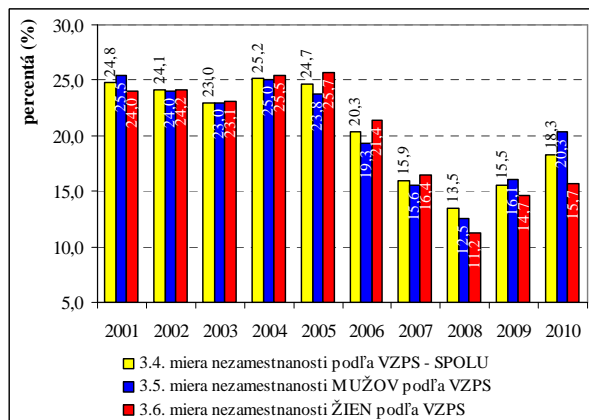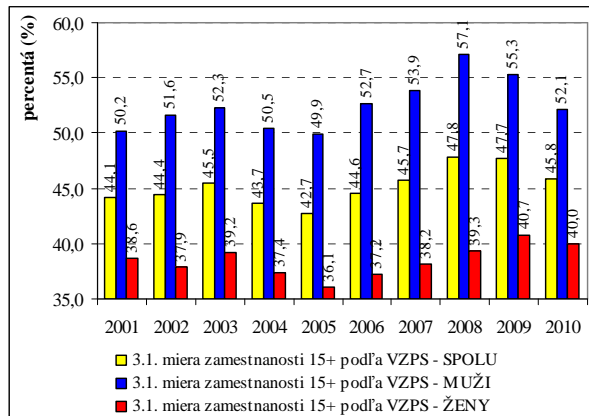

Prioritná oblasť č.4. konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie

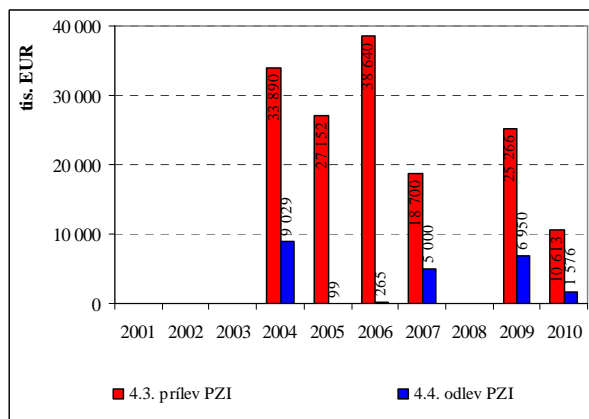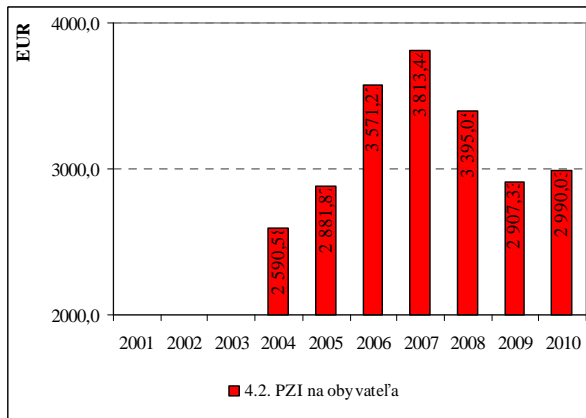
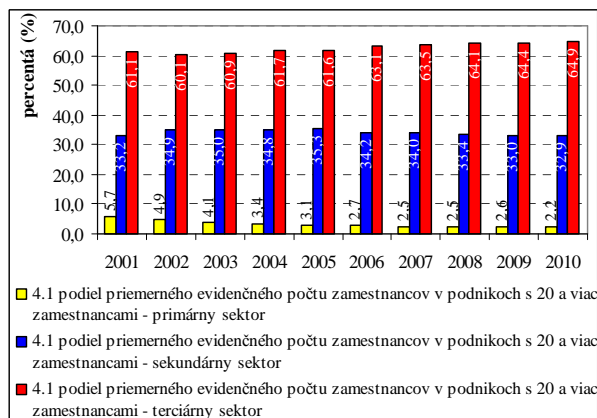


Prioritná oblasť č.5. životné prostredie, zmeny klímy a obnoviteľné zdroje energie

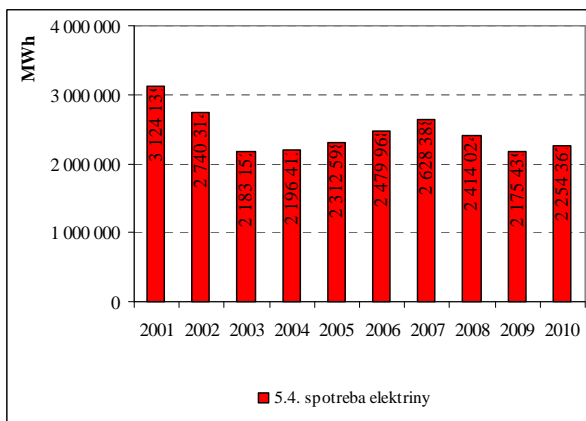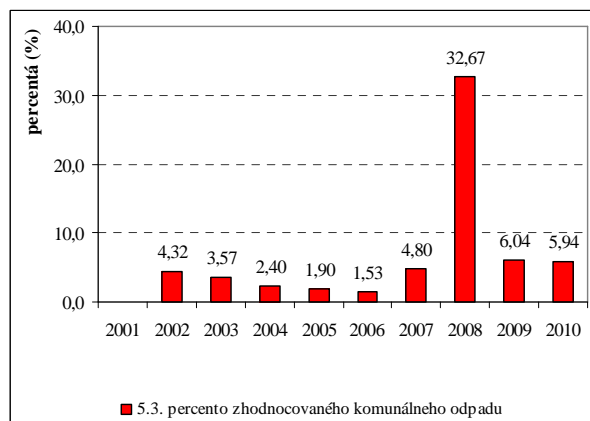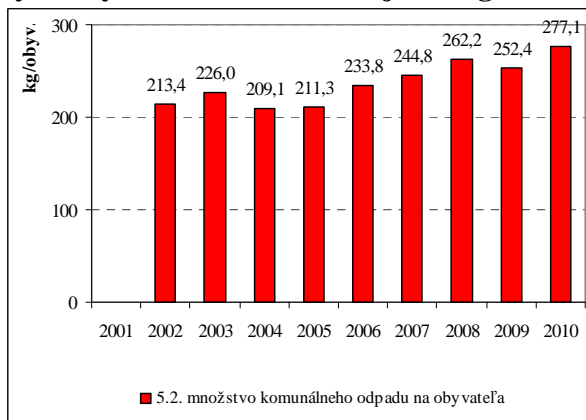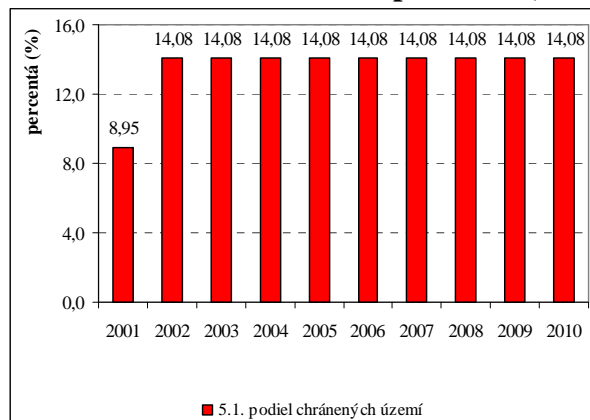

2.10. Indikátory navrhnuté na vyradenie


Špecifický cieľ 2. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia

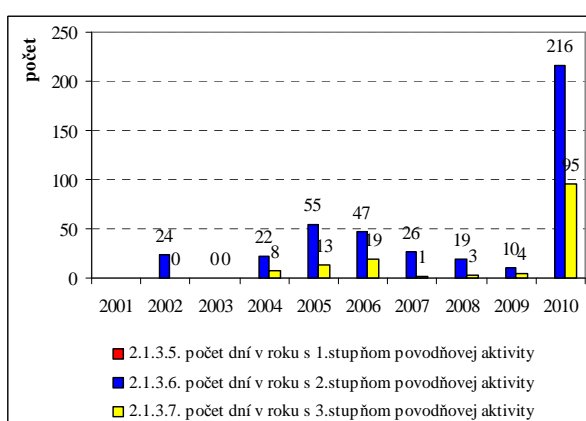

Indikátor 2.1.1.5. – údaj sa nesleduje, podiel obyvateľov napojených na VV v % je postačujúci, nemusí byť absolútna hodnota a ešte podmienená „novými“ vodovodmi


Indikátor 2.1.3.5. – počet dní v roku s 1.stupňom povodňovej aktivity – nezachytené v evidencii SVP, keď sú povodne je vyhlasovaný hneď 2. alebo hneď 3. stupeň povodňovej aktivity, po odznení povodne a vykonaní potrebných zabezpečovacích prác sa jednoducho odvoláva 2. stupeň, bez toho aby bol vyhlásený 1. stupeň PA., 1.stupeň je len formalita uvedená v zákone o povodniach a presne technicky špecifikovaná (výška hladiny toku...)

Špecifický cieľ 5: zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania

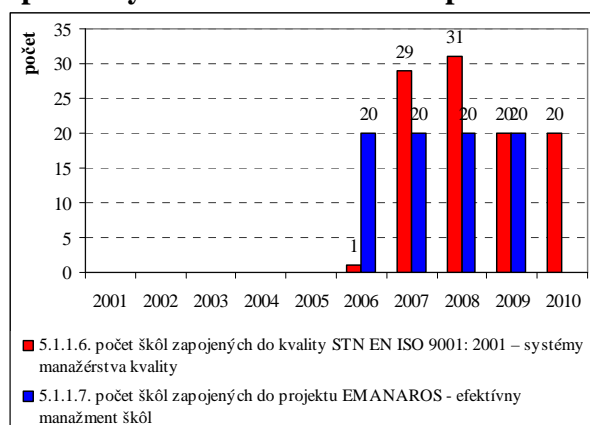


Indikátor 5.1.1.7. – projekt bol ukončený, údaje sa už nesledujú

Špecifický cieľ 6: zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky

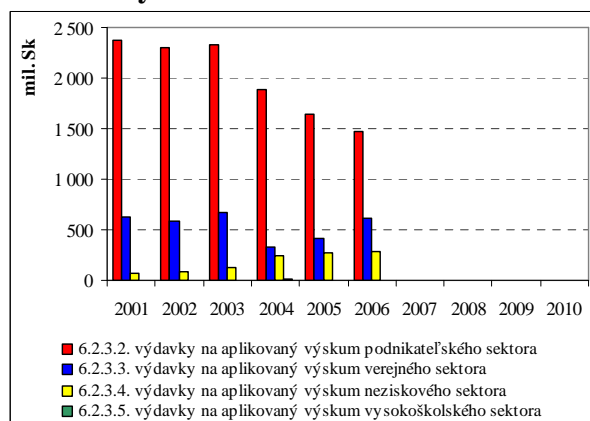

Indikátory 6.2.3.2. – 6.2.3.5. – údaje nie sú dostupné

Špecifický cieľ 8: zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti kvality života

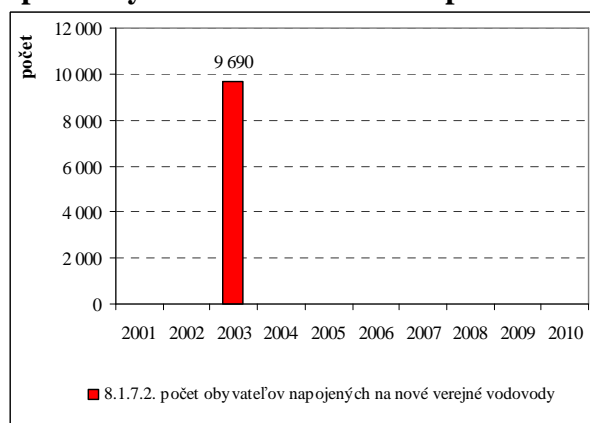

Indikátor 8.1.7.2. – zhodný s indikátorom 2.1.1.5. z oblasti ŽP, ktorý je navrhnutý na vyradenie

Duplicitné indikátory:

Indikátor 6.2.3.10. patenty, licencie (vyradiť) – údaje zhodné s indikátorom 6.1.1.4. patenty, licencie

Indikátory, ktoré vzhľadom na nedostupnosť údajov doteraz neboli naplnené:

Indikátor 2.1.2.6. – počet zrekonštruovaných ČOV v Košickom kraji – nesleduje sa, pre VVS sú to nové investičné projekty, len z názvu projektu je možné rozoznať či ide o rekonštrukciu ČOV alebo o výstavbu novej ČOV

Indikátor 2.1.2.7. – dĺžka zrekonštruovaných verejných kanalizácií – nesleduje sa

Indikátor 6.2.2.2. – počet novovybudovaných a zrekonštruovaných budov a zariadení – indikátor mal byť sledovaný, ale MŠ SR ho nevyhodnocuje
