

Finančné a organizačné zabezpečenie Európskeho olympijského festivalu mládeže – Košice 2021

Európsky olympijský festival mládeže (ďalej len „EYOF“) je športové podujatie, ktorého sa môžu zúčastniť mladí európski športovci od 14 do 18 rokov. Koná sa každý nepárny rok a delí sa na letnú a zimnú časť.

Zakladateľom a priekopníkom EYOF sa začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia stal vtedajší prezident Medzinárodného olympijského výboru Jacques Rogge. Prvý ročník letného festivalu sa konal v roku 1991 v belgickom Bruseli. Zimná časť mala svoju premiéru o dva roky neskôr v talianskej Aoste. Vtedy sa podujatie označovalo ešte pôvodným názvom EYOD (*European Youth Olympic Days*).

Doteraz sa uskutočnilo 14 ročníkov tohto významného celoeurópskeho športového podujatia pre mládež. V krátkom prehľade uvádzame počty zúčastnených národných olympijských (ďalej len „NOV“), účastníkov a športy, v ktorých sa na jednotlivých podujatiach súťažilo:

| Rok | Miesto a krajina | NOV | Účastníci | Športy |
|------|--------------------------------|-----|-----------|--------|
| 1991 | Brusel - Belgicko | 33 | 2 084 | 10 |
| 1993 | Valkenwaard - Holandsko | 43 | 1 874 | 9 |
| 1995 | Bath - Veľká Británia | 47 | 1 709 | 9 |
| 1997 | Lisabon - Portugalsko | 47 | 2 500 | 10 |
| 1999 | Esbjerg - Dánsko | 48 | 2 324 | 11 |
| 2001 | Murcia - Španielsko | 48 | 2 000 | 10 |
| 2003 | Paríž - Francúzsko | 48 | 2 500 | 9 |
| 2005 | Lignano Sabbiadoro - Taliansko | 48 | 2 965 | 11 |
| 2007 | Belehrad - Srbsko | 48 | 3 000 | 11 |
| 2009 | Tampere - Fínsko | 49 | 3 303 | 9 |
| 2011 | Trabzon - Turecko | 49 | 3 092 | 9 |
| 2013 | Utrecht - Holandsko | 49 | 3 320 | 9 |
| 2015 | Tbilisi – Gruzínsko | 50 | 3 318 | 9 |
| 2017 | Győr - Maďarsko | 50 | 3 675 | 10 |
| 2019 | Baku - Azerbajdžan | 50 | 3 500 | 10 |
| 2021 | Košice - Slovensko | 50 | 3 500 | 10 |
| 2023 | Koper - Slovinsko | 50 | 3 500 | 10 |

Mesto Košice a EYOF 2021

Kandidatúra Košíc na usporiadanie EYOF 2021 bola úspešná a zmluva s hostiteľským mestom Košice bola podpísaná dňa 21. júna 2016 v Minsku medzi Európskym olympijským výborom, Slovenským olympijským výborom a mestom Košice. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť skutočnosť, že v rámci projektu Európskej komisie sa v roku 2016 stali najlepším Európskym mestom športu, keď triumfovali v konkurencii 19 európskych miest, ktoré boli v uvedenom roku nositeľom titulu Európske mesto športu.

O význame tohto európskeho športového podujatia svedčí aj to, že v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 sa konštatuje, že „EYOF Košice 2021 patrí medzi prioritné podujatia podporované vládou Slovenskej republiky“.

Dňa 23. mája 2016 bolo podpísané prezidentom Slovenského olympijského výboru (ďalej len „SOV“), primátorom mesta Košice, predsedom Košického samosprávneho kraja, predsedníčkou predstavenstva Košice Turizmus a rektorom Technickej univerzity v Košiciach „Memorandum o podpore podujatia EYOF Košice 2021“. Následne bolo podpísané spomínané memorandum aj medzi Košice, SOV a športovými zväzmi desiatich športov, v ktorých sa uskutočnia súťaže.

Od počiatku kandidatúry na podujatie, ako aj neskoršie založenie neziskovej organizácie EYOF KOŠICE 2021 a členov organizačného výboru za mesto schválilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach.

Základné informácie o podujatí

EYOF je multišportovým olympijským podujatím európskeho charakteru pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov. V Košiciach sa uskutoční už 16. edícia letnej verzie EYOF. Doteraz sa na Slovensku takéto podujatie uskutočnilo len raz, išlo však o zimnú verziu podujatia EYOF v roku 1999 v Poprade - Tatrách, vtedy ešte pod skratkou EYOD.

Na podujatí v Košiciach sa predpokladá účasť 3 700 športovcov z 50 štátov, 460 rozhodcov, 2 000 dobrovoľníkov, 200 pracovníkov médií, 150 pracovníkov bezpečnostných služieb, 240 VIP hostí, čo predstavuje celkom viac ako 6 000 zúčastnených osôb.

Súťažiť sa bude v 10-ich olympijských športoch, a to v 3 kolektívnych (basketbal, hádzaná a volejbal) a v 7-ich individuálnych športoch (atletika, cyklistika, gymnastika, judo, plávanie, tenis a triatlon). Všetky súťaže budú prebiehať na úrovni majstrovstiev Európy juniorov. Reprezentanti Slovenska budú súťažiť vo všetkých športoch, ktoré sú zaradené do oficiálneho programu EYOF 2021.

Športovci a ich doprovod bude bývať spoločne v športovej dedine, športové disciplíny sú rovnaké ako na olympijských hrách, vrátane otváracieho ceremoniálu s kultúrnym programom a s účasťou športových osobností svetového a európskeho olympijského hnutia.

Pôvodný rozpočet mesto Košice 2017

| | |
|--|-------------------|
| Náklady na vybavenie (investície, rekonštrukcia) | 12 450 000 |
| Náklady spojené s organizáciou podujatia | 13 000 000 |
| VÝDAVKY SPOLU | 25 450 000 |

Zdroje financovania

| | |
|--|-------------------|
| Účastnícky poplatok (90 EUR / deň / účastník) | 2 835 000 |
| Mesto Košice | 8 650 000 |
| Úrad vlády SR, ministerstvo ŠVVaŠ - štátne dotácie | 12 000 000 |
| Zdroje Európskej komisie | 500 000 |
| Sponzori | 1 465 000 |
| PRÍJMY SPOLU | 25 450 000 |

Výdavky na organizáciu EYOF

| | |
|--|-------------------|
| Náklady na ubytovanie | 1 500 000 |
| Náklady na stravu a občerstvenie | 2 600 000 |
| Náklady za dopravu, prepravné služby a logistiku | 800 000 |
| Výdaje na činnosť organizačného výboru (OV) | 2 000 000 |
| Náklady na organizáciu podujatí | 800 000 |
| Výdaje na marketing a komunikáciu | 1 500 000 |
| Zdravotnícke zabezpečenie a dopingová kontrola | 500 000 |
| Výdavky na míting vedúcich NOV | 200 000 |
| Výdavky na protokol a vyhlasovanie víťazov | 250 000 |
| Otvárací a záverečný ceremoniál | 800 000 |
| Mzdové a personálne náklady | 400 000 |
| Bezpečnostná služba (SBS) | 800 000 |
| Poistenie | 350 000 |
| Iné výdaje | 500 000 |
| CELKOVÉ NÁKLADY | 13 000 000 |

Rozpočet mesto Győr 2017

| | |
|--|-------------------|
| Výdavky na činnosť organizačného výboru | 890 000 |
| Náklady na vybavenie (investície, renovácia) | 24 726 666 |
| Športová dedina - investičné náklady | 30 903 333 |
| Náklady spojené s organizáciou podujatia | 14 568 715 |
| VÝDAVKY SPOLU | 69 759 999 |

Zdroje financovania

| | |
|---|-------------------|
| Účastnícky poplatok (80 EUR / deň / účastník) | 2 617 000 |
| Mesto Győr | 16 196 666 |
| Mesto Győr – Šp. dedina | 10 300 000 |
| Úrad vlády MR - štátne dotácie | 41 206 667 |
| Zdroje Európskej komisie | 500 000 |
| Sponzori | 1 249 000 |
| PRÍJMY SPOLU | 69 759 999 |

Výdavky na organizáciu EYOF

| | |
|--|-------------------|
| Náklady na ubytovanie | 1 352 000 |
| Náklady na stravu a občerstvenie | 4 363 000 |
| Náklady za dopravu, prepravné služby a logistiku | 530 000 |
| Výdaje na činnosť organizačného výboru (OV) | 2 096 830 |
| Náklady na organizáciu podujatí | 603 000 |
| Výdaje na marketing a komunikáciu | 1 454 000 |
| Zdravotnícke zabezpečenie a dopingová kontrola | 444 000 |
| Výdavky na míting vedúcich NOV | 187 477 |
| Výdavky na protokol a vyhlasovanie víťazov | 244 780 |
| Otvárací a záverečný ceremoniál | 999 000 |
| Mzdové a personálne náklady | 404 951 |
| Bezpečnostná služba (SBS) | 818 000 |
| Poistenie | 303 677 |
| Iné výdaje | 768 000 |
| CELKOVÉ NÁKLADY | 14 568 715 |

Pre porovnanie je súčasťou predkladaného materiálu rozpočet EYOF 2017 (vpravo), ktorý sa uskutočnil v maďarskom Gyóri. Uvedené náklady ktoré nám poskytli organizátori boli v skutočnosti prekročené na sumu vyššie sto miliónov.

| Predpokladané kapitálové výdavky na Infraštruktúru | Mesto | KSK | Iné zdroje | Celkové náklady |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ATLETIKA nová výstavba Popradská býv. športové gymn. | 400 000 | 6 500 000 | | 6 900 000 |
| BASKETBAL rekonštrukcia Angels aréna, SOŠ Ostrovského | 1 650 000 | | | 1 650 000 |
| JUDO nová výstavba ZŠ Fábryho | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| CYKLISTIKA štart/cieľ brána, depo, ... | 150 000 | | | 150 000 |
| GYMNASTIKA nová výstavba Atletická hala Bardejovská | 950 000 | 6 200 000 | | 7 150 000 |
| HÁDZANÁ rekonštrukcia a kúpa haly BARCA YES Aréna, Hala S. Šipoša | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| PLÁVANIE rekonštrukcia a prekrytie Kúpalisko ČH | 1 750 000 | | | 1 750 000 |
| TENIS nová výstavba Kúpa pozemku NTC (multihala) | 8 000 000 6 000 000 | | 24 000 000 | 38 000 000 |
| TRIATLON štart/cieľ brána, depo, ... | 150 000 | | | 150 000 |
| Volejbal predeľovacia stena Steel aréna | 150 000 | | | 150 000 |
| ŠPORTOVÁ DEDINA - internáty, catering, miestnosti pre zdravotné zabezpečenie | 1 000 000 | 2 500 000 | 21 000 000 | 24 500 000 |
| Povinné výdavky na organizáciu podujatia | 13 000 000 | - | - | 13 000 000 |
| CELKOVÉ MINIMÁLNE NÁKLADY INFRAŠTRUKTÚRA | 39 800 000 | 15 200 000 | 45 000 000 | 99 650 000 |
| | | | | |
| Gymnastická hala | 2 900 000 | | | 2 900 000 |
| Dostavba nového bazéna 25 m (pri Krytej plavárni) | 20 000 000 | | | 20 000 000 |
| CELKOVÉ OPTIMÁLNE NÁKLADY INFRAŠTRUKTÚRA | 62 700 000 | 15 200 000 | 45 000 000 | 122 550 000 |

Pozn. čísla sú uvedené bez alternatív (viď. text investície nižšie), ostatné alternatívy môžu sumy v niektorých športoch zmeniť.

Finančné zabezpečenie EYOF 2021

Celkové minimálne priame aj nepriame predpokladané výdavky, ktoré súvisia s organizáciou EYOF 2021 predstavujú pre Košice a Košický samosprávny kraj výdaje vo výške 99 650 000 Eur, ktoré zahŕňajú: povinné náklady na organizáciu v sume 13 miliónov, výdavky na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry národného významu, ako aj športovej dediny v podobe rekonštrukcie internátov na Jedlíkovej ulici. V uvedenej sume sa nachádza financovanie všetkých subjektov spolu, vrátane všetkých štátnych dotácií, KSK, mesta a súkromných a iných zdrojov. Pri optimálnej verzii organizácie EYOF, investície dosiahnu výšku 122 550 000 Eur.

Pôvodný rozpočet mesta z roku 2017 rátať s nákladmi vo výške 25, 4 milióna eur. Pri sumarizácii stavu muselo mesto prevziať záväzky rizikových partnerov a rozpočet sa navýšil na bežmála 40 miliónov.


Príjmy pozostávajú najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu, mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, zo zdrojov Európskej komisie a účastníckych poplatkov. Samozrejme, že do príjmovej časti rozpočtu sa počíta aj so sponzorskými príspevkami.

Investície do športovej infraštruktúry a materiálno technické zabezpečenie EYOF 2021

1. Atletika - a.) Nový atletický štadión - Popradská ulica

Investor: **Košický samosprávny kraj**

Celková suma investícií: 6 500 000 Eur,
z toho 900.000,00 Eur je odsúhlasených v rozpočte
kapitálových výdavkov KSK na uvedenú stavbu.

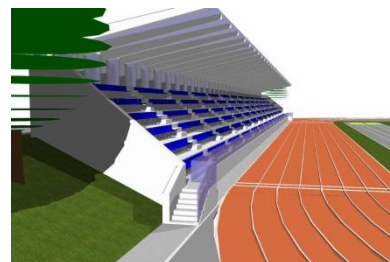

400 m atletický ovál s 8 dráhami, tribúnou pre 600-800 divákov,
pod ktorou bude atletický tunel, s troma dráhami a skladom pre
atletické zariadenia a náčinie, šatne, posilňovňa, soc. zariadenia,
miestnosť pre regeneráciu, zdravotníkov, trénerov a údržbu, parkovisko

V súvislosti s výstavou atletického otvoreného štadióna doposiaľ nebola vypracovaná realizačná projektová dokumentácia, vyššie uvedené náklady sú stanovené ako predpokladané.

Predpokladaný termín ukončenia stavby: 3/2021

Riziká:

Pri výstavbe otvoreného atletického štadiónu s tribúnou a zázemím na Popradskej ulici je potrebné riešiť odstránenie – zbúranie budovy šatní so súpisným č. 2359 na pozemku reg. C KN parcelné č. 219/2 v k. ú. Terasa. Uvedená nehnuteľnosť je tiež v správe Športového gymnázia, Trieda SNP 104 v Košiciach (časová omeškanosť z dôvodu potreby zrealizovania vyššie uvedených búracích prác).

V rámci výstavby atletického otvoreného štadióna doposiaľ nebola vypracovaná projektová dokumentácia.

b.) 2 Nové atletické ovály – rozcvičovací a tréningový – ZŠ Považská a ZŠ Starozagorská

Investor: **Mesto Košice**

Celková suma investícií: 400 000 Eur (2 x 200 000 Eur)

250 m atletický ovál so 4 dráhami a rovinkou na šprint

Predpokladaný termín ukončenia stavby: 10/2020



2. Basketbal

a) Telocvična na Strednej odbornej škole Ostrovského ul. Košický samosprávny kraj

Do telocvične bude situovaný turnaj chlapcov. Objekt v súčasnosti nepotrebuje rekonštrukciu, či modernizáciu.



Vynútená investícia:

Zázemie pre antidoping, toalety a miestnosti pre rozhodcov – bunkový systém, bude použitý po podujatí na športovisku pri ZŠ Belehradská

Ivestor: **Mesto Košice**

Celková suma investícií: 150 000 Eur

Predpokladaný termín ukončenia stavby: 3/2021

b) Angels Aréna

Investor: **Mesto Košice**

Celková suma investícií: 1 500 000 Eur

Potrebná rekonštrukcia a modernizácia tribúny pre divákov, šatní, sociálnych zariadení, miestností pre regeneráciu, zdravotníkov, trénerov a údržbu, výmena elektroinštalácie a vzduchotechniky. Hala bude využitá pre turnaj dievčat.



Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie : 5/2021

3. Judo


a) Výstavba Centra úpolových športov

Investor: **Zápasnícky klub Košice 1904 a štátna dotácia**

Celková suma investícií: 3 000 000 Eur

Centrum situované pri Základnej škole na Fábryho ul. Pozemok vklad mesta Košice 1 Euro - prípad osobitného zreteľa za účelom prevádzkovania mládežníckeho športu.

Zápasnícky klub Košice 1904 vybuduje centrum pre úpolové športy – zápasenie, judo, vzpieranie, taekwondo a kickbox, spolu s regeneračným centrom.

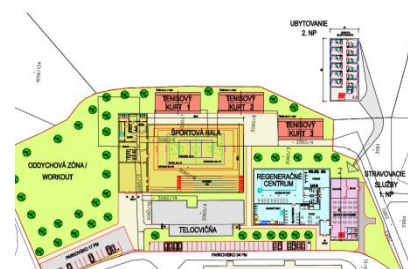

Predpokladaný termín ukončenia stavby : 5/2021

Riziká: Nutnosť prevzatia záväzku na mestom Košice z dôvodu absencie financovania z nezávislých zdrojov.

4. Cyklistika

Súťaže v 2 disciplínach – časovke jednotlivcov a v cestných pretekoch jednotlivcov



a) Časovka jednotlivcov

Je situovaná do centra mesta, kde sa nepočíta s kapitálovými výdavkami na infraštruktúru.

V rámci podmienok na organizovanie cyklistických súťaží bude potrebné priestory štartu a cieľa pretekov vybaviť **štartovacou a cieľovou bránou, prenosným oplotením trate a postaviť prenosnú tribúnu, toalety a depo**

b) Cestné preteky jednotlivcov

Podmienky na technické zabezpečenie sú obdobné ako pri časovke jednotlivcov.

Investor: **Mesto Košice**

Celková suma investícií: 150 000 Eur

Predpokladaný termín ukončenia realizácie: 7/2021

c) Cyklistické podujatia (infraštruktúra EYOF)

Súťaže v 2 disciplínach – časovke jednotlivcov a v cestných pretekoch jednotlivcov.

Cestné preteky jednotlivcov

Investor: **Košický samosprávny kraj**

Cesty, ktoré sú vo vlastníctve KSK (cesty II. A III. triedy) budú rekonštruované z prostriedkov Košického samosprávneho kraja (500 000 Eur).

Časová os stavebných činností (ideálny stav bez komplikácií):

1. spracovanie projektovej dokumentácie (4 – 6 týždňov),
2. proces stavebných konaní (3 – 6 mesiacov, EIA – 4 mesiace),
3. proces verejného obstarávania (1,5 2 mesiace),
4. proces realizácie stavieb a kolaudácie


5. *Gymnastika*

a.) **Nová Krytá atletická hala pri ŠG SNP**

Investor: **Košický samosprávny kraj**

Celková suma investícií: 6 200 000 Eur,

z toho 320.000,00 € - náklady na PD
a inžiniersku činnosť.



Hala s rozmermi 100 x 50 m s 200-metrovým oválom, dočasne bude slúžiť na gymnastiku, Do haly je potrebné zakúpiť kompletnú gymnastickú súpravu súťažnú, druhú tréningovú zapožičať od FIG a umiestniť do telocvične na Bardejovskej ulici – v pôsobnosti KSK

Vynútená investícia:

- 1.) Zázemie pre antidoping, toalety a miestnosti pre rozhodcov – bunkový systém, bude použitý po podujatí na športovisku pri ZŠ Krosnianska 2 v sume 150 000 Eur
- 2.) nákup súťažnej gymnastickej súpravy 720 000 Eur – po podujatí pre gymnastiku v KE
- 3.) zapožičanie a preprava tréningovej gymnastickej súpravy 80 000 Eur

V súvislosti s výstavbou atletickej haly v areáli športového gymnázia v Košiciach bola vypracovaná architektonická štúdia

Investor: **Mesto Košice**

Celková suma investícií: 950 000 Eur

Predpokladaný termín ukončenia stavby a realizácie: 5/2021

Riziká: KSK nemá vysporiadaný celý pozemok, resp. nestihne ukončiť projekt !

V súvislosti s výstavbou Atletickej haly pri Športovom gymnáziu je potrebné uviesť, že z dôvodu realizácie atletickej haly na pozemku reg. C KN parcelné č. 1466/1 je potrebné odstránenie/zbúranie dvoch stavieb, a to budovy so súpisným č. 1865 na pozemku reg. C KN č. 1466/7 a garáže so súpisným č. 3040 na pozemku reg. C KN parcelné č. 1466/9 v katastrálnom území Terasa. K výmazu zbúraných stavieb z katastrálnej mapy a LV postačuje rozhodnutie Mestskej časti Košice – Západ o zrušení súpisných čísiel, t.j. časová omeškanosť z dôvodu potreby realizovania búracích prác jestvujúcich stavieb,

Možné komplikácie pri získaní územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia – spracovaná architektonická štúdia poukázala na možnosti dopravného prístupu z moldavskej ulice. Hlavný prístup do areálu školy bol možný z ulice Trieda SNP. Vstup do športového areálu bol možný ako z ulice Moldavskej, pričom výstup bol možný smerom na Bardejovskú ulicu.

Vstup z Moldavskej cesty, s ktorým sa pri pôvodnom návrhu počítalo (jednosmerná cesta), už nie je možný (vlastník pozemku, cez ktorý sa prechádzalo plánuje výstavbu a v súčasnosti už prebieha stavebné konanie, a zároveň vlastník susedného pozemku reg. C KN parcelné č. 1415/2, k. ú. Terasa – Investičná správcovská s.r.o., v susedstve ktorého bude umiestnená atletická hala, nesúhlasí s jej umiestnením vo vzdialenosti 0,5 m od hranice jeho pozemku.

b.) Alternatíva: **NTC Košice – centrálna a tréningová hala** - viac v športe tenis

Ivestor: **Mesto Košice, STZ, štát**

Celková suma investícií: 30 000 000 Eur



Riziko: Nutné zabezpečiť nový pozemok.

c.) Alternatíva: **Dvojhala Yess aréna pri ZŠ Abovská**

Ivestor: **Mesto Košice**



Zámer - odkúpenie hál od spoločnosti Yess – Sport centrum s.r.o.

Celková suma investícií: 2 500 000 Eur

Predpokladaný termín odkúpenia a ukončenia stavby : 5/2020

Možné riziko: rokovania s vlastníkom Yess – Sport centrum, s.r.o. sú v začiatku !

d.) Alternatíva: **Výstavba novej gymnastickej haly na pozemku mesta ZŠ Lechkého**

Investor: Mesto Košice

Celková suma investícií: 2 900 000 Eur

6. *Hádzaná*

a.) **Hala Slavomíra Šipoša - Rekonštrukcia a modernizácia**

Vlastník Mesto Košice (BPMK), v správe OZ Košice Crows



V hale bola prevedená komplexná rekonštrukcia energetických technológií, po ukončení prác bude spolu s modernizáciu šatní, sociálnych priestorov a obslužných priestorov spĺňať podmienky modernej haly.

V hale sa uskutoční turnaj v hádzanej chlapcov.

Potrebné sú investície do opláštenia a úpravy vonkajších priestorov haly.

Investor: **Mesto Košice**

Celková suma investícií: 1 500 000 Eur

b.) Hala Cassosport /súkromný vlastník/

Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly

Investor: **CASSOSPORT, s.r.o.**

Celková suma investícií: 3 000 000 Eur



V súčasnosti prebieha schvaľovanie projektovej dokumentácie celkovej rekonštrukcie športovej haly.

V hale sa uskutoční turnaj v dievčat.

Predpokladaný termín ukončenia stavby a realizácie: 5/2021

Možné riziko: Vlastník Cassosport, s.r.o. realizácia nie je istá !

a.) Alternatíva: za Cassosport

Dvojhala Yess aréna pri ZŠ Abovská

Investor: **Mesto Košice**



Zámer - odkúpenie hál od spoločnosti Yess – Sport centrum s.r.o.

Celková suma investícií: 2 500 000 Eur

Popis: Jedna hala hotová s dočasným povolením, druhá vo výstavbe

Menšia telocvičňa - rozmery 28 x 16m

počas vyučovania telocvičňa využívaná ZŠ Abovskou na prevádzku telesnej výchovy žiakov

Využitie: tenis, bedminton, volejbal, basketbal

Väčšia telocvičňa - rozmery 25 x 45m

Využitie: hádzaná, florbal, futsal a iné

V hale sa uskutoční turnaj dievčat

Predpokladaný termín odkúpenia a ukončenia stavby : 5/2020

Možné riziko: rokovania s vlastníkom Yess – Sport centrum s.r.o sú v začiatku !

b.) Alternatíva: za Cassosport – prenájom Hádzanárskej haly Prešov

Možné riziko: zvýšené náklady na dopravu a časová náročnosť pre vzdialenosť !

7. Plávanie

- a) **Mestská krytá plaváreň – MČ Staré mesto**
Letné kúpalisko ČH-čko - mesto Košice



Investor: **Mesto Košice**

Celková suma investícií: 1 000 000 Eur

Mestská krytá plaváreň s 50 a 25 metrovým bazénom susedí s areálom letného kúpaliska a počas EYOF budú prepojené bránou. Je potrebné vykonať niekoľko technických vylepšení - **rekonštrukcia osvetlenia a stropu bazénovej haly Mestskej krytej plavárne**. Hlavný bazén 50 m bazén s 8 dráhami, 25 m bazén v hale na rozplávanie i vyplávanie a 3 bazény v priestoroch letného kúpaliska. Celý areál na plavecké súťaže bude z technického hľadiska pre EYOF povolený len na výnimku (dôvodom je nedostatočný počet 10 plaveckých dráh, ktoré nie sú nikde na Slovensku).

Predpokladaný termín ukončenia realizácie: 12/2020

Alternatíva č.2 - **Výstavba krytého 50 m bazénu s 10-timi dráhami a 25 m bazénu** na rozplávanie a vyplávanie

Investor: **Mesto Košice**

Celková suma investícií: 40 000 000 Eur

Pre mesto Košice a Slovensko by bolo vhodné postaviť úplne nový bazén, ktorý ako jediný by spĺňal rozmermi na kritériá pre organizovanie najvýznamnejších medzinárodných podujatí na Slovensku. Výstavba nového bazéna by veľmi pomohla aj verejnosti, pre ktorú je v Košiciach v súčasnosti len jeden bazén s veľkým nedostatkom hodín využívania pre plaveckú verejnosť.

Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 6/2021

Možné riziko: Výstavba je zatiaľ v teoretickej rovine, nedostatok financií mesta !

8. *Tenis*

a.) **Národné tenisové centrum** - nová výstavba na Popradskej ulici

Investor: **Mesto Košice, Slovenský tenisový zväz, štát**

Celková suma investícií: 30 000 000 Eur



Súčasťou Národného tenisového centra (ďalej len „NTC“) bude päť vonkajších tenisových kurtov, centrálna hala s otvárateľnou strechou a troma antukovými kurtmi, dve športové haly so štyrmi tenisovými kurtmi s tvrdým povrchom a ôsmimi bedmintonovými dvorcami, dva squash kurty a fitnesscentrum.

Vláda Slovenskej republiky sa na výstavbe má podieľať 60 % (18 000 000 eur), 20 % vloží mesto Košice (6 mil.) a ďalších 20 % Slovenský tenisový zväz (STZ) (6.mil.). Doteraz preinvestovaných 700 000 Eur, plánované ukončenie výstavby marec 2021.

V akciovej spoločnosti NTC Košice má 49 % akcií mesto Košice a 51% STZ, ktorý bude centrum prevádzkovať. Vkladom mesta do projektu sú pozemky v hodnote 400 000 Eur

Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 3/2021

Možné riziká:

- **problém s lokalitou ako aj nájdením nových pozemkov, posunie čas na výstavbu**
- **Krytie investícií je dnes dohodnuté na úrovni len ½ 15 000 000 Eur (9 000 000 Eur - štát, 3 000 000 Eur - tenisový zväz, 3 000 000 Eur - mesto Košice)**

Alternatíva 2:

Prenájom kurtov Anička, resp. Mestský park

9. Triatlon

Areál Jazero Košice (Mesto Košice a MČ Jazero Košice)



Investor: **Mesto Košice**

Celková suma investícií: 150 000 Eur

Areál je využívaný na športové a rekreačné účely a je vybavený potrebnou infraštruktúrou pre triatlonové disciplíny. V areáli sa nachádza lyžiarsky vleč pre vodné lyžovanie, kde sa už konali významné súťaže Európskeho, či Svetového pohára. Jazero privítalo tiež akcie Jazerná desiatka v diaľkovom plávaní, či detský triatlon v roku 2018.

V rámci podmienok na organizovanie súťaže bude potrebné priestory štartu a cieľa pretekov vybaviť **štartovacou a cieľovou bránou, prenosným oplatením trate a postaviť prenosnú tribúnu, toalety, plošinu na jazere a depo**

Predpokladaný termín ukončenia realizácie: 7/2021

10. Volejbal

Steel aréna (OZ Košická aréna)

Investor: **Mesto Košice**

Celková suma investícií: 150 000 Eur



Steel Aréna je jednou z najmodernejších viacúčelových hál na Slovensku. Svojou kapacitou 8 347 miest, dobre vybudovaným zázemím, doplneným o reštauráciu, sieť bufetov, štyridsiatimi VIP lôžami a VIP zónami, vytvorila Steel Aréna dôstojné podmienky pre trvalý rozvoj košického športu. V hale sa bude hrať súčasne turnaj chlapcov aj dievčat. Je potrebné ešte **realizovať kúpu a montáž plne automatickej, elektrickej, výsuvnej, akustickej steny** Mesto disponuje mobilnou multifunkčnou palubovkou, zostáva ešte vybudovať ďalšie uchytenie siete (jedno už hala má). V roku 2019 sa v nej uskutočnia majstrovstvá sveta v hokeji.

11. Rekonštrukcia školského internátu pri SOŠ Szakközpiskola, Grešakova 1, Košice (Jedlíkova)

Investor: Košický samosprávny kraj

Z hľadiska plánovaného podujatia EYOF by sa v lokalite Študentských domovov na Jedlíkovej ulici malo realizovať ubytovanie športovcov. V súvislosti s týmto podujatím musia byť všetky zariadenia v rámci ŠD v súlade s platnými európskymi normami v oblasti výstavby, ubytovania, spoločných priestorov, športovísk, stravovania, hygieny a bezpečnosti. Za účelom splnenia týchto noriem je nevyhnutné zrealizovať rozsiahlejšie rekonštrukčné práce, stavebné úpravy, modernizáciu a vybavenie interiéru týchto priestorov.

Predpokladané náklady na investíciu 2. 000 000,- Eur, na vnútorné vybavenie činia 500 000 Eur. Rekonštrukcia školského internátu vrátane vnútorného vybavenia bude financovaná z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Skutočné náklady na komplexnú rekonštrukciu školského internátu budú stanovené po spracovaní realizačnej projektovej dokumentácie stavby, a to v termíne do 31. marca 2019.

Predpokladaný časový harmonogram rekonštrukcie školského internátu

- spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie do 31. marca 2019,
- vydanie právoplatného stavebného povolenia do 31. mája 2019,
- príprava a realizácia procesu verejného obstarávania do 30. septembra 2019,
- realizácia stavebných prác do konca novembra 2020.

Význam EYOF 2021 pre slovenský mládežnícky šport, obyvateľov Slovenska a mesta Košíc

Podujatie je v súlade s Konceptiou rozvoja športu v Košiciach na roky 2015 – 2020, časť 2. Ciele, úlohy a opatrenia, časť 3. Materiálno-technické zabezpečenie – športové objekty a časť 8. Projektové zámery.

Usporiadanie EYOF 2021 vo výraznej miere nielen poskytne motiváciu pre mladé slovenské športové talenty, ale bude mať pozitívny vplyv aj na ekonomiku a turizmus mesta Košice a Košického kraja.

Výrazne zlepši pozitívny imidž medzinárodnej akceptácie slovenského športu, ako aj prínos Slovenska v medzinárodnej športovej diplomacii.

Pred rokom 2021, počas neho, ale aj po tomto roku bude mať výrazne pozitívny dopad na zlepšenie vyjednávacjej pozície Slovenska pri uchádzaní sa o ďalšie významné medzinárodné športové podujatia v rôznych športoch.

Vďaka EYOF 2021 získa druhé najväčšie mesto na Slovensku finančné prostriedky na obnovu a výstavbu športovísk, ktoré momentálne chýbajú v Košiciach najmä v nosných olympijských športoch, resp. sú v zlom technickom stave po ukončení EYOF 2021 budú slúžiť na výchovu športových talentov.

Rekonštrukcia vysokoškolských a stredoškolských internátov, do ktorých bude následne situovaná športová dedina, prinesie po ukončení EYOF 2021 spolu so športovou infraštruktúrou stimuly pre mladých ľudí z hľadiska rozhodovania sa o voľbe štúdia v Košiciach, a to nielen pre slovenských, ale aj zahraničných uchádzačov, obmedzí sa tým dlhodobá migrácia mladých ľudí z východu na západ Slovenska, resp. do zahraničia.

SWOT analýza projektu EYOF 2021:

Silné stránky:

- Schopnosť mesta zhostiť sa organizačne podujatia z pohľadu
 - o Športovej infraštruktúry už existujúcej; potenciálu jej dobudovania; jej udržateľnosti
 - o Infraštruktúry ubytovania - sieť internátov (pre účastníkov); kapacity pre návštevníkov
 - o Dopravnej infraštruktúry
 - o Organizačnej – disponibilita personálu

Slabé stránky:

- absencia významnej pridanej hodnoty cudzích resp. štátnych zdrojov pre obnovu športovej infraštruktúry,
- napriek existencii športovej infraštruktúry, jej technický stav je zastaralý, potreba investícií do obnovy,
- mesto nie je jediným vlastníkom, resp. investorom do športovej infraštruktúry a ubytovacích kapacít.

Príležitosti:


- najväčšie mládežnícke podujatie umožňujúce mestu sa zviditeľniť,
- podujatie má potenciál mobilizovať finančné zdroje nevyhnutné pre obnovu športovej infraštruktúry s parametrami jej urýchlenia aj dobudovania,
- motivácia pre mladých zaujímať sa o šport,
- obnovená a dobudovaná športová infraštruktúra má potenciál prilákať organizáciu ďalších medzinárodných športových podujatí.

Riziká:

- časová omeškanosť investičnej prípravy projektov zo strany mesta a ostatných vlastníkov, správcov,
- neistota ohľadne dostatku potrebných finančných zdrojov,
- mesto nevie byť 100% garantom pre zabezpečenie požadovanej úrovne ubytovania účastníkov podujatia,
- komplikácie v správnom konaní pri získavaní stavebných povolení a procesoch verejného obstarávania,
- navýšenie nákladov projektu z ďalších vyvolaných investícií, parciálne riziká jednotlivých investičných projektov (pomenované v materiáli)

Časová os stavebných činností (ideálny stav bez komplikácií):

1. spracovanie projektovej dokumentácie 4 – 6 týždňov
2. proces stavebných konaní 3 – 6 mesiacov (EIA – 4 mesiace)
3. proces verejného obstarávania 1,5 – 2 mesiace
4. proces realizácie stavieb a kolaudácie



Spracoval: Mgr. Ivan Šulek – vedúci referátu športu
